

大船渡土木センター 震災復旧・復興情報 かわら版

平成25年2月18日発行 大船渡土木センター

◇HP: <http://www.pref.iwate.jp/info.rbz?ik=3&nd=1395>

Vol. 3

1. 道路関係事業の取組状況

○ まちづくり連携道路等の道路計画説明会を開催しました。

□ 気仙両市の復興まちづくりと一体となった道路整備として、平成24年8月から平成25年1月にかけて、下記の路線工区の道路計画説明会を開催しました。事業概要(案)等は、下記のとおりです。

《 大船渡市 》

	路線名	工区名	事業概要(案)※1				現在の状況
			計画延長	幅員(全幅)	事業費	事業期間	
1	主要地方道 大船渡広田陸前高田線	船河原	約2,200m	10.0m	約21億円	H24～H30	測量調査、詳細設計を実施中
2	主要地方道 大船渡綾里三陸線	赤崎	約4,000m	10.5m	約40億円	H24～H30	測量調査、詳細設計実施に向けて準備中
3	〃	越喜来	約1,000m	10.0m	約6億円	H24～H27	測量調査、詳細設計を実施中
4	一般県道 崎浜港線	越喜来	約700m	10.0m	約4億円	H24～H27	測量調査、詳細設計を実施中
5	一般県道 基石海岸線	末崎～ 基石	約2,300m	10.0m	約24億円	H24～H30	測量調査、詳細設計を実施中

《 陸前高田市 》


	路線名	工区名	事業概要(案)※1				現在の状況
			計画延長	幅員(全幅)	事業費	事業期間	
1	一般国道 340号	(仮)今泉 大橋※2	約2,300m	11.5m	約36億円	H24～H30	測量調査、詳細設計を実施中
2	〃	竹駒	約1,600m	10.5m	約5億円	H24～H27	測量調査、詳細設計を実施中
3	主要地方道 大船渡広田陸前高田線	小友	約1,200m	10.0m	約25億円	H24～H30	測量調査、詳細設計を実施中
4	〃	大陽	約1,400m	10.0m	約9億円	H24～H29	測量調査、詳細設計を実施中
5	〃	花貝	約1,100m	10.0m	約12億円	H24～H28	測量調査、詳細設計を実施中
6	〃	久保～泊	約2,400m	10.0m	約30億円	H24～H27	測量調査、詳細設計を実施中
7	〃	広田	約1,400m	10.0m	約7億円	H24～H27	測量調査、詳細設計を実施中
8	一般県道 長部漁港線	長部	約600m	7.5m	約2.5億円	H24～H26	測量調査、詳細設計を実施中

※1：この内容は現時点での計画であり、今後の調査の結果によっては変わる可能性があります。

※2：一般国道340号(仮)今泉大橋工区は、都市計画道路にかかる説明会を実施しております。

○ まちづくり連携道路等 位置図

《 大船渡市 》

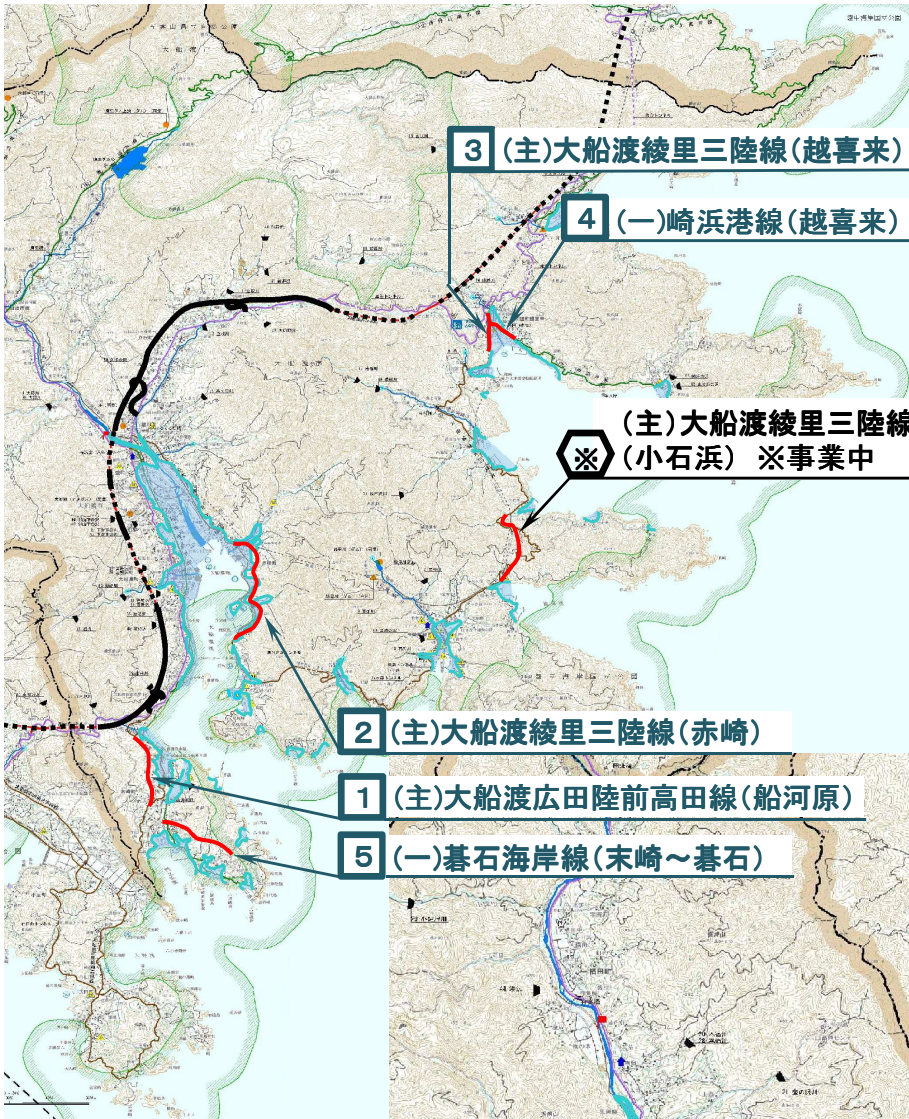


凡 例	
	3.11 浸水区域
	まちづくり連携道路
	復興道路等

(国) : 一般国道

(主) : 主要地方道

(一) : 一般県道

《 陸前高田市 》

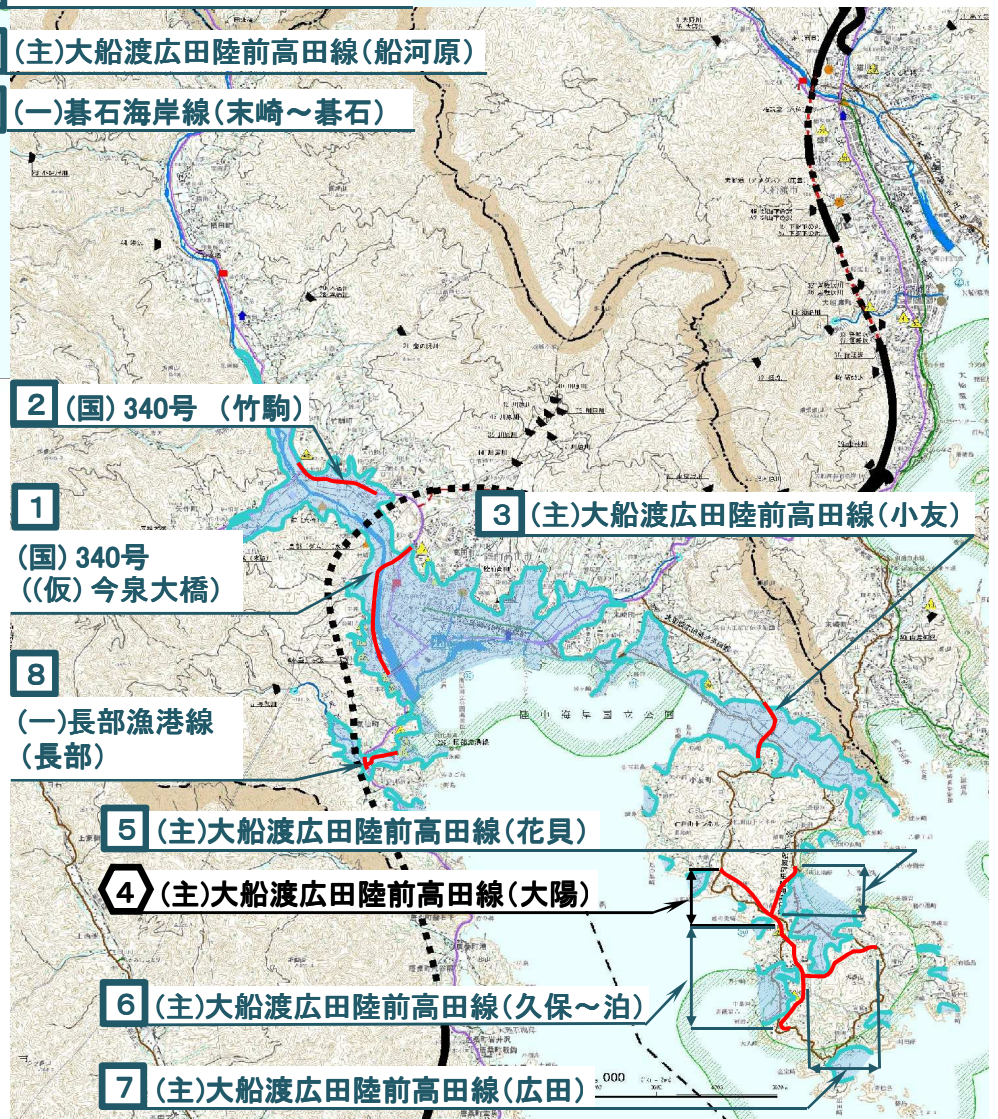


2. 河川・海岸・港湾関係事業の取組状況

○ 水門・陸閘を遠隔操作システムにより、安全な場所から操作します。

- 遠隔操作システムは、地震発生から水門・陸閘閉鎖完了までの流れの様々な面において、多重化を図ることを基本とします。
- 平成24年度に基本設計を実施し、平成25年度には詳細設計を実施予定です。その後、順次、各水門・陸閘の整備に合わせ、遠隔操作システムについても整備予定です。

遠隔操作・多重化のイメージ

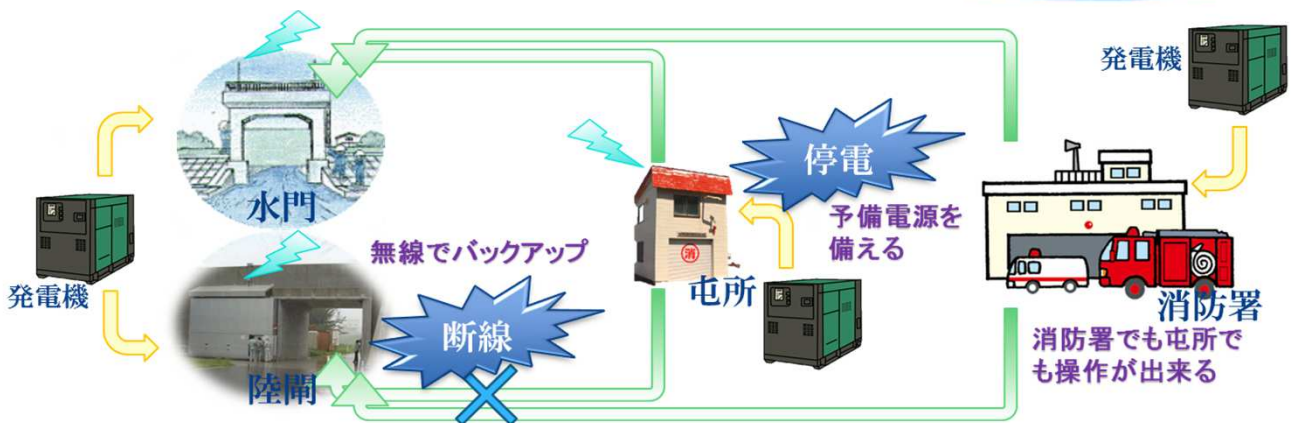

① 操作方法の多重化

消防本部・消防署・分署及び屯所からの遠隔操作を基本とし、機側操作（水門・陸閘側での操作）での手動操作も含めた**操作方法の多重化**を図る。

② 機器の多重化


各場所（現地、屯所、消防本部等）の主要な機器は、バックアップ機器による二重構成とする。

③ 通信回線の多重化

回線（有線・無線等）を複数回線で構成し、回線経路も多重化する。


④ 電源の多重化

商用電源のバックアップのため、予備電源（バッテリー、予備発電機）による電源設備の多重化を図る。

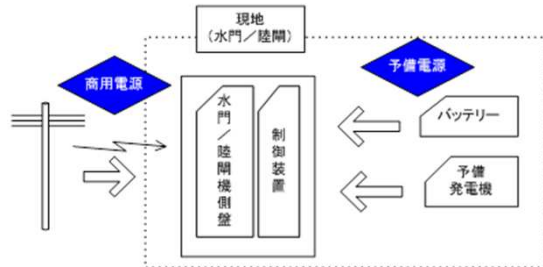

⑤ 操作権限の多重化

管理を行う消防組織の形態により、操作権限の多重化を図る。（複数の箇所から、操作可能に。）



□□かわら版に関する問合せ先□□

沿岸広域振興局土木部大船渡土木センター復興まちづくり課（分庁舎）

TEL：（本庁舎）0192-27-9919、（分庁舎）0192-26-1951 ◇E-mail：BG0005@pref.iwate.jp
