

## 第 47 回原状回復対策協議会（7 月 30 日開催）について

7 月 30 日（土）に開催された第 47 回原状回復対策協議会の内容についてお知らせします。

### 1) 廃棄物撤去処分状況について


廃棄物の運搬・処分については、今年度の計画処分量 21,000 トン全ての契約手続きが終了しました。7 月末現在の搬出量は、1,593 トン（進捗率 7.6%）となっています。

また、掘削・選別については、今年度着手予定の D、E、F、K の 4 地区のうち、7 月 19 日から K 地区の掘削に着手しました。F 地区で埋設が確認されたドラム缶については、準備が整い次第掘削に併せて撤去を行うこととしています。

### 2) 汚染土壌対策について

バイオレメディエーションにより浄化を行っている N 地区では、6 月末時点で浄化対象 87 区画中 72 区画（82.8%）の地下水が環境基準以下となりました（4 月末時点から 2 区画増加）。

浄化開始前（H21. 4-6月）

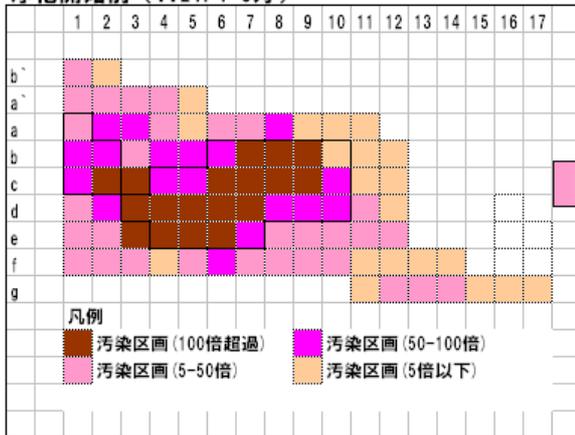

H23. 6月時点



また、N 地区以外で土壌汚染が確認された 7 地区については、6 月末時点で B、D、G、J 及び O 地区で浄化工に着手しています（F 及び K 地区は廃棄物撤去作業後に対策予定です）。

## 第 48 回原状回復対策協議会を次のとおり開催する予定です。

どなたでもご自由に傍聴できます。

日時 平成 23 年 9 月 17 日（土）午後 2 時 45 分（予定）


場所 二戸地区合同庁舎 1 階 大会議室（二戸市石切所字荷渡 6-3）

## 廃棄物の撤去状況について（平成 23 年 7 月末現在）

表: 23 年度の月別撤去量

	撤去量(トン)
23 年 4~6 月	0
23 年 7 月	1,593
合計	1,593

平成 23 年度撤去目標 21,000 トン

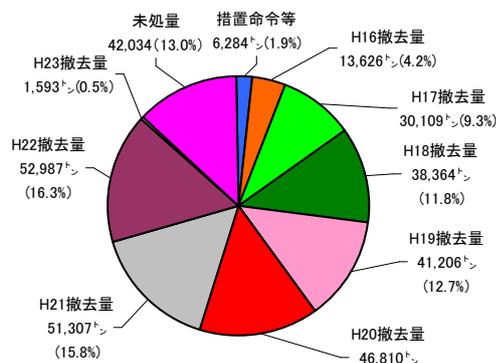

7 月末までに、岩手県側の推定総量 324,320 トンのうち、282,286 トン（87.0%）を撤去しました。

※撤去状況の数字は、小数点以下の端数処理をしているので、合計値が合わない場合があります。
