

第2クリーンセンター（仮称）の整備について

平成21年度の施設稼働を目指し、九戸村江刺家地区で第2クリーンセンター（仮称）の建設工事が、現在行われています。第2クリーンセンター（仮称）は、県内の産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の処理を行います。県境不法投棄現場における廃棄物の受け入れ施設の1つとして期待されている施設です。

〈事業概要〉

事業主体：いわて県北クリーン株式会社

焼却施設：ロータリーキルン＋焼却ストーカ炉

処理能力：80トン/日

溶融施設：表面溶融炉（溶融スラグを生成し建設資材として活用）

処理能力：13トン/日

- ・排ガスは設定した基準値以下とする。
- ・排水は生活排水も含め放流しない。

第2クリーンセンター（仮称）は、岩手県が初のPFI事業として実施します。



施設イメージ図

！ PFI事業：民間資金等活用事業

！ 公共施設等の設計、建設、維持管理及び運営に民間の資金とノウハウを活用し、効率的かつ効果的な公共サービスの提供を図る手法

！ 岩手県のPFI事業方式

！ PFI事業者が施設を建設し、20年間産業廃棄物処理事業を行い、運営期間終了後2年以内に施設を撤去し、県に用地を返還する方式

第28回原状回復対策協議会を開催します。

どなた様もご自由に傍聴できますので、皆様のご来場をお待ちしております。

日時 平成20年2月16日（土） 14:15～

場所 二戸地方振興局 1階 大会議室（二戸市石切所字荷渡6-3）


廃棄物の撤去状況について（平成20年1月末現在）

表：19年度の月別撤去量（代執行）

月	撤去量 (トン)	進捗率 (%)
19年4月	2,348	6%
19年5月	3,277	13%
19年6月	5,547	27%
19年7月	3,448	35%
19年8月	3,621	43%
19年9月	3,179	51%
19年10月	4,399	61%
19年11月	5,250	74%
19年12月	4,863	86%
20年1月	2,393	91%
合計	38,326	

平成19年度撤去目標量 42,000トン

これまでの撤去実績(H20.1末)

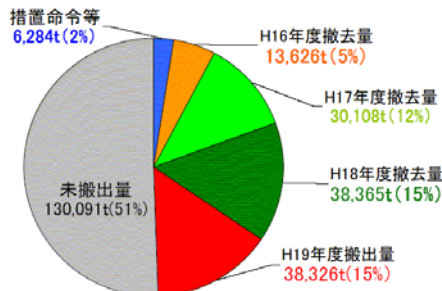

岩手県側の推定総量 256,800トン のうち、49%（累積撤去量 124,996t）を撤去しました。

撤去作業の進捗に伴い、廃棄物の推定総量が256,800トンになる見込みです。

なお、平成24年度撤去完了のスケジュールに変更はありません。
