

今後の社会資本の復旧・復興の概要 (その2)

平成27年 8月

岩手県

今後の社会資本の復旧・復興の概要(その2)

1 趣旨

6月末に、平成28年度以降の5か年の復興事業の一部に地方負担が導入されることとなり、今後の復興の遅れが懸念されたところです。

しかし、県・市町村等の強い働きかけにより地元負担の軽減が図られたことや、予定されている事業の国費がほぼ全額確保されることとなったことから、復興を遅らせることなく着実に事業を進めることができる目途がつかしました。

現在、被災地では復興事業が本格化し、目に見える形で工事が進んでいますが、様々な工事が輻輳し、個々の事業の進捗が分かりにくいという御意見も頂戴しています。

このため、平成27年7月17日(基準日:6月30日)に公表した「社会資本の復旧・復興ロードマップ」を基に、それぞれの事業の概要や事業費、完成予定時期等を簡潔にまとめましたので、復興事業を理解していただくための資料として御活用ください。

2 今回掲載した事業

- ・土地区画整理、津波復興拠点、防災集団移転
- ・災害公営住宅

3 目次

- ・平成28年度以降5年間の復興事業について…………… 1ページ
- ・洋野町…………… 3ページ
- ・久慈市…………… 4ページ
- ・野田村…………… 5ページ
- ・田野畑村…………… 6ページ
- ・岩泉町…………… 7ページ
- ・宮古市…………… 8ページ
- ・山田町…………… 10ページ
- ・大槌町…………… 12ページ
- ・釜石市…………… 15ページ
- ・大船渡市…………… 18ページ
- ・陸前高田市…………… 21ページ
- ・一関市…………… 24ページ

4 公表スケジュール

資料番号	掲載事業※	公表時期
その1	漁港、漁業集落防災、海岸保全施設	7月31日
その2	土地区画整理、津波復興拠点、防災集団移転、災害公営住宅	8月31日 (今回)
その3	復興支援道路、復興関連道路、まちづくり連携道路、港湾、医療、教育	9月下旬 (予定)

※掲載事業は、直轄事業を除く

5 その他

- (1) 本資料については、「社会資本の復旧・復興ロードマップ」と同様、県のホームページ上で更新していきます。
- (2) 表中の事業概要、総事業費等は平成27年6月30日時点のものです。

【用語解説】


- 直接建設 : 地方公共団体が直接整備を実施
- 買 取 : 民間事業者が建設した公営住宅を買い取り
- 設計・施工一括選定 : 設計・施工業者を一括選定
- 敷地提案型買取 : 民間事業者が提案した敷地と共に公営住宅を買い取り
- RC造 : 鉄筋コンクリート造
- S 造 : 鉄骨造

平成 28 年度以降 5 年間の復興事業について

平成 27 年 7 月 岩手県復興局

1 復興財源フレーム

- ❖ 国において、被災 3 県が試算した復興事業費をベースに、**H28～H32 に必要となる国費(6.5 兆円)を確保。**
- ❖ これにより、**岩手県・市町村が必要と見込んでいる国費は概ね確保。**

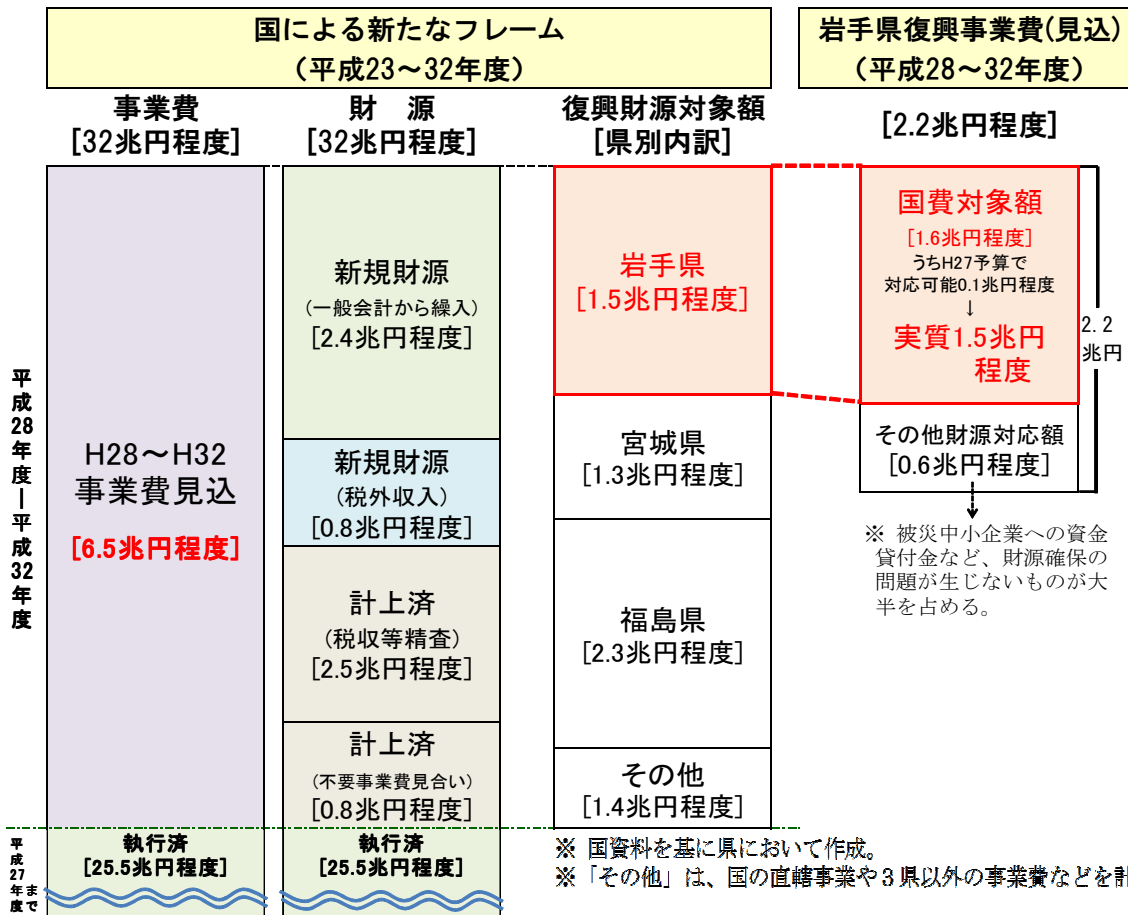

※ 今回新たに生じる地方負担額(3県で220億円程度、本県90億円程度)については、フレーム上は明記されていない。

2 国による平成 28 年度以降の復興事業の整理

- ❖ 災害復旧・インフラ整備・まちづくり・心のケアなど、**主要な復興事業は、ほぼ全てが引き続き復興特別会計で実施(必要な国費が措置)。**
- ❖ 道路事業等に一部自治体負担が導入されたが、**事業実施に必要な国費は措置されており、事業は予定どおり実施可能な見込み。**

引き続き復興特会で実施する主な事業		一般会計へ移す事業
全額国費	自治体負担あり (地方負担の5%(各事業費の1～3%))	自治体負担あり (通常事業と同一)
○被災者支援 ⇒災害救助、心のケア等 ○災害復旧 ○復興交付金(基幹事業) ○原発事故由来の事業 ○直轄事業 ⇒三陸沿岸道路 ○任期付職員・応援職員経費 ○市町村防潮堤 等	○直轄事業 ⇒宮古盛岡横断道路 東北横断自動車道秋田釜石線 久慈港湾口防波堤 等 ○復興交付金(効果促進事業) ○社総交[復興枠]道路事業など ⇒東北自動車道 <u>以西</u> の事業	○社総交[一般枠]道路事業 ⇒東北自動車道 <u>以西</u> の事業 (本県1事業のみ)

3 地方負担拡大に伴う影響

※ 国資料を基に県において試算

❖ 新たに生じる地方負担額は、現時点で**約90億円**。
(県約73億円、市町村約16億円)

[単位：億円]

事業名等	平成28年度以降 事業費			新たに生じる 地方負担額		
	国・県	市町村	合計	県	市町村	合計
道路整備事業 宮古盛岡横断道路 東北横断自動車道釜石秋田線等	1,595	11	1,606	18.8	0.2	19.0
港湾整備事業 久慈港湾口防波堤等	522	0	522	9.5	0.0	9.5
社会資本整備総合交付金 道路、防潮堤、水門等	1,242	137	1,379	29.3	3.8	33.1
水産基盤整備事業 漁港、漁港施設機能強化等	340	47	387	7.6	2.0	9.6
農山漁村地域整備交付金 防潮堤、水門等	194	25	219	4.9	0.6	5.5
復興交付金(効果促進事業) 下水道、避難路、 復興祈念公園、養浜等	129	614	743	1.3	7.7	9.0
その他 種苗放流、交通安全施設等等	82	48	130	1.5	1.6	3.1
合計	4,104	882	4,986	72.9	15.9	88.8

※ 新たな需要や状況変化により、今後、事業費及び地方負担額が変わる場合も想定されるもの。

4 地方負担拡大への対応

❖ 地方負担は拡大するが、以下の措置により、**財政への大きな影響は回避できる見込みであり、復興を遅らせることがないようしっかりと対応。**

- 国は、復興交付金の効果促進事業について、**配分済みの一括配分の自治体負担は引き続きゼロとする方針。今年度、追加配分予定（被災地全体で700億円程度）。**また、一事業当たり事業費の上限を撤廃し、配分額の上限を引き上げ。
- 国は、**被災自治体で新たに生じる負担額について、地方債の発行を認める方針。**

5 その他

❖ 平成28年度以降は一般会計等で対応とされている事業や、平成27年度で終了とされている事業については、**国に対して被災地の実情を丁寧に説明し、関係省庁への要望を行うなど、必要な予算確保に取り組む。**

(平成27年度で終了とされている主な事業に関する国の方針)

- **震災等対応雇用支援事業**
引き続き不可欠なものについては28年度以降も雇用支援とは別の形で支援を検討。
- **特定被災地域公共交通調査事業（コミュニティバス運行支援）**
被災者支援として引き続き実施する方向で検討。

県は、市町村・国と連携しながら、復興を遅らせることなく、復興に邁進する。

今後の社会資本の復旧・復興の概要(その2)

市町村名：洋野町

分野区分：災害公営住宅

細分項目	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H28以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
直接建設	町	八木北	木造平屋 戸数:4戸	92	0	H25	

(注意) 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

市町村事業のH28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

今後の社会資本の復旧・復興の概要(その2)

市町村名：久慈市

分野区分：災害公営住宅

細分項目	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H28以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
直接建設	市	久慈湊・大崎 (漁:久慈湊・崎地区)	木造 戸数:5戸	110	0	H25	
		元木沢 (漁:元木沢地区)	木造 戸数:3戸	71	0	H25	
		久喜 (漁:久喜地区)	木造 戸数:3戸	66	0	H25	

(注意) 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

市町村事業のH28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

今後の社会資本の復旧・復興の概要(その2)

市町村名：野田村

分野区分等：土地区画整理、防災集団移転

細分項目等 (※防集:大臣同意地区名)	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H28以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
土地区画整理	村	城内地区	区域面積:12.9ha 対象戸数:137戸 (民124戸・公13戸)	1,694	5	H28	
防 災 移 集 団 移 転		城内地区	対象戸数:74戸 (民20戸・公54戸)	2,030	0	H26	
		米田・南浜地区	対象戸数:24戸 (民18戸・公6戸)			H25	

(注意)「完了予定年度」は、宅地整備工事の完了を示したものであり、関連工事や事務処理等が翌年度以降に渡る場合があります。
備考欄に記載がない地区においても、現場条件、その他の要因により事業計画(事業費、完成年度等)変更の可能性があります。

分野区分：災害公営住宅

細分項目	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H28以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
直接建設	県	野田① (単独)	木造2階 戸数:8戸	215	0	H24	
		野田② (単独)	木造 戸数:18戸	472	0	H25	
	村	城内 (区:城内地区)	木造 戸数:13戸	373	0	H26	
		城内 (防:城内地区)	木造 戸数:54戸	2,389	0	H27	
		米田・南浜 (防:米田・南浜地区)	木造 戸数:6戸	157	0	H26	
		下安家 (漁:下安家地区)	木造 戸数:1戸	28	0	H26	

(注意)記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。
市町村事業のH28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

今後の社会資本の復旧・復興の概要(その2)

市町村名： 田野畑村

分野区分： 災害公営住宅

細分項目	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H28以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
買取	村	拓洋台地区 (漁:羅賀地区)	木造 戸数:20戸	472	0	H26	
		羅賀東地区 (漁:羅賀地区)	木造 戸数:7戸	277	0	H25	
		黎明台地区 (漁:島越地区)	木造 戸数:24戸	555	0	H26	
		松前沢地区 (漁:島越地区)	木造 戸数:10戸	250	0	H25	
直接建設		西和野地区 (単独)	木造 戸数:2戸	75	0	H26	

(注意) 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

市町村事業のH28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

今後の社会資本の復旧・復興の概要(その2)

市町村名：岩泉町

分野区分：災害公営住宅

細分項目	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H28以降 降残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
直接建設	町	森の越 (単独)	木造 戸数:15戸	349	0	H25	
		小本地区 (単独)	木造 戸数:20戸 RC造 戸数:16戸	689	0	H25	

(注意) 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

市町村事業のH28以降降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

今後の社会資本の復旧・復興の概要(その2)

市町村名：宮古市

分野区分等：土地区画整理事業、津波復興拠点、防災集団移転

細分項目等 (※防集:大臣同意地区名)		事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H28以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
土地区画整理		市	田老地区	区域面積:19.0ha 対象戸数:220戸 (民180戸・公40戸)	3,595	5	H27	H28以降残事業は、 事務処理等
			鎌ヶ崎・ 光岸地地区	区域面積:23.8ha 対象戸数:270戸 (民230戸・公40戸)	9,397	5	H28	事業計画変更調整中 (事業費等変更見込み)
津波復興拠点		市	津軽石地区	区域面積:約1.2ha	791	21	H28	
			中心市街地 地区	区域面積:約1.6ha	1,471	47	H29	
防 災 集 団 移 転	田老	市	田老地区	対象戸数:232戸 (民161戸・公71戸)	11,251	0	H27	
	宮古		崎山地区 (大付)	対象戸数:30戸 (民6戸・公24戸)	6,957	0	H25	
			高浜・金浜 地区	対象戸数:52戸 (民40戸・公12戸)			H27	
			法之脇地区 (津軽石)	対象戸数:12戸 (民12戸)			H25	
			赤前地区	対象戸数:46戸 (民46戸)			H27	

(注意)「完了予定年度」は、宅地整備工事の完了を示したものであり、関連工事や事務処理等が翌年度以降に渡る場合があります。
備考欄に記載がない地区においても、現場条件、その他の要因により事業計画(事業費、完成年度等)変更の可能性ががあります。

分野区分：災害公営住宅

細分項目	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H28以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
直接建設	県	本町 (単独)	RC造8階 戸数:34戸	876	0	H27	
		西町 (単独)	RC造4階 戸数:23戸	694	0	H27	
		津軽石 (単独)	RC造5階 戸数:35戸	940	0	H27	
		磯鷄上村 (単独)	RC造4階 戸数:24戸	641	0	H27	
設計・施工 一括選定	県	上鼻 (単独)	RC造4階 戸数:24戸	704	0	H27	
		八木沢 (単独)	RC造5階 戸数:42戸	1,164	0	H27	

(注意)記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。
市町村事業のH28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

分野区分等：災害公営住宅

細分項目	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H28以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考	
敷地提案型 買取	県	佐原 (単独)	RC造5階 戸数:50戸	1,215	0	H26		
		磯鷄 (単独)	S造2階 戸数:30戸	665	0	H26		
		宮町 (単独)	S造3階 戸数:20戸	574	0	H26		
		鴨崎町 (単独)	S造3階 戸数:20戸	612	0	H27		
		実田 (単独)	S造3階 戸数:17戸	553	0	H27		
		西町(その2) (単独)	RC造5階 戸数:30戸	814	0	H27		
直接建設	市	田老(高台) (防:田老地区)	木造 戸数:36戸	2,585		0	H27	
		田老(高台Ⅱ) (防:田老地区)	木造 戸数:35戸			0	H27	
		田老 (区:田老地区)	RC造5階 戸数:40戸	1,105		0	H27	
		崎山 (防:崎山地区)	RC造4階 戸数:24戸	678		0	H26	
		日の出町 (単独)	木造2階 戸数:26戸	743		0	H27	
		鎌ヶ崎 (区:鎌ヶ崎地区)	RC造5階 戸数:40戸	1,141		0	H27	
		黒田町 (単独)	RC造5階 戸数:24戸	822		0	H27	
		和見町 (単独)	RC造5階 戸数:23戸	748		0	H26	
		西ヶ丘 (単独)	RC造4階 戸数:24戸	632		0	H27	
		山口 (単独)	RC造4階 戸数:23戸	756	515	H28		
		高浜 (単独)	木造2階 戸数:12戸	259		0	H26	
		金浜 (防:金浜地区)	木造2階 戸数:12戸	362		0	H27	
		赤前 (単独)	木造2階 戸数:14戸	318		0	H26	
		重茂 (漁:重茂地区)	木造 戸数:4戸	120		0	H27	
買取		近内① (単独)	RC造5階 戸数:40戸	1,204		0	H25	
		近内② (単独)	RC造5階 戸数:40戸			0	H26	

(注意) 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。
市町村事業のH28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

今後の社会資本の復旧・復興の概要(その2)

市町村名：山田町

分野区分等：土地区画整理、津波復興拠点、防災集団移転

細分項目等 (※防集:大臣同意地区名)	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H28以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考	
土地区画整理	町	大沢地区	区域面積:6.5ha 対象戸数:139戸 (民139戸)	1,415	190	H28		
		山田地区	区域面積:20.3ha 対象戸数:621戸 (民475戸・公146戸)	8,720	2,675	H29		
		織笠地区	区域面積:2.5ha 対象戸数:47戸 (民47戸)	1,792	2	H27	H28以降残事業は、 事務処理等	
		山田 国道45号周辺地区	区域面積:20.0ha	6,681	3,310	H29		
津波復興拠点		山田地区	(中心市街地エリア) 区域面積:3.1ha	5,361	0	H27		
			(公共防災エリア) 区域面積:2.7ha			H27		
防 災 集 団 移 転		山田	山田地区	対象戸数:200戸 (民142戸・公58戸)	11,114	—	H29	事業計画変更調整中 (事業費等変更見込み)
		織笠	織笠地区	対象戸数:170戸 (民148戸・公22戸)	9,438	0	H27	
		船越・田の浜	船越・ 田の浜地区	対象戸数:225戸 (民146戸・公79戸)	6,622	—	H28	事業計画変更調整中 (事業費等変更見込み)
		小谷鳥	小谷鳥地区	対象戸数:4戸 (民4戸)	185	0	H26	

(注意)「完了予定年度」は、宅地整備工事の完了を示したものであり、関連工事や事務処理等が翌年度以降に渡る場合があります。
備考欄に記載がない地区においても、現場条件、その他の要因により事業計画(事業費、完成年度等)変更の可能性がります。

分野区分：災害公営住宅

細分項目	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H28以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
直接建設	県	豊間根 (単独)	S造3階 戸数:72戸	1,408	0	H26	
		大沢 (単独)	RC造5階 戸数:35戸	995	0	H27	
		北浜 (単独)	RC造4階 戸数:72戸	1,920	390	H28	
		山田南 (単独)	RC造 戸数:48戸	1,440	1,440	H30	

(注意) 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。
市町村事業のH28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

分野区分：災害公営住宅

細分項目	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H28以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
設計施工 一括選定	県	妻の神 (単独)	RC造4階 戸数:52戸	1,451	0	H27	
直接建設		飯岡 (防:山田地区)	戸数:58戸	1,450	1,450	H30	
調整中		長林 (防:船越・田の浜地区)	戸数:22戸	550	550	H28	
		船越第8 (防:船越・田の浜地区)	戸数:15戸	375	375	H28	
		船越第1 (防:船越・田の浜地区)	戸数:21戸	525	525	H29	
		田の浜 (防:船越・田の浜地区)	戸数:21戸	525	525	H29	
買取	町	下条団地 (単独)	戸数:20戸	892	854	H28	
		山田中央 (区:山田地区)	RC造 戸数:146戸	5,446	2,159	H28	
		大沢小学校脇 (漁:大沢地区)	戸数:20戸	651	643	H28	
		織笠跡浜 (防:織笠地区)	S造 戸数:22戸	639	0	H27	
		大浦第1 (単独)	木造 戸数:9戸	417	0	H27	
		大浦第2 (単独)	木造 戸数:16戸	771	679	H28	
		改修	柳沢(改修) (単独)	RC造 戸数:49戸	560	0	H27
調整中	長崎第1、第2	戸数:79戸	2,855	2,855	H30		

(注意) 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。
市町村事業のH28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

今後の社会資本の復旧・復興の概要(その2)

市町村名：大槌町

分野区分等：土地区画整理、津波復興拠点、防災集団移転

細分項目等 (※防集:大臣同意地区名)	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H28以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
土地区画整理	町	町方地区	区域面積:29.6ha 対象戸数:799戸 (民484戸・公315戸)	13,943	4,618	H29	
		安渡地区	区域面積:6.0ha 対象戸数:197戸 (民117戸・公80戸)	1,551	5	H28	
		赤浜地区	区域面積:7.7ha 対象戸数:150戸 (民150戸)	2,665	16	H28	
		吉里吉里地区	区域面積:9.1ha 対象戸数:212戸 (民184戸・公28戸)	2,861	23	H29	
		町方地区	区域面積 町方地区(4.4ha)	680	—	H28	事業計画変更調整中 (事業費等変更見込み)
		安渡地区	区域面積 安渡地区(19.6ha)	2,882	—	H29	事業計画変更調整中 (事業費等変更見込み)
防 災 集 団 移 転	大 槌 町 地 区	赤浜地区 (赤浜①団地)	対象戸数:32戸 (民21戸・公11戸)	29,983	2,639	H29	
		赤浜地区 (赤浜②団地)	対象戸数:41戸 (民31戸・公10戸)			H27	
		赤浜地区 (赤浜⑥団地)	対象戸数:40戸 (民18戸・公22戸)			H27	
		吉里吉里地区 (吉里吉里①団地)	対象戸数:18戸 (民18戸)			H27	
		吉里吉里地区 (吉里吉里②団地)	対象戸数:35戸 (民35戸)			H27	
		吉里吉里地区 (吉里吉里③団地)	対象戸数:13戸 (民13戸)			H27	
		浪板地区 (浪板①団地)	対象戸数:11戸 (民11戸)			H27	
		安渡地区	対象戸数:16戸 (民16戸)			H28	
		安渡地区 (安渡①団地)	対象戸数:46戸 (民46戸)			H29	
		安渡地区 (安渡②団地)	対象戸数:12戸 (民12戸)			H28	
		安渡地区 (安渡③団地)	対象戸数:10戸 (民10戸)			H28	
		安渡地区 (安渡④団地)	対象戸数:25戸 (民25戸)			H28	
		町方・小枕・伸松地区 (寺野臼澤団地)	対象戸数:192戸 (民151戸・公41戸)			H29	
町方・小枕・伸松地区 (大ケ口、沢山、夏本、 榎内、屋敷前団地)	対象戸数:66戸 (民66戸)	※次頁に続く	H27				

(注意)「完了予定年度」は、宅地整備工事の完了を示したものであり、関連工事や事務処理等が翌年度以降に渡る場合があります。
備考欄に記載がない地区においても、現場条件、その他の要因により事業計画(事業費、完成年度等)変更の可能性がります。

分野区分等：土地区画整理、津波復興拠点、防災集団移転

細分項目等 (※防集:大臣同意地区名)	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H28以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
防災 集団 移転	大槌町地区	町方・小枕・伸松地区 (町方団地)	対象戸数:61戸 (民61戸)	29,983	2,639	H29	
		町方・小枕・伸松地区 (小枕団地)	対象戸数:24戸 (民24戸)			H28	
		町方・小枕・伸松地区 (花輪田地区)	対象戸数:10戸 (民10戸)			H26	

(注意)「完了予定年度」は、宅地整備工事の完了を示したものであり、関連工事や事務処理等が翌年度以降に渡る場合があります。
備考欄に記載がない地区においても、現場条件、その他の要因により事業計画(事業費、完成年度等)変更の可能性があります。

分野区分：災害公営住宅

細分項目	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H28以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
直接建設	県	吉里吉里 (単独)	RC造5階 戸数:34戸	650	0	H25	
		大槌(桎内) (単独)	木造 戸数:24戸	661	0	H27	
		大槌(屋敷前) (単独)	RC造5階 戸数:151戸	3,250	0	H27	
		安渡(C) (区:安渡地区)	RC造5階 戸数:34戸	850	850	H29	
		三枚堂 (単独)	木造 戸数:104戸	3,120	3,120	H28	
		町方1 (区:町方地区)	木造 戸数:57戸	1,425	1,425	H29	
		町方2 (区:町方地区)	木造 戸数:79戸	1,975	1,975	H29	
買取	町	大ケ口 (単独)	木造 戸数:70戸	1,310	15	H25	
		屋敷前 (単独)	木造 戸数:21戸	904	322	H25	
		大ケ口2丁目 (単独)	木造2階 戸数:23戸	1,111	398	H26	
		桎内① (単独)	木造 戸数:13戸	495	26	H26	
		町方(末広町) (区:町方地区)	RC造6階 戸数:52戸	5,372	2,401	H27	
		町方(本町) (区:町方地区)	木造 戸数:8戸			H28	

(注意)記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。
市町村事業のH28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

分野区分：災害公営住宅

細分項目	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H28以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
買取	町	町方(御社地) (区:町方地区)	RC造 戸数:23戸	5,372	2,401	H28	
		町方(上町) (区:町方地区)	木造 戸数:4戸			H28	
		町方1 (区:町方地区)	木造 戸数:8戸			H29	
		町方2 (区:町方地区)	木造 戸数:84戸			H29	
		吉里吉里(A) (区:吉里吉里地区)	木造 戸数:5戸	1,304	1,200	H28	
		吉里吉里(B1) (区:吉里吉里地区)	木造 戸数:13戸			H29	
		吉里吉里(B2) (区:吉里吉里地区)	木造 戸数:6戸			H29	
		吉里吉里(C) (区:吉里吉里地区)	木造 戸数:4戸			H29	
		赤浜①団地 (防:赤浜地区)	木造 戸数:11戸	498	498	H29	
		赤浜②団地 (防:赤浜地区)	木造 戸数:10戸			H28	
		赤浜⑥団地 (防:赤浜地区)	木造 戸数:22戸			H28	
		浪板 (漁:浪板地区)	木造 戸数:11戸	329	304	H29	
		浪板(1) (単独)	木造 戸数:4戸			H27	
		安渡(A) (区:安渡地区)	木造 戸数:10戸	2,186	1,968	H28	
		安渡(A) (区:安渡地区)	木造 戸数:14戸			H29	
		安渡(B1) (区:安渡地区)	木造 戸数:13戸			H28	
		安渡(B2) (区:安渡地区)	木造 戸数:9戸			H29	
		寺野1 (防:寺野地区)	木造 戸数:16戸	609	137	H27	
		寺野2 (防:寺野地区)	木造 戸数:11戸			H28	
		寺野3 (防:寺野地区)	木造 戸数:14戸			H29	

(注意) 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。
市町村事業のH28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

今後の社会資本の復旧・復興の概要(その2)

市町村名：釜石市

分野区分等：土地区画整理、津波復興拠点、防災集団移転

細分項目等 (※防集:大臣同意地区名)		事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H28以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
土地区画整理		市	平田地区	区域面積:22.7ha 対象戸数:288戸 (民288戸)	8,844	63	H30	
			片岸地区	区域面積:22.7ha 対象戸数:142戸 (民125戸・公17戸)	5,678	506	H30	
			鶴住居地区	区域面積:49.2ha 対象戸数:705戸 (民580戸・公125戸)	14,130	637	H30	
			嬉石・松原地区	区域面積:12.9ha 対象戸数:394戸 (民250戸・公144戸)	6,897	21	H30	
津波復興拠点			東部地区	区域面積:26.8ha	11,606	1,332	H29	
			鶴住居地区	区域面積:16.4ha	5,836	663	H28	
防災 集団 移 転	室浜		室浜地区	対象戸数:9戸 (民7戸・公2戸)	506	0	H27	
	根浜		根浜地区	対象戸数:33戸 (民27戸・公6戸)	1,921	0	H27	
	箱崎		箱崎地区	対象戸数:30戸 (民18戸・公12戸)	909	0	H27	
	箱崎白浜		箱崎白浜地区	対象戸数:7戸 (民7戸)	223	0	H27	
	桑ノ浜		桑ノ浜地区	対象戸数:11戸 (民6戸・公5戸)	467	0	H27	
	両石		両石地区	対象戸数:62戸 (民34戸・公28戸)	3,250	—	H28	事業計画変更調整中(事業費等変更見込み)
	尾崎白浜		尾崎白浜地区	対象戸数:3戸 (民3戸)	105	0	H27	
	花露辺	花露辺地区	対象戸数:17戸 (民4戸・公13戸)	124	0	H25		
	本郷	本郷地区	対象戸数:15戸 (民8戸・公7戸)	521	0	H27		
	唐丹	唐丹地区 (小白浜)	対象戸数:25戸 (民25戸)	1,381	0	H27		
荒川	荒川地区	対象戸数:9戸 (民1戸・公8戸)	166	0	H27			

(注意)「完了予定年度」は、宅地整備工事の完了を示したものであり、関連工事や事務処理等が翌年度以降に渡る場合があります。
備考欄に記載がない地区においても、現場条件、その他の要因により事業計画(事業費、完成年度等)変更の可能性があります。

分野区分：災害公営住宅

細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H28以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
直接建設	県	平田 (単独)	RC造7階 戸数:126戸	1,942	0	H25	
		野田 (単独)	RC造5階 戸数:32戸	591	0	H25	
		日向 (単独)	RC造6階 戸数:30戸	853	0	H27	
		片岸 (単独)	RC造 戸数:17戸	519	240	H28	
		嬉石第1 (区:嬉石・松原地区)	RC造 戸数:52戸	1,300	1,300	H28	
		嬉石第2 (区:嬉石・松原地区)	RC造 戸数:32戸	800	800	H28	
		松原 (区:嬉石・松原地区)	RC造 戸数:60戸	1,500	1,500	H28	
		両石 (防:両石地区)	RC造 戸数:24戸	600	600	H29	
買 取	市	上中島① (単独)	S造3階 戸数:54戸	1,183	0	H24	
		上中島② (単独)	S造8階 戸数:156戸	4,896	0	H26	
		花露辺 (防:花露辺地区)	RC造4階 戸数:13戸	495	0	H25	
		鶯住居① (区:鶯住居地区)	木造 戸数:45戸	1,394	1,281	H28	H26.12実施契約締結 買取事業につき、完了年度で事 業費一括計上
		鶯住居② (区:鶯住居地区)	RC造 戸数:80戸	2,860	2,634	H28	H26.12実施契約締結 買取事業につき、完了年度で事 業費一括計上
		小白浜1号 (単独)	S造4階 戸数:27戸	982	0	H27	
		小白浜2号 (単独)	木造 戸数:3戸	85	0	H27	
		片岸 (区:片岸地区)	木造 戸数:17戸	641	505	H29	H26.12実施契約締結 買取事業につき、完了年度で事 業費一括計上
		東部地区 (天神町)(単独)	S造5階 戸数:52戸	1,924	0	H27	
		東部地区 (大町1号)(単独)	S造6階 戸数:44戸	1,377	0	H27	
		東部地区 (大渡町)(単独)	RC造8階 戸数:27戸	961	0	H27	
		東部地区 (只越1号)(単独)	S造6階 戸数:33戸	911	0	H27	
		東部地区 (只越2号)(単独)	S造5階 戸数:11戸	330	307	H28	H26.7施工基本協定締結 買取事業につき、完了年度で事 業費一括計上
		東部地区 (大只越1号)(単独)	S造5階 戸数:14戸	420	380	H28	H26.7施工基本協定締結 買取事業につき、完了年度で事 業費一括計上
		東部地区 (大町2号)(単独)	5階 戸数:29戸	940	900	H28	H27.2施工基本協定締結 買取事業につき、完了年度で事 業費一括計上
東部地区 (大町3号)(単独)	8階 戸数:34戸	1,064	1,020	H28	H27.3施工基本協定締結 買取事業につき、完了年度で事 業費一括計上		

分野区分：災害公営住宅

細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H28以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
買取	市	東部地区 (大町4号) (単独)	RC造8階 戸数:41戸	1,348	1,328	H28	H26.10施工基本協定締結 買取事業につき、完了年度で事 業費一括計上
		東部地区 (大町5号) (単独)	RC造6階 戸数:24戸	909	777	H28	H26.10施工基本協定締結 買取事業につき、完了年度で事 業費一括計上
		東部地区 (只越3号) (単独)	6階 戸数:19戸	511	474	H28	H27.3施工基本協定締結 買取事業につき、完了年度で事 業費一括計上
		東部地区 (只越4号) (単独)	8階 戸数:27戸	690	651	H28	H27.3施工基本協定締結 買取事業につき、完了年度で事 業費一括計上
		東部地区 (浜町) (単独)	7階 戸数:53戸	1,628	1,496	H28	
		東部地区 (大只越2号) (単 独)	5階 戸数:22戸	616	616	H28	
		本郷 (防:本郷地区) (漁:本郷地区)	木造 戸数:12戸	238	192	H28	H27.2施工基本協定締結 買取事業につき、完了年度で事 業費一括計上
		箱崎① (漁:箱崎地区)	木造 戸数:17戸	423	0	H27	H27.2施工基本協定締結 買取事業につき、完了年度で事 業費一括計上
		箱崎② (防:箱崎地区)	木造 戸数:12戸	299	211	H28	H27.2施工基本協定締結 買取事業につき、完了年度で事 業費一括計上
		室浜 (防:室浜地区) (漁:室浜地区)	木造 戸数:7戸	236	204	H28	H27.3施工基本協定締結 買取事業につき、完了年度で事 業費一括計上
		根浜 (防:根浜地区) (漁:根浜地区)	木造 戸数:8戸	288	218	H28	H27.3施工基本協定締結 買取事業につき、完了年度で事 業費一括計上
		桑ノ浜 (防:桑ノ浜地区) (漁:桑ノ浜地区)	木造 戸数:8戸	307	254	H28	H27.2施工基本協定締結 買取事業につき、完了年度で事 業費一括計上
		両石 (防:両石地区) (漁:両石地区)	木造 戸数:23戸	673	564	H29	H27.3施工基本協定締結 買取事業につき、完了年度で事 業費一括計上
		荒川 (防:荒川地区)	木造 戸数:8戸	159	0	H27	
直接建設		尾崎白浜 (単独)	木造 戸数:5戸	211	0	H26	
		箱崎白浜 (単独)	木造 戸数:9戸	323	0	H25	
		大石 (単独)	木造 戸数:3戸	73	0	H25	
		唐丹片岸 (単独)	木造 戸数:4戸	107	0	H26	

(注意) 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。
市町村事業のH28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

今後の社会資本の復旧・復興の概要(その2)

市町村名：大船渡市

分野区分等：土地区画整理、津波復興拠点、防災集団移転

細分項目等 (※防集:大臣同意地区名)		事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H28以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
土地区画整理		市	大船渡 駅周辺地区	区域面積:約33.8ha 対象戸数281戸 (民231戸・公50戸)	15,930	8,165	H30	
津波復興拠点			大船渡地区	区域面積:約2.3ha (先行整備区域)	4,354	-	H28	事業計画変更調整中 (事業費等変更見込み)
				区域面積:約5.4ha (第2段階整備区域)			H29	
防 災 集 団 移 転	大船渡		大船渡地区	対象戸数:18戸 (民18戸)	1,477	0	H27	
	峰岸		峰岸地区	対象戸数:21戸 (民21戸)	745	154	H27	H28以降残事業は、 住宅建設等助成、移転費 助成
	小河原		小河原地区 (平林)	対象戸数:29戸 (民29戸)	1,916	387	H27	H28以降残事業は、 住宅建設等助成、移転費 助成
			小河原地区 (上山)	対象戸数:6戸 (民6戸)			H27	
			小河原地区 (鶴巻)	対象戸数:6戸 (民6戸)			H26	
	神坂		神坂地区	対象戸数:9戸 (民9戸)	544	27	H26	H28以降残事業は、 住宅建設等助成、移転費 助成
	細浦		細浦地区	対象戸数:13戸 (民13戸)	490	54	H26	H28以降残事業は、 住宅建設等助成、移転費 助成
	小細浦		小細浦地区	対象戸数:8戸 (民8戸)	286	3	H25	H28以降残事業は、 住宅建設等助成、移転費 助成
	梅神		梅神地区	対象戸数:13戸 (民13戸)	438	14	H27	H28以降残事業は、 移転費助成
	門之浜		門之浜地区	対象戸数:13戸 (民13戸)	474	1	H25	H28以降残事業は、 住宅建設等助成、移転費 助成
	泊里		泊里地区	対象戸数:17戸 (民17戸)	977	204	H27	H28以降残事業は 住宅建設等助成、公共施 設整備、移転費助成
	佐野		佐野地区	対象戸数:5戸 (民5戸)	287	52	H26	H28以降残事業は、 住宅建設等助成、公共施 設整備、移転費助成
	中赤崎		中赤崎地区	対象戸数:59戸 (民59戸)	4,754	2,058	H29	
	永浜	永浜地区	対象戸数:28戸 (民28戸)	1,531	661	H28		
清水	清水地区	対象戸数:6戸 (民6戸)	395	28	H26	H28以降残事業は、 住宅建設等助成、移転費 助成		
蛸ノ浦	蛸ノ浦地区	対象戸数:16戸 (民16戸)	682	0	H27			

(注意)「完了予定年度」は、宅地整備工事の完了を示したものであり、関連工事や事務処理等が翌年度以降に渡る場合があります。

備考欄に記載がない地区においても、現場条件、その他の要因により事業計画(事業費、完成年度等)変更の可能性があります。

分野区分等：土地区画整理、津波復興拠点、防災集団移転

細分項目等 (※防集:大臣同意地区名)		事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H28以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
防 災 集 団 移 転	田浜	市	田浜地区	対象戸数:12戸 (民12戸)	437	0	H26	
	港・岩崎		港・岩崎地区	対象戸数:23戸 (民23戸)	724	0	H26	
	泊		泊地区	対象戸数:13戸 (民13戸)	303	0	H25	
	浦浜南		浦浜南地区	対象戸数:11戸 (民11戸)	417	0	H26	
	浦浜仲・西		浦浜仲・西地区	対象戸数:10戸 (民10戸)	381	0	H26	
	浦浜東・甫嶺		浦浜東・ 甫嶺地区	対象戸数:9戸 (民9戸)	416	0	H26	
	崎浜		崎浜地区	対象戸数:21戸 (民21戸)	968	0	H27	

(注意)「完了予定年度」は、宅地整備工事の完了を示したものであり、関連工事や事務処理等が翌年度以降に渡る場合があります。

備考欄に記載がない地区においても、現場条件、その他の要因により事業計画(事業費、完成年度等)変更の可能性があります。

分野区分：災害公営住宅

細分項目等		事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H28以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
直接建設		県	下欠 (単独)	RC造3階 戸数:33戸	854	0	H26	
			上平 (単独)	RC造7階 戸数:65戸	1,480	0	H27	
			関谷 (単独)	RC造5階 戸数:50戸	1,241	0	H27	
			長谷堂 (単独)	RC造3階 戸数:53戸	2,295	0	H26	
			みどり町 (単独)	RC造6階 戸数:147戸	3,174	0	H27	
			平林 (単独)	RC造4階 戸数:55戸	1,325	0	H27	
設計・施工 一括選定		県	綾里 (単独)	RC造3階 戸数:30戸	703	0	H26	
			沢田 (単独)	RC造3階 戸数:20戸	679	0	H27	
			下館下 (単独)	RC造7階 戸数:58戸	1,454	570	H28	

(注意)記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

市町村事業のH28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

分野区分：災害公営住宅

細分項目等 (※防集:大臣同意地区名)	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H28以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
直接建設	市	田中東団地① (単独)	木造2階 戸数:12戸	168	0	H24	
		田中東団地② (単独)	木造2階 戸数:7戸	132	0	H25	
買取		泊里団地 (単独)	木造平屋 戸数:6戸	234	0	H27	
		崎浜団地 (単独)	木造平屋 戸数:8戸	416	0	H27	
		浦浜杉下団地 (単独)	木造平屋 戸数:9戸	370	0	H27	
		中赤崎後ノ入 団地(単独)	木造平屋 戸数:4戸	143	0	H27	
		盛中央 (単独)	RC造5階 戸数:44戸	60	0	H24	
		上山団地 (単独)	RC造3階 戸数:11戸	249	0	H26	
		赤沢団地 (単独)	RC造5階 戸数:23戸	519	0	H26	
		平林団地 (単独)	RC造3階 戸数:11戸	325	0	H26	
		宇津野沢団地 (単独)	RC造3階 戸数:20戸	473	0	H26	
		蛸ノ浦団地 (単独)	RC造3階 戸数:14戸	479	0	H27	
		浦浜所通団地 (単独)	RC造3階 戸数:20戸	642	0	H27	
		中赤崎山口団 地(単独)	RC造3階 戸数:13戸	519	0	H27	
		中赤崎大洞団 地(単独)	木造 戸数:9戸	376	0	H27	
		川原 (単独)	RC造3階 戸数:29戸	790	0	H27	
区画整理地区 (区:大船渡駅周辺)	RC造5階 戸数:50戸	1,960	1,784	H28			

(注意) 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。
市町村事業のH28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

今後の社会資本の復旧・復興の概要(その2)

市町村名：陸前高田市

分野区分等：土地区画整理、津波復興拠点、防災集団移転

細分項目等 (※防集:大臣同意地区名)	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H28以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考	
土地区画整理	市	高田地区	区域面積:189.8ha 対象戸数1,481戸 (民1,361戸・公120戸)	55,557	41,482	H30		
		今泉地区	区域面積:113.0ha 対象戸数485戸 (民321戸・公164戸)	55,000	9,702	H30		
津波復興拠点		高田北地区	(西区) 区域面積:9.6ha	6,082	-	H27	事業計画変更調整中 (事業費等変更見込み)	
			(東区) 区域面積:9.1ha			H29		
		高田南地区	区域面積:19.8ha	11,556	4,026	H30		
		防 災 集 団 移 転	長部	長部地区 (月山)	対象戸数:50戸 (民50戸)	5,083	0	H27
長部地区 (上長部)				対象戸数:17戸 (民17戸)	H25			
長部地区 (双六)				対象戸数:12戸 (民12戸)	H27			
長部地区 (要谷)				対象戸数:7戸 (民7戸)	H25			
長部地区 (福伏)				対象戸数:5戸 (民5戸)	H26			
	矢作・竹駒・ 高田・今泉	矢作・竹駒・ 高田・今泉地区 (下矢作)	対象戸数:6戸 (民6戸)	17,144	-	H26	事業計画変更調整中 (事業費等変更見込み)	
		矢作・竹駒・ 高田・今泉地区 (館)	対象戸数:8戸 (民8戸)			H26		
		矢作・竹駒・ 高田・今泉地区 (下沢)	対象戸数:5戸 (民5戸)			H26		
		矢作・竹駒・ 高田・今泉地区 (高田)	対象戸数:79戸 (民79戸)			H30		
		矢作・竹駒・ 高田・今泉地区 (今泉)	対象戸数:75戸 (民75戸)			H30		
	米崎	米崎地区 (堂の前)	対象戸数:5戸 (民5戸)	4,956	0	H25		
		米崎地区 (脇の沢)	対象戸数:69戸 (民69戸)			H27		

(注意)「完了予定年度」は、宅地整備工事の完了を示したものであり、関連工事や事務処理等が翌年度以降に渡る場合があります。
備考欄に記載がない地区においても、現場条件、その他の要因により事業計画(事業費、完成年度等)変更の可能性があります。

分野区分等：土地区画整理、津波復興拠点、防災集団移転

細分項目等 (※防集：大臣同意地区名)		事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H28以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
防 災 集 団 移 転	小友	市	小友地区 (両替)	対象戸数：14戸 (民14戸)	2,531	0	H26	
			小友地区 (三日市)	対象戸数：5戸 (民5戸)			H25	
			小友地区 (柳沢)	対象戸数：9戸 (民9戸)			H26	
			小友地区 (茂里花)	対象戸数：5戸 (民5戸)			H26	
			小友地区 (新田)	対象戸数：7戸 (民7戸)			H25	
			小友地区 (只出)	対象戸数：11戸 (民11戸)			H26	
	広田		広田地区 (長洞)	対象戸数：14戸 (民14戸)	6,415	0	H26	
			広田地区 (大野)	対象戸数：8戸 (民8戸)			H26	
			広田地区 (広田大野)	対象戸数：18戸 (民18戸)			H26	
			広田地区 (田谷)	対象戸数：34戸 (民34戸)			H26	
			広田地区 (六ヶ浦)	対象戸数：8戸 (民8戸)			H26	
			広田地区 (泊)	対象戸数：25戸 (民25戸)			H27	
			広田地区 (中沢)	対象戸数：9戸 (民9戸)			H25	
			広田地区 (久保)	対象戸数：7戸 (民7戸)			H26	

(注意)「完了予定年度」は、宅地整備工事の完了を示したものであり、関連工事や事務処理等が翌年度以降に渡る場合があります。
備考欄に記載がない地区においても、現場条件、その他の要因により事業計画(事業費、完成年度等)変更の可能性があります。

分野区分：災害公営住宅

細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H28以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
直接建設	県	中田 (単独)	RC造8階 戸数:197戸	4,400	0	H27	
		栃ヶ沢 (単独)	RC造9階 戸数:301戸	5,896	1,210	H28	
		柳沢前 (単独)	RC造3階 戸数:28戸	851	0	H26	
		脇の沢 (単独)	RC造3階 戸数:60戸	1,700	660	H28	
設計施工 一括選定		西下 (単独)	RC造4階 戸数:40戸	933	0	H26	
買取	市	下和野 (区:高田地区)	RC造7階 戸数:120戸	2,797	0	H26	
		水上 (単独)	RC造3階 戸数:30戸	947	0	H26	
		長部 (区:今泉地区)	RC造3階 戸数:60戸	2,297	930	H28	
		今泉 (区:今泉地区)	RC造3階 戸数:104戸	4,077	1,612	H28	
		大野 (単独)	RC造3階 戸数:31戸	1,323	0	H27	
		田端 (単独)	RC造3階 戸数:14戸	640	0	H27	
調整中		陸前高田市 (単独)	RC造 戸数:15戸	未定	未定	H28	

(注意) 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。
市町村事業のH28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

今後の社会資本の復旧・復興の概要(その2)

市町村名：一関市

分野区分：災害公営住宅

細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H28以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
直接建設	市	沢内 (単独)	RC造3階 戸数:27戸	726	0	H27	

(注意) 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

市町村事業のH28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。
