

県営経営体育成基盤整備事業

土 地 改 良 事 業 変 更 計 画 書

(区 画 整 理)

【 第 2 回 変 更 】

県	名	岩	手	県
地	区	大		沢
所	在	花	巻	市
事	業	岩	手	県
業	主			
主	体			

土 地 改 良 事 業 計 画 書

目 次

第1章	目 的	1	第2節	営農計画及び土地利用計画	30
第2章	地域及び地積	2	1.	営農計画の概要	30
	第1節 地域	2	2.	土地利用区分	30
	第2節 地積	2	3.	作付方式	31
第3章	現況	3	4.	生産計画	32
	第1節 気象及び海象	3	5.	労働改善計画	33
	1. 一般気象	3	6.	級地別土地利用区分	34
	2. 特殊気象	4	7.	土地配分計画	34
	3. 海象	4	第3節	用水計画	35
	第2節 土地状況	5	1.	計画基準年	35
	1. 地形、土壌及び侵食の程度	5	2.	計画かんがい方式	35
	2. 土地分類	7	3.	計画用水系統	35
	3. 土地利用の状況	8	4.	計画用水量	37
	4. 土地所有の状況	9	5.	水源計画	39
	第3節 水利状況	10	第4節	排水計画	42
	1. 用水状況	10	1.	計画基準雨量	42
	2. 排水状況	16	2.	計画排水方式	42
	3. 河川状況	20	3.	計画排水系統	42
	第4節 道路概況	21	4.	計画排水量	44
	1. 道路概況	21	5.	排水対策	45
	2. 主要道路一覧表	22	6.	湛水検討	46
	第5節 地域農業の概況	24	第5節	道路計画	47
	1. 産業別就業人口	24	1.	道路及び索道	47
	2. 経営耕地広狭別農家数及び耕地の分散状況並びに専兼業別農家数	25	2.	路線配置図	47
	3. 動力農機具及び主要家畜頭数	26	第6節	農用地造成計画	49
	4. 主要作物作付状況	27	1.	農用地造成計画	49
	5. 農業の動向	28	2.	土壌改良	49
	第6節 地域環境の概況	28	第7節	洪水調節計画	50
第4章	一般計画	29	1.	計画基準雨量	50
	第1節 事業計画の要旨	29	2.	計画洪水量及び調節量	50
	1. 要旨	29	3.	貯水池	50
	2. 事業別面積	29	4.	洪水調節検討	51
			5.	管理計画	51

第8節	干拓計画	51
第9節	農用地整備計画	52
	1. 区画整理	52
	2. 暗渠排水	54
	3. 客土	55
	4. 農地保全	55
第10節	老朽ため池改修計画	56
	1. 洪水吐改修計画	56
	2. 堤体補強計画	56
	3. 取水施設改修計画	56
第5章	主要工事計画	57
第1節	用水施設	57
	1. 貯水池	57
	2. 頭首工	58
	3. 揚水機	58
	4. 用水路	59
	5. その他かんがい施設	59
第2節	排水施設	60
	1. 排水水門	60
	2. 排水機	60
	3. 排水路	61
	4. その他排水施設	61
第3節	道路及び索道	62
	1. 道路	62
	2. 索道	62
第4節	農用地造成	63
	1. 農用地造成	63
	2. 土壌改良	64
第5節	洪水調節施設	65
	1. 貯水池	65
	2. 頭首工及び導水路	65
第6節	干拓施設	65
	1. 堤防	65
	2. 潮止め	65
	3. 付属施設	65
	4. 埋立	65

第7節	農用地整備施設	66
	1. 区画整理	66
	2. 暗渠排水	67
	3. 客土	67
	4. 除礫	67
	5. 農地保全	68
第8節	老朽ため池改修施設	69
	1. 貯水池	69
	2. 堤体補強施設	69
第6章	附帯工事計画	70
第7章	工事の着手及び完了の予定時期	70
第8章	環境との調和への配慮	70
第9章	換地計画の概要	71
第1節	換地計画を作成する上での基本的な考え方	71
第2節	換地区の設定	71
	1. 換地区の名称、所在、面積	71
	2. 換地区を設定する理由	71
第3節	換地計画樹立の基本方針	72
	1. 従前の土地の地積の基準	72
	2. 用途別予定地積	73
	3. 農用地集団化の方針	74
	4. 非農用地の換地方法	74
第4節	土地の評価及び清算の方法	75
	1. 評価の方法	75
	2. 清算の方法	75
第5節	換地計画樹立の年度計画	75
第6節	換地処分 of 時期の関する特則	75
第10章	事業費の総額及び内訳	76
第11章	効用	76
第12章	関連する事業	77
第13章	現況・計画図面	78
	1. 位置図	78
	2. 現況計画平面図	78
	3. 土地利用計画図	78
	4. 主要構造図	78

第1章 目 的

本計画地域は、岩手県花巻市の中心部より西方約10kmの中山間地域に位置しており、地区内を南北に流れる一級河川豊沢川沿いに広がる水田地帯である。

本地区の農地は、一部昭和30年代に整備されているものの、区画形状は5aと小区画であるとともに、農道が狭小であり、農業用機械の通行に支障をきたしている。

また、地区内の幹線用水路は、急峻な山腹に建設されており浚渫等の維持管理に多大な労力を要し、末端水路は用排兼用の土水路が主であり、断面が狭小で深さも浅いため、十分な排水機能が果たせず、農業機械の作業効率低下を来たすとともに、乾田化による高収益作物の導入が困難な状況にある。

このような地区の問題を解消するため、農業基盤を整備し、併せて、担い手への農地集積・集約化を促進し、地域農業の発展に資するものである。

上段:変更後
下段:変更前

第2章 地 域 及 び 地 積

第1節 地 域

(第1表)

事業名	地 域
区 画 整 理	〃 岩手県花巻市湯口地内

第2節 地 積

(令和6年3月現在)

(令和3年2月現在) (第2表)

事業名	現況地目 市町村名	田 (ha)	畑 (ha)	原 野 (ha)	山 林 (ha)	その他 (ha)	計 (ha)	備 考
	〃 花巻市	24.0 25.3	1.1 0.8	0.6 0.4	0.0 0.1	1.8 2.1	27.5 28.7	
区 画 整 理	計	24.0 25.3	1.1 0.8	0.6 0.4	0.0 0.1	1.8 2.1	27.5 28.7	
	計							
合 計		24.0 25.3	1.1 0.8	0.6 0.4	0.0 0.1	1.8 2.1	27.5 28.7	

上段:変更後
下段:変更前

第3章 現 況

第1節 気象及び海象

1. 一般気象

〃

(岩手県農林水産部農村計画課 計画樹立参考資料 平成26年3月版) (第3表-1)

観測所名	花巻気象官署	かんがい期	非かんがい期	計又は平均	備 考
観測期間	〃 H15～H24年	〃 5月～8月	〃 9月～4月		
平均気温(℃)		〃 20.1	〃 6.0	〃 10.7	
降水量	平均(mm)	〃 568.7	〃 716.5	〃 1,285.2	
	基準年(mm)	〃 —	〃 —	〃 —	
降水日数	平均(日)	〃 44	〃 92	〃 137	
	基準年(日)	〃 —	〃 —	〃 —	
根雪期間		〃 12月24日～2月18日 57日間			
無霜期間		〃 5月4日～10月17日 167日間			
最多風向		〃 S	最大風速 (風向)	〃 17.1 m/s ()	最多風向発生時期 月～月 最大風速発生年月日

上段:変更後
下段:変更前

2. 特殊気象

〃
(岩手県農林水産部農村計画課 計画樹立参考資料 平成26年3月版)
(第3表－2)

観測所名	第 1 位			第 2 位			第 3 位			第 4 位			第 5 位			備 考
豊沢地域雨量観測所	数	年	発生確率	数	年	発生確率	数	年	発生確率	数	年	発生確率	数	年	発生確率	
観測期間 S28年～H24年	量	月 日		量	月 日		量	月 日		量	月 日		量	月 日		
最大日雨量 (mm)	〃 275.0	〃 H19. 9. 17	〃 1/-	〃 169.0	〃 S34. 9. 26	〃 1/25	〃 164.0	〃 S33. 10. 14	〃 1/21	〃 160.0	〃 H6. 9. 30	〃 1/18	〃 146.0	〃 H19. 9. 7	〃 1/10	
最大時間雨量 (mm)	〃 38.0	〃 H6. 9. 30	〃 1/31	〃 36.5	〃 H20. 7. 11	〃 1/22	〃 36.0	〃 H6. 9. 30	〃 1/20	〃 35.0	〃 H6. 9. 30	〃 1/17	〃 33.5	〃 H24. 10. 1	〃 1/12	
最大4時間雨量 (mm)	〃 131.0	〃 H6. 9. 30	〃 1/136	〃 110.0	〃 H6. 9. 30	〃 1/37	〃 106.0	〃 H6. 9. 30	〃 1/29	〃 103.5	〃 H24. 10. 1	〃 1/24	〃 91.5	〃 H24. 10. 1	〃 1/24	
最大3日連続雨量 (mm)	〃 300.0	〃 H19. 9. 18	〃 1/192	〃 293.0	〃 H19. 9. 19	〃 1/159	〃 284.0	〃 H19. 9. 17	〃 1/123	〃 269.0	〃 S56. 8. 23	〃 1/81	〃 210.0	〃 S54. 8. 6	〃 1/15	
最大連続旱天日数 (日)	〃 37	〃 S48. 6. 24	〃 1/-	〃 29	〃 H11. 7. 25	〃 1/243	〃 26	〃 S53. 7. 8	〃 1/53	〃 25	〃 S60. 7. 19	〃 1/34	〃 24	〃 S62. 5. 27	〃 1/22	

3. 海 象

〃
該当なし

上段:変更後
下段:変更前

第2節 土地状況

1. 地形、土壌及び侵食の程度

(第4表-1-1)

事業名	地 目	田						畑 ・ そ の 他								受益地標高 (m)		備考	
		傾斜区分	1/1,000 以 下	1/1,000 ～ 1/100	1/100 ～ 1/20	1/20 ～ 1/11.5	1/11.5 以上	計	3° 以下	3° ～8°	8° ～15°			15° ～20°	20° 以上	計	最高		最低
											8° ～10°	10° ～15°	8° ～15°						
区画整理	面積(ha)			24.0 25.3			24.0 25.3	1.1 0.8							1.1 0.8	〃 190	〃 160		
	比率(%)			〃 100			〃 100	〃 100							〃 100				
	面積(ha)																		
	比率(%)																		
合計	面積(ha)			24.0 25.3			24.0 25.3	1.1 0.8							1.1 0.8				
	比率(%)			〃 100.0			〃 100.0	〃 100.0							〃 100.0				

上段:変更後
下段:変更前

〔土壌〕

(第4表-1-2)

項 目 土 壤 統 (区) 名	土 壤 統 (区) 区 分 一 覧 表										面 積 (ha)			備 考
	土 壤 断 面								堆 積 様 式	母 材	事 業 名			
	色	腐 植 層	礫 層	酸 化 沈 殿 物	土 性		泥 炭 層 黒 泥 層 及びグライ層	区 画 整 理				計		
					表土	下層土								
					一層	二層							三層	
茗荷統 礫層土壌 粘土型 J-91	〃 10YR3/2	〃 表層腐植層	〃 あり	〃 あり	〃 強粘土	〃 礫質		〃 なし	〃 崩積	〃 非固結堆積岩 固結堆積岩	25.1 26.1		25.1 26.1	
計											25.1 26.1		25.1 26.1	

〃
該当なし

(第4表-1-3)

事業名	区 分	土 壤 の 流 亡 率				年 平 均 流 亡 速 度				ガ リ 浸 食 の 程 度		備 考
		0	0～25%	25～50%	50%以上	0	3mm未満	3～5mm	5mm以上	中程度のもの	大なるもの	
	面積(ha)											
	比率(%)											

上段:変更後
下段:変更前

2. 土地分類

//
該当なし

(第4表-2-1)

市町村名	農用地造成										計 (ha)	備考
	一級地 (ha)	二級地				三級地				四級地		
		※ (ha)	3° ～8° (ha)	8° ～ (ha)	12° ～15° (ha)	※ (ha)	15° ～20° (ha)	20° ～25° (ha)	25° ～30° (ha)	30° 以上 (ha)		
計												

//
該当なし

(第4表-2-2)

市町村名	干拓					備考
	一級地 (ha)	二級地 (ha)	三級地 (ha)	四級地 (ha)	計 (ha)	
計						

上段:変更後
下段:変更前

3. 土地利用の状況

(令和7年7月現在)
(令和3年2月現在) (第4表-3)

事業名	土地利用別 市町村名	耕 地						山 林		採 草 放 牧 地	原 野	そ の 他	計	備 考
		水 田 (ha)	普 通 畑 (ha)	牧 草 畑 (ha)	果 樹 園 (ha)	茶 園 (ha)	そ の 他 の 地 (ha)	用 材 林 (ha)	薪 炭 林 (ha)					
区 画 整 理	花巻市	24.0 25.3	1.1 0.8					0.0 0.1			0.6 0.4	1.8 2.1	27.5 28.7	
合 計		24.0 25.3	1.1 0.8					0.0 0.1			0.6 0.4	1.8 2.1	27.5 28.7	

上段:変更後
下段:変更前

4. 土地所有の状況

(令和7年7月現在)
(令和3年2月現在) (第4表-4)

事業名	所有別 区 分	個人有	市有	県有	国有			計	備 考
区 画 整 理	面 積(ha)	25.8 26.7	1.7 2.0	- 0.0	〃 -			27.5 28.7	
	受益者数(人)	33 31						33 31	
	筆 数(筆)	561 576	100 122	- 4	〃 -			661 702	
	権 利 関 係 備 考 (関係戸数)	33 31						33 31	
合 計	面 積(ha)	25.8 26.7	1.7 2.0	- 0.0	〃 -			27.5 28.7	
	受益者数(人)	33 31						33 31	
	筆 数(筆)	561 576	100 122	- 4	〃 -			661 702	
	権 利 関 係 備 考 (関係戸数)	33 31						33 31	

第3節 水利状況

1. 用水状況


本地区の水源は、普通河川大沢川に設置された、頭首工から取水しているほか、沢水からの自然取水もある。

また、頭首工からの幹線水路は、急峻な山腹に建設されており浚渫等の維持管理に多大な労力を要し、末端水路は用排兼用の土水路が多く、漏水が生じており、用水供給が不安定になっているとともに、水管理及び維持管理等に多大な労力と経費を費やしている状況にある。

(1) 用水系統


次頁参照

大沢地区 現況用水系統図

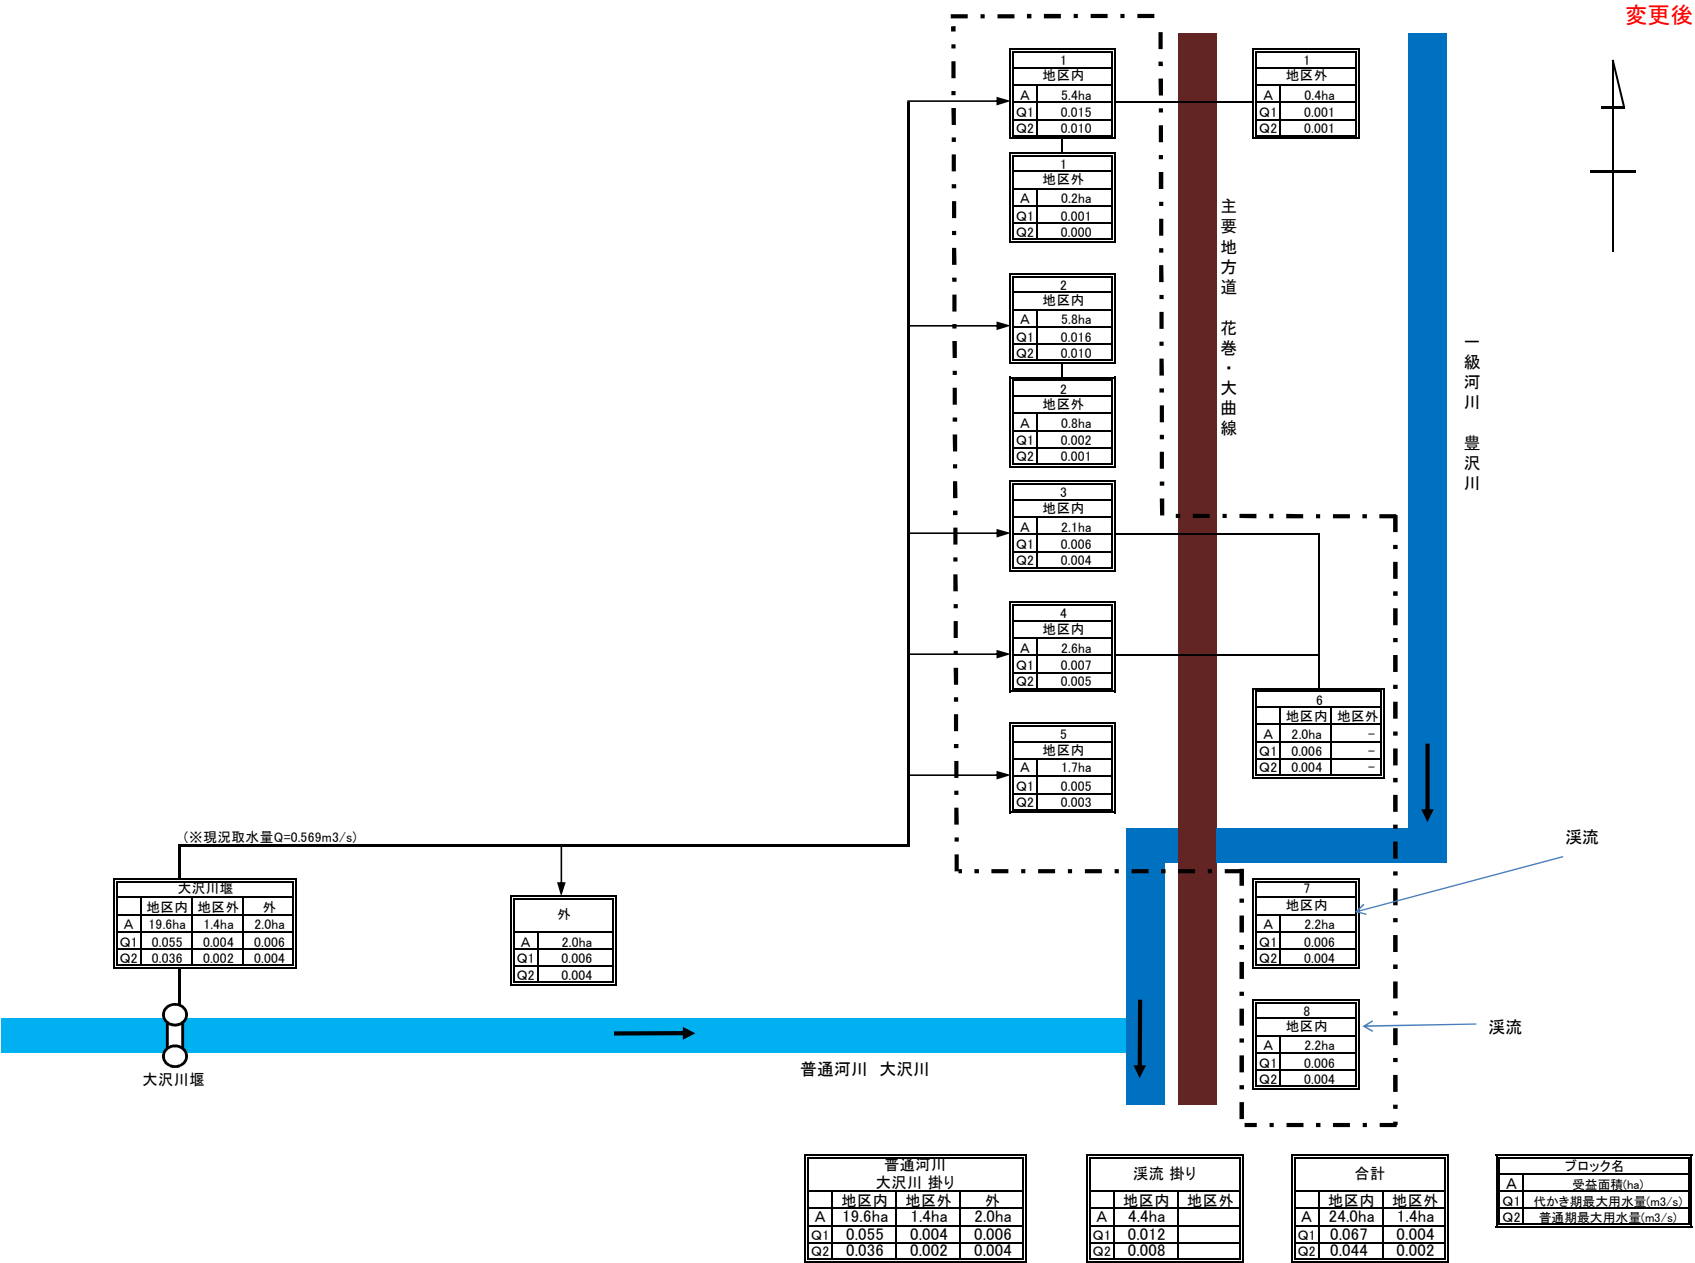

大沢地区 現況用水系統図

変更前

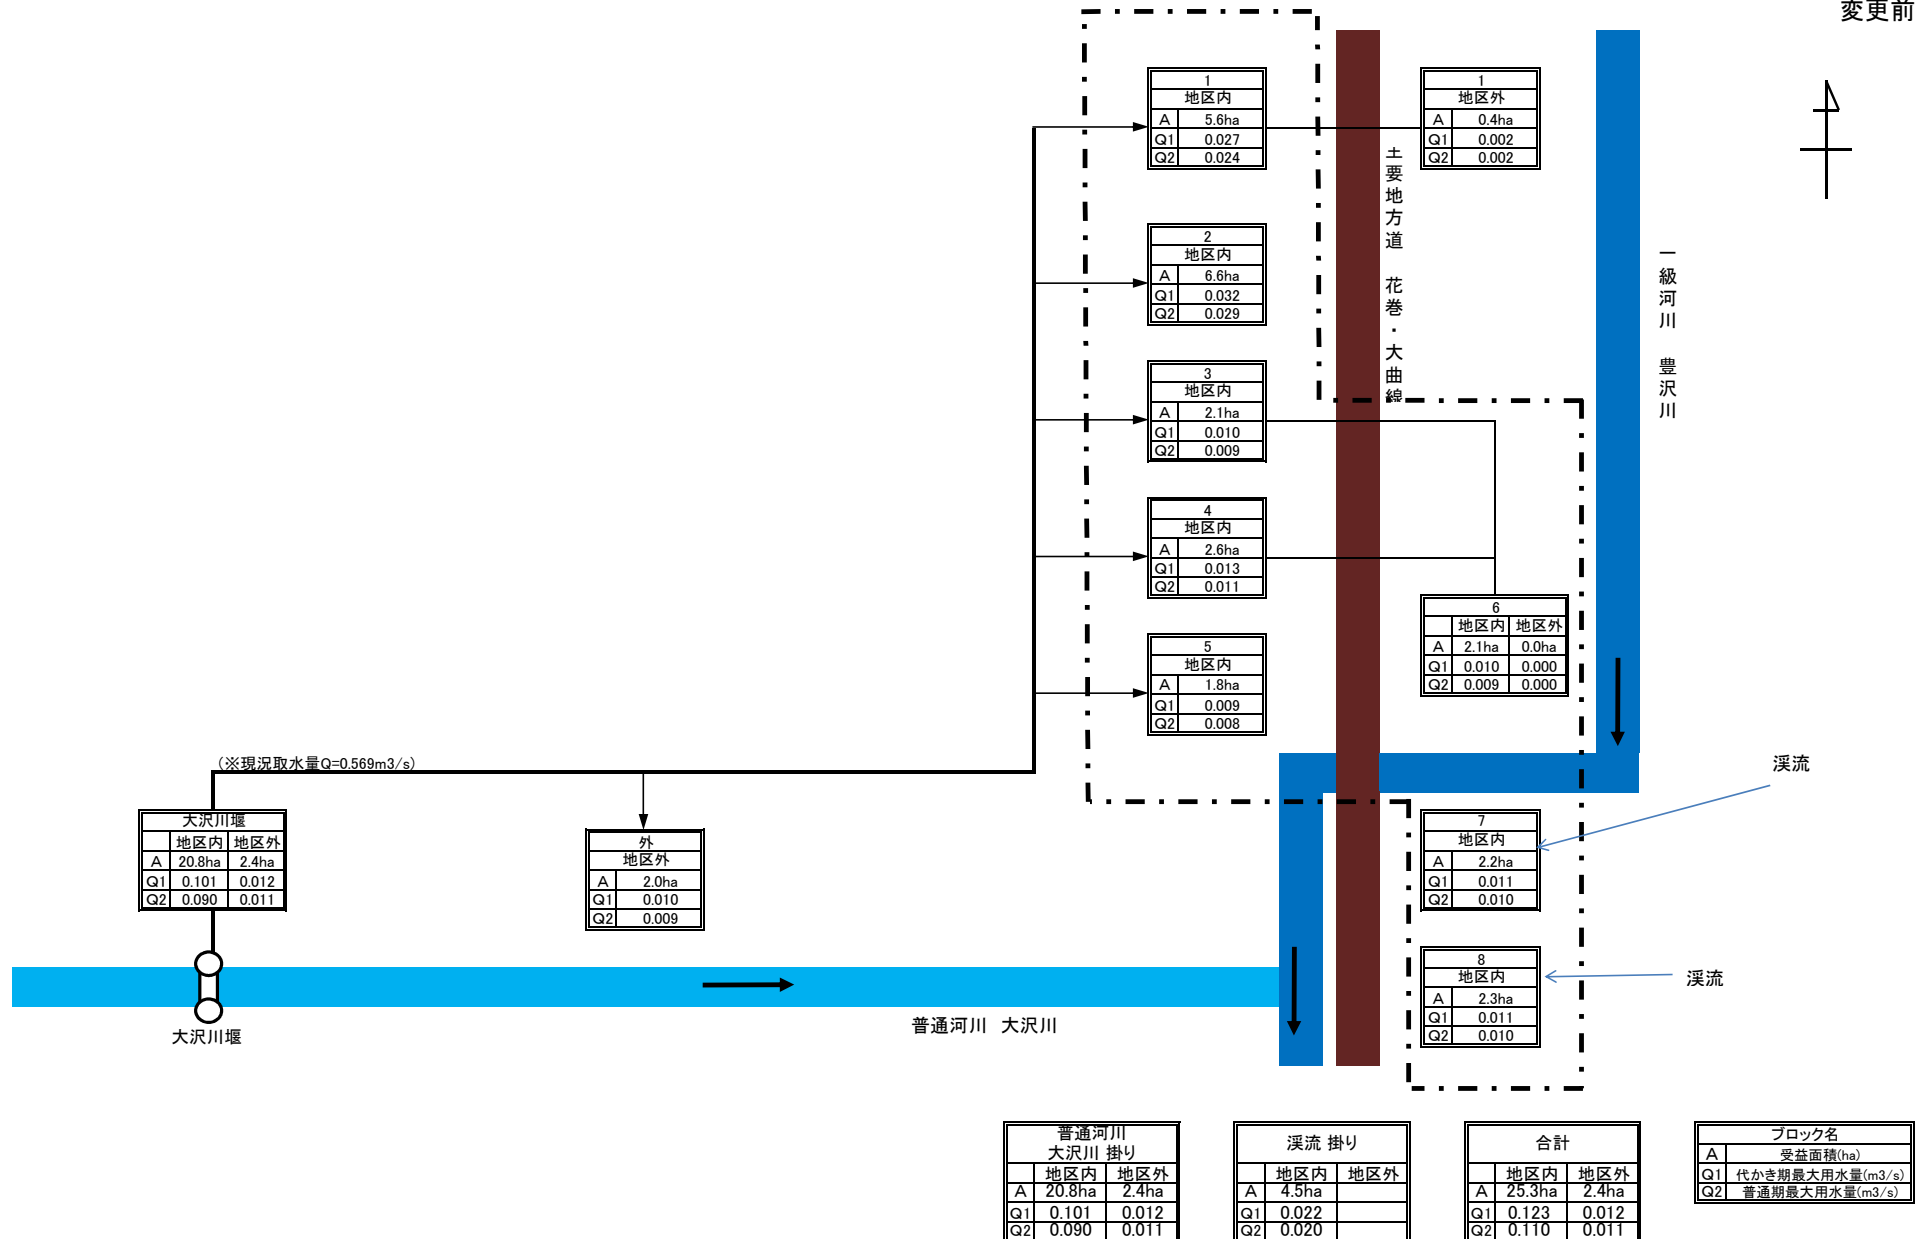

上段:変更後
下段:変更前

(2) 用水施設

(ア) 取水方法一覧表

(第5表-1)

事業名	項 目 施設名	か ん が い 面 積						計		水利権		慣行水利権		延取水量	備 考
		500ha以上		500～100ha		100ha未満									
	箇所	ha	箇所	ha	箇所	ha	箇所	ha	箇所	m ³ /s	箇所	m ³ /s	m ³ /s		
区 画 整 理	貯 水 池	〃 －	〃 －	〃 －	〃 －	〃 －	〃 －	〃 －	〃 －	〃 －	〃 －	〃 －	〃 －	－ 0.101	代掻き
	井 堰	〃 －	〃 －	〃 －	〃 －	〃 1	19.6 20.8	〃 1	19.6 20.8	〃 －	〃 －	〃 －	〃 －	0.055 －	普通河川
	自然取水口	〃 －	〃 －	〃 －	〃 －	〃 2	4.4 4.5	〃 2	4.4 4.5	〃 －	〃 －	〃 －	〃 －	0.012 0.022	沢水
	揚 水 機	〃 －	〃 －	〃 －	〃 －	〃 －	〃 －	〃 －	〃 －	〃 －	〃 －	〃 －	〃 －	〃 －	1級河川
	そ の 他	〃 －	〃 －	〃 －	〃 －	〃 －	〃 －	〃 －	〃 －	〃 －	〃 －	〃 －	〃 －	〃 －	
	計	〃 －	〃 －	〃 －	〃 －	〃 3	24.0 25.3	〃 3	24.0 25.3	〃 －	〃 －	〃 －	〃 －	0.067 0.123	
合 計		〃 －	〃 －	〃 －	〃 －	〃 3	24.0 25.3	〃 3	24.0 25.3	〃 －	〃 －	〃 －	〃 －	0.067 0.123	

上段:変更後
下段:変更前

(イ) 改修を要する施設一覧表

(第5表-2)

事業名	項 目 施設名	施設名 又は 箇所数	受益面積 (ha)	構 造	規 模	新設年 又は 更新年	改修を必要 とする理由	備 考
区 画 整 理	貯 水 池							
	井 堰							
	自然取水口							
	揚 水 機							
	用 水 路		24.0 25.3	〃 土水路	〃 土水路 L=6,918m	〃 S30～40年代	〃 区画整理	
	そ の 他							
	計		24.0 25.3					
合 計			24.0 25.3					

上段:変更後
下段:変更前

(3) 用水に関する被害状況

(ア) 用水不足による被害状況 該当なし

(第5表-3-1)

事業名	項目 系統名	かんがい 面積 (ha)	現況 必要水量 (千m³)	不足水量				平均減産量 (t)	平均 維持管理費 (千円)	備考
				かんがい期最大不足水量		かんがい期総不足水量				
				平均(m³/s)	基準年(m³/s)	平均(m³/s)	基準年(m³/s)			
	計									
合 計										

(イ) その他の被害状況 該当なし

(第5表-3-2)

事業名	時期別	かんがい面積 (ha)	水温(℃)		被害量 (t)	備考
			最高	最低		

上段:変更後
下段:変更前

(4) ため池決壊の場合の想定被害状

//
該当なし

(第5表-3-3)

事業名	想定被害面積(ha)				想定被害額(千円)						人命 (人)	備考
	水田	畑	その他	計	作物	農地	農業用施設	公共施設	家屋その他	計		
計												
合計												

2. 排水状況


本地区では、山間部からの排水が地区内排水路に流入しているが、大雨の際は地区内水路の断面不足により越水する恐れがあり、
農作物への被害が懸念される。

また、水路深さが浅く十分な排水機能を果たしておらず、農業機械の作業効率の低下を来しているとともに、土水路が大半のため水管理及び維持管理にも多大な労力と経費を費やしている。

(1) 排水系統 次頁参照

大沢地区 現況排水系統図


変更後

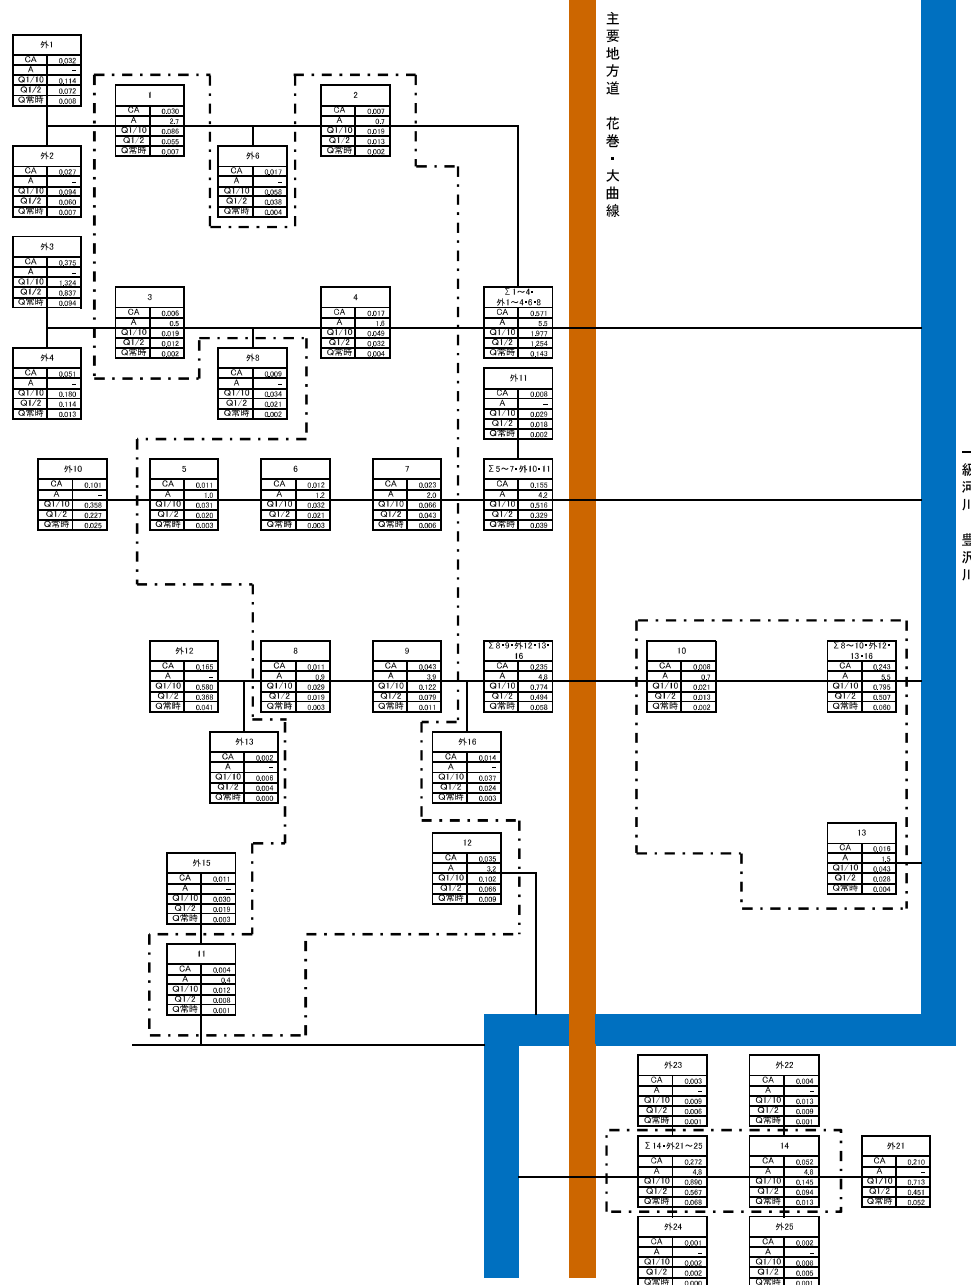

地区内		地区外		凡 例	
CA	0.275	CA	1.032	CA	流域番号
A	25.1	A	-	A	流域面積 (km ²)
Q1/10	0.778	Q1/10	3.589	Q1/10	10年確率排水量 (m ³ /s)
Q1/2	0.503	Q1/2	2.275	Q1/2	2年確率排水量 (m ³ /s)
常時	0.070	常時	0.257	常時	常時排水量 (m ³ /s)

大沢地区 現況排水系統図

变更前

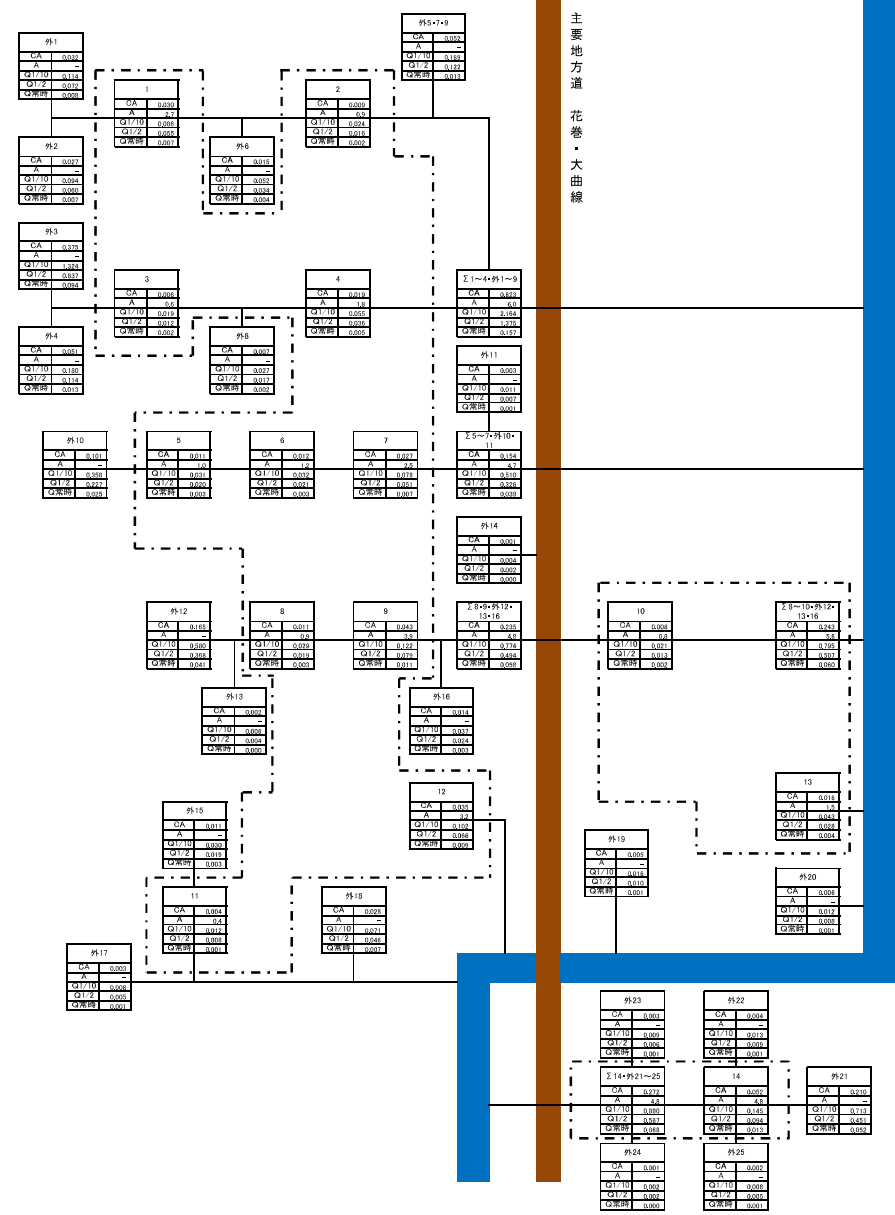

凡 例		
地区内	地区外	流域番号
CA 0.284	CA 1.117	GA 流域面積 (km2)
A 26.1	A -	A 受益面積 (ha)
Q1/10 0.799	Q1/10 3.858	Q1/10 10年確率排水量 (m3/s)
Q1/2 0.518	Q1/2 2.449	Q1/2 2年確率排水量 (m3/s)
常時 0.072	常時 0.279	常時 常時排水量 (m3/s)

上段:変更後
下段:変更前

(2) 排水施設

(ア) 排水方法一覧表

(第5表-4)

事業名	項目 施設名		排水面積						計		排水慣行 (m ³ /s)	現況排水能力 (m ³ /s)	備考
			500ha以上		500～100ha		100ha未満						
	箇所	ha	箇所	ha	箇所	ha	箇所	ha					
区画整理	自然	排水路					1	130.7 140.1	1	130.7 140.1		4.365 4.657	
		水門											
	機械	排水機											
		水門及び排水機											
		排水路及び排水機											
		計						1	130.7 140.1	1	130.7 140.1		
	合計						1	130.7 140.1	1	130.7 140.1			

(イ) 改修を要する施設一覧表

(第5表-5)

(第5表-5)

事業名	項目		施設名 又は 箇所数	受益面積 (ha)	構 造	規 模	新 設 年 又は 更 新 年	改修を必要 とする理由	備 考
	施 設 名								
区画整理	自然	排水路	1	25.1 26.1	土水路	L=6,918m		区画整理に伴う改修	
		水門							
	機械	排水機							
		水門及び排水機							
		排水路及び排水機							
		計		1					
	合 計		1						

上段:変更後
下段:変更前

(3) 排水に関する被害状況

//
該当なし

(第5表-6)

事業名	項目 系統名	排水面積 (ha)	降水量 (mm)		湛水状況				乾湿状況 (ha)						平均減産量 (t)	平均維持 管理費 (千円)	備考	
					湛水深 (cm)	湛水時間 (hr)	湛水面積 (ha)	湛水量 (千m³)	田		畑		その他					
	乾								湿	乾	湿	乾	湿					
			平均															
			基準年															
			平均															
			基準年															
			平均															
			基準年															
			平均															
			基準年															
	計		平均															
			基準年															
合計			平均															

上段:変更後
下段:変更前

3. 河 川 の 状 況

(1) 河川の現況

//
該当なし

(第5表-7)

項目 河川名	流路状況	勾 配	断 面	安全洪水量 (m ³ /s)	既往最大洪水量 (m ³ /s)	備 考

(2) 洪水に関する被害状況

//
該当なし

(第5表-8)

項目 区分	農 用 地 (千円)	農 用 施 設 (千円)	作 物 (千円)	公 共 施 設 (千円)	備 考
過去の最大被害額					
平均被害額					

第4節 道路概況

1. 道路概況

本地区は、主要地方道花巻大曲線(2車線・AS舗装)が中央を南北に走っており、これにその他市道が接続している。

ほ場内にある農道は、砂利道で幅員も2.0m～3.0mと狭く、路面状態が軟弱、かつ道路勾配が急であり、また、農道(耕作道)と呼べるほどの道路がないほ場もあり、田越しに通作していることから、農作業機械の通行、作業等に支障をきたしている状況である。

2) 主要道路一覧表

変更前後同

No.	路 線 名	管理区分別	延 長 (m)	幅 員 (m)		構 造	改修の要否	備 考 (道路番号)
				全 幅	有 効			
1	その他市道 日陰坂線	市役所	452	4.0	3.0	砂利	要	1-6911
2	その他市道 渡り・大沢線	〃	1,037	5.5	4.0	AS	否	1-6951
3	その他市道 坂ノ上・水上線	〃	684	2.0		砂利	要	1-6952
4	その他市道 細野・坂ノ上線	〃	252	2.2		砂利	〃	1-6953
5	その他市道 渡り・細野線	〃	226	2.0		砂利	〃	1-6954
6	その他市道 渡り・坂ノ上線	〃	190	2.2		砂利	〃	1-6955
7	その他市道 坂ノ上・水上境線	〃	197	3.5		砂利	〃	1-6956
8	その他市道 水上南線	〃	189	2.0		砂利	〃	1-6957
9	その他市道 水上中央線	〃	173	2.0		砂利	〃	1-6958
10	その他市道 水上北境線	〃	113	2.0		砂利	〃	1-6959
11	その他市道 水上・大沢線	〃	130	5.5	4.0	AS	否	1-6960
12	その他市道 大沢温泉南線	〃	177	8.0	6.5	AS	〃	1-6961
13	農道 地区内耕作道	〃	1,593	1.6～3.0		砂利	要	
14	主要地方道 花巻大曲線	県	—			AS	否	

[illegible]

3) 現況道路網図


【変更後】

凡例
 ■ 緑色：新設
 ■ 黄色：旧道
 ■ 茶色：既道

出典：国土院「地形データ」
 作成：国土院「地形データ」
 編集：国土院「地形データ」

調査年度		備考
調査年度	調査年度	
調査年度	調査年度	
調査年度	調査年度	
調査年度	調査年度	

[illegible][illegible]

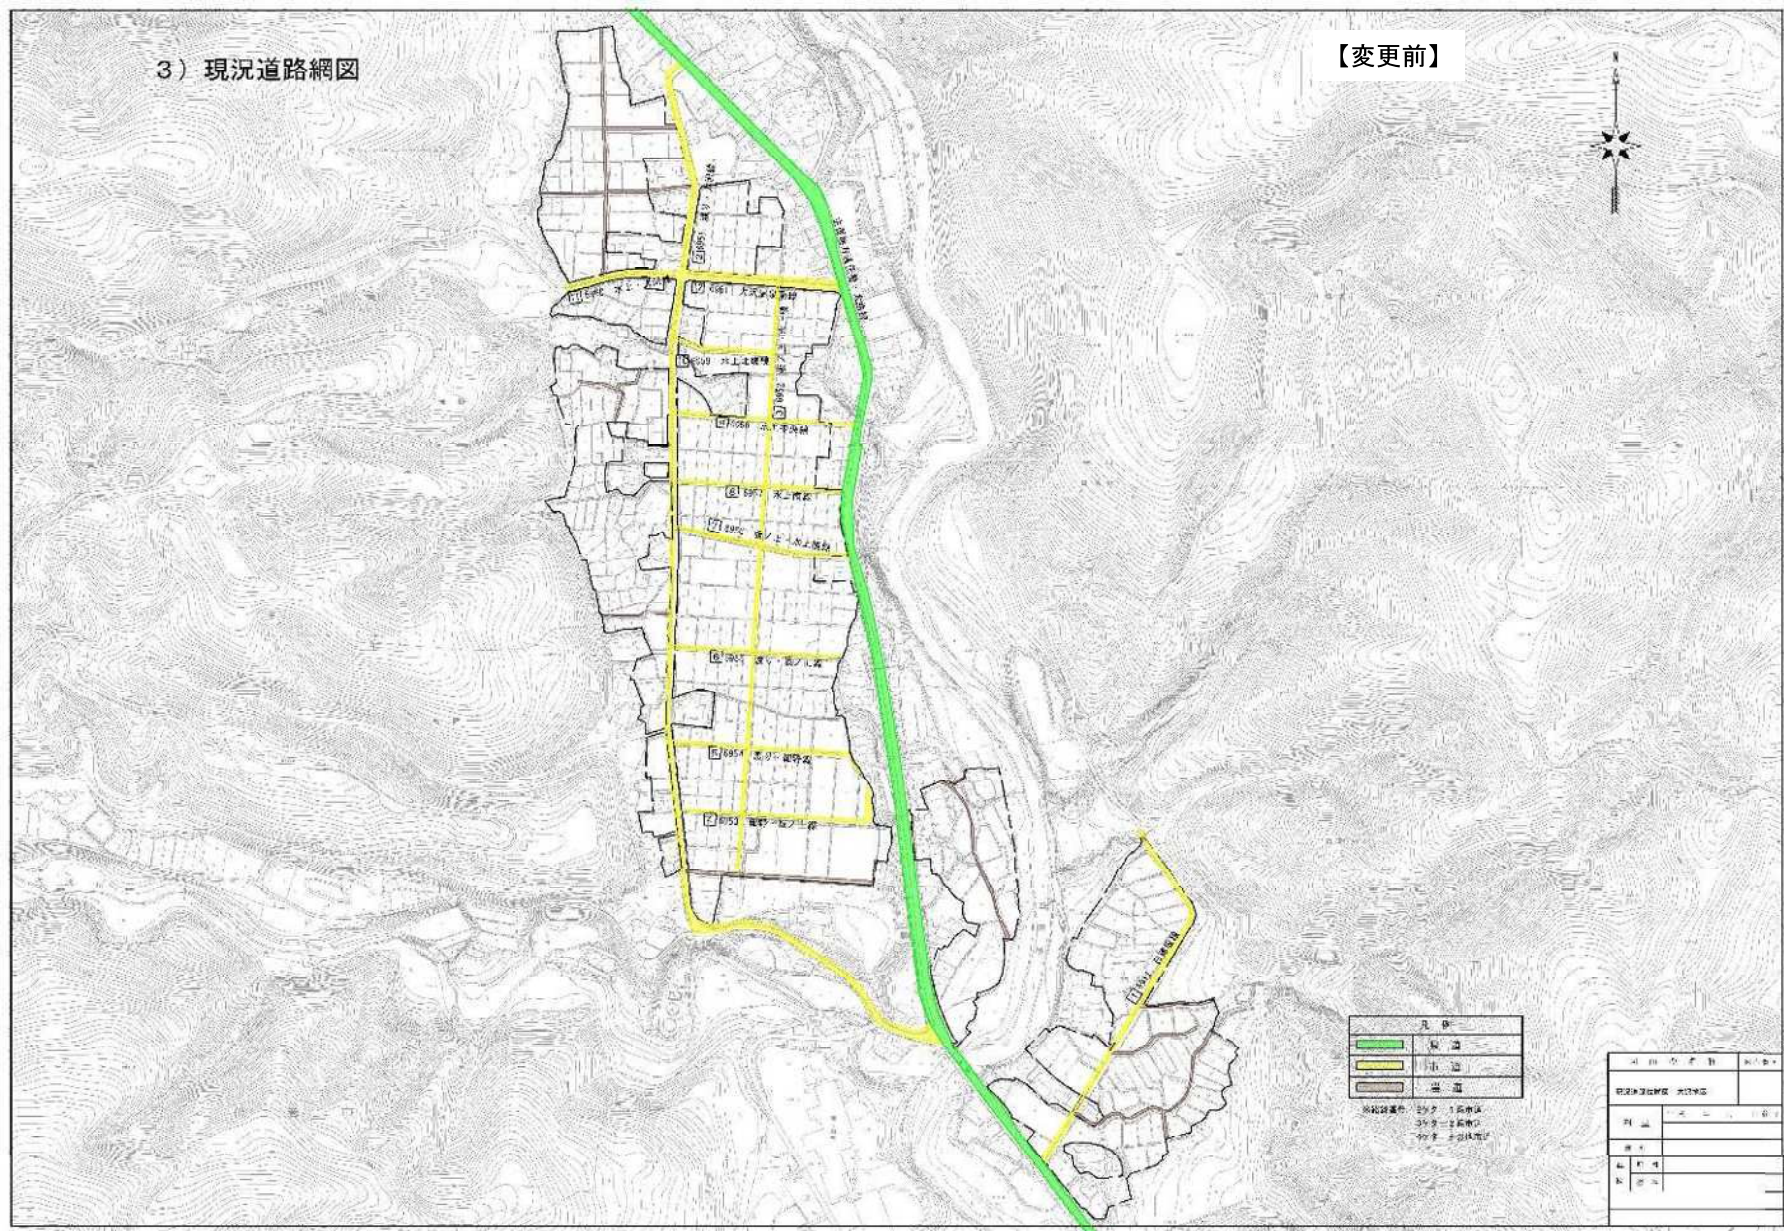

上段:変更後
下段:変更前

第5節 地域農業の概況

1. 産業別就業人口

(岩手県統計年鑑(R2 国勢調査))

(岩手県統計年鑑)

(第7表-1)

項 目 市町村名	総 数 (人)	農 業 (人)	林 業 (人)	漁 業 (人)	鉱 業 (人)	建設業 (人)	製造業 (人)	電気ガス熱 供給水道業 (人)	運 輸 通信業 (人)	卸売小売業 飲食店 (人)	金 融 保険業 (人)	不動産業 (人)	サービス業 (人)	公 務 (人)	その他 (人)	備考
花巻市	47,508 49,915	4,927 6,379	128 155	// 7	19 31	3,442 3,621	9,187 9,280	179 182	3,001 2,907	6,879 7,690	628 766	436 380	7,912 7,873	1,557 1,563	9,206 9,081	
計	47,508 49,915	4,927 6,379	128 155	// 7	19 31	3,442 3,621	9,187 9,280	179 182	3,001 2,907	6,879 7,690	628 766	436 380	7,912 7,873	1,557 1,563	9,206 9,081	
比 率 (%)	// 100%	10% 13%	// 0%	// 0%	// 0%	// 7%	// 19%	// 0%	// 6%	14% 15%	// 2%	// 1%	17% 16%	4% 3%	20% 18%	

上段:変更後
下段:変更前

2. 経営耕地広狭別農家数及び耕地の分散状況並びに専兼業別農家数

(2020農林業センサス)

(2010農林業センサス)

(第7表-2)

市町村名	農家総戸数 (戸)	経営耕地広狭別農家数 (戸)											一戸当たり 平均農用地面積 (ha)						耕地の 分散状況		専兼業別 農家数 (戸)			備考
		例外規定の適用を受けるもの	0.3	0.5	1.0	1.5	2.0	3.0	5.0	10.0	自給的農家	田	畑	樹園地	小計	その他	計	一戸当たり団地数	団地当たり面積(ha)	専業	兼業			
			～	～	～	～	～	～	～	ha											第一種	第二種		
			0.5	1.0	1.5	2.0	3.0	5.0	10.0	以上														
花巻市	4,618 6,772	〃 －	－ 662	－ 1,395	－ 1,009	－ 706	－ 748	－ 511	－ 284	－ 48		1,311 1,409	2.25 1.31	0.29 0.07	0.07 0.06	2.61 1.44	－ 0.06	2.61 1.50	〃 －	〃 －	－ 966	－ 832	－ 3,565	
計	4,618 6,772	〃 －	－ 662	－ 1,395	－ 1,009	－ 706	－ 748	－ 511	－ 284	－ 48		1,311 1,409	2.25 1.31	0.29 0.07	0.07 0.06	2.61 1.44	－ 0.06	2.61 1.50	〃 －	〃 －	－ 966	－ 832	－ 3,565	
比率	〃 100%	〃 －	－ 10%	－ 21%	－ 15%	－ 10%	－ 11%	－ 8%	－ 4%	－ 1%		28% 20%	86% 87%	11% 5%	3% 4%	100% 96%	－ 4%	〃 100%	〃 －	〃 －	－ 18%	－ 16%	－ 66%	

上段:変更後
下段:変更前

3. 動力農機具及び主要家畜頭数

(2020農林業センサス)

(2010農林業センサス)

(第7表-3)

項 目 市町村名	動 力 農 機 具								主 要 家 畜						備考
	耕うん機及びトラクター		動力防除機		動力田植機		コンバイン		乳 用 牛		肉 用 牛		豚		
	数 量 (台)	戸 数 (戸)	数 量 (台)	戸 数 (戸)	数 量 (台)	戸 数 (戸)	数 量 (台)	戸 数 (戸)	数 量 (頭)	戸 数 (戸)	数 量 (頭)	戸 数 (戸)	数 量 (頭)	戸 数 (戸)	
花巻市	- 4,915	- 4,233	// -	// -	- 3,660	- 3,592	- 2,844	- 2,911	922 926	23 52	- 3,527	195 352	9,614 6,138	5 12	
計	- 4,915	- 4,233	// -	// -	- 3,660	- 3,592	- 2,844	- 2,911	922 926	23 52	- 3,527	195 352	9,614 6,138	5 12	
100戸当たり 数 量 (台、頭)	- 73		// -		- 54		- 42		20 14		- 52		208 91		農家戸数 4,618戸 6,772戸
利用戸数 割 合 (%)	- 63%		// -		- 53%		- 43%		0% 1%		4% 5%		// 0%		

上段:変更後
下段:変更前

4. 主要作物作付状況

(2020農林業センサス)
(2010農林業センサス)

(第7表-4)

市 町 村 名		花巻市				計	平 均	作付率 (%)	備 考
総耕地面積 (ha)		15,800 15,900				15,800 15,900			
区 分		作付面積 (ha)	単 位 面 積 当たり収量 (kg/10a)	作付面積 (ha)	単 位 面 積 当たり収量 (kg/10a)	作付面積 (ha)	単 位 面 積 当たり収量 (kg/10a)		
作物名									
田	表 作	水 稲	7,660 6,115	564 568		7,660 6,115	564 568	63 80	
		豆 類(大豆他)	417 -	135 -		417 -	135 -	4 -	
		麦 類(小麦他)	1,100 -	213 -		1,100 -	213 -	9 -	
		その他	1,205 -	- -		1,205 -	- -	10 -	
		裏 作							
	小 計		10,382 6,115			10,382 6,115		86 80	
	普 通 畑	麦 類(小麦他)	- 245	- 176		- 245	- 176	- 3	
		豆 類(大豆他)	- 107	- 94		- 107	- 94	- 1	
		野菜類(玉ねぎ他)	197 250	2,093 2,117		197 250	" 2,117	2 3	
		雑穀(そば他)	364 257	30 46		364 257	" 46	" 3	
		花き類・花木	28 -	- -		- -	- -	- -	
		その他	764 274			764 274		6 4	
		計	1,353 1,133			1,353 1,133		11 15	
		果樹類(りんご他)	345 430			345 430		3 6	
		小 計	345 430			345 430		3 6	
	計		12,080 7,678			12,080 7,678		100 100	
市 町 村 別 延べ作付率(%)			76 48			76 48			

上段:変更後
下段:変更前

5. 農業の動向

(2010, 2015, 2020農林業センサス)
(H22年農林業センサス)

(第7表-5)

項 目 区 分	農 家			土 地			主 要 作 物			主 要 家 畜			動力農機具			その他	地 域 指定等	備 考
		B (H27) (H22)	A (R2) (H27)		B (H27) (H22)	A (R2) (H27)	作物名	B (H27) (H22)	A (R2) (H27)	家畜名	B (H27) (H22)	A (R2) (H27)	農機具名	B (H27) (H22)	A (R2) (H27)			
変化の 状 況 (C年を100 とする指数)	総農家数	86 88	68 70	耕 地	90 92	119 72	水 稻	89 87	98 73	乳用牛	49 85	43 73	耕耘機 トラクター	84 72	- 57		振興山村 S48	A:令和2年 (2015)
	専業農家数	89 129	- 156	田	91 93	117 71	雑 穀	53 952	56 1223	肉用牛	72 64	54 45	動力田植機	91 93	- 71		農 振 S45	A:平成22年 (2010)
	第1種兼業 農 家 数	75 113	- 71	畑	82 81	142 30	大 豆	81 284	76 125	豚	69 88	38 66	コンバイン	84 107	- 76		特定農山村 H5	B:平成27年 (2015)
	第2種兼業 農 家 数	83 79	- 61	樹園地	90 87	77 79	小 麦	95 536	104 189	採卵鶏	76 142	61 171	動力防除機	- 76	〃 -		野 菜 S45	B:平成17年 (2005)
	農 業 従事者数	76 78	54 60	草 地	- 100	- 134	野 菜	78 129	73 79								果 樹 H2	C:平成22年 (2010)
																	酪 農 H24	C:平成12年 (2000)
変化の 理 由	〃 総農家数、農業従事者は減少しているものの、農地集積や担い手対策の推進、認定農業者や法人組織育成の取組みが行われており、専業農家が増加している。			〃 農地転用が進み農用地の減少が進んでいる。			〃 水稻は水田畑利用の推進により、近年は横ばいになっている。また、転作農地の有効利用が進んでいる。			〃 畜産農家が減少している。			〃 農作業の省力化を図るため、大型トラクター、コンバインの導入が進んでいる。一方、水稻の作付面積が減少しているため農機具も減少傾向にある。					

第6節 地域環境の概況

〃

本地区は、豊沢川上流部に広がる河岸段丘上の水田地帯で、周囲は森林に囲まれており、森林地帯を含めた地域一体の田園風景が安らぎや憩いの空間を創設している。

また、地区内の農地や水路に隣接する法面、ため池周辺では、オオニガナ、モリアオガエル、カワニナ、コセアカアメンボなどの植物、両生類、貝類、昆虫類の様々な生き物の生息が確認されている。

第4章 一般計画

第1節 事業計画の要旨

1. 要 旨

農地の大区画化、用排水路と農道の整備を実施し、農業生産性の向上をめざす。

また、暗渠排水を施し、耕地の汎用化を促進して、農作業効率の向上を図り、土地の生産性を高める。

環境との調和への配慮として、整備区域内の法面等に生育する希少種の植物は近傍の類似環境へ移植する。また、移植が

難しい希少種が生育する区域は現況保存とするなど、生態系に配慮した計画とする。

2. 事業別面積

(第8表)

事業名 土地 利用区分 事業目的	区画整理																		計 (ha)	備 考
	水 田 (ha)	普 通 畑 (ha)	牧 草 畑 (ha)	果 樹 園 (ha)	そ の 他 (ha)	小 計 (ha)	水 田 (ha)	普 通 畑 (ha)	牧 草 畑 (ha)	果 樹 園 (ha)	(ha)	小 計 (ha)	水 田 (ha)	普 通 畑 (ha)	牧 草 畑 (ha)	果 樹 園 (ha)	(ha)	小 計 (ha)		
区画整理	19.9 23.1	1.1 -	" -	" -	6.5 5.6	27.5 28.7													27.5 28.7	
計	19.9 23.1	1.1 -	" -	" -	6.5 5.6	27.5 28.7													27.5 28.7	

第2節 営農計画及び土地利用計画

1. 営農計画の概要

本事業により農地の集団化、ほ場の汎用化、及び大型機械の導入をめざした土地基盤の整備を実施し、土地の高度利用と農業経営の近代化を図る。

また、現在組織されている農業生産法人への集積拡大を図り、水稻を中心に、穀類（そば、ハトムギ）の栽培を行い、玉ねぎの新規園芸品目にも取り組み、農業経営の安定化を図る。

2. 土地利用区分

(第9表-1)

事業名	土地利用 区分	水 田 (ha)	普通畑 (ha)	牧草畑 (ha)	果樹園 (ha)	茶 園 (ha)	その他 (ha)	小 計 (ha)	原 野 (ha)	山 林 (ha)	その他 (ha)	計 (ha)	備考
区画整理	現 況	24.0 25.3	1.1 0.8	〃 -	〃 -	〃 -	0.0 -	25.1 26.1	0.6 0.4	0.0 0.1	1.8 2.1	27.5 28.7	
	計 画	19.9 23.1	1.1 -	〃 -	〃 -	〃 -	0.6 -	21.6 23.1	〃 -	〃 -	5.9 5.6	27.5 28.7	
計	現 況	24.0 25.3	1.1 0.8	〃 -	〃 -	〃 -	0.0 -	25.1 26.1	0.6 0.4	0.0 0.1	1.8 2.1	27.5 28.7	
	計 画	19.9 23.1	1.1 -	〃 -	〃 -	〃 -	0.6 -	21.6 23.1	〃 -	〃 -	5.9 5.6	27.5 28.7	

上段:変更後
下段:変更前

3. 作付方式

(第9表-2)

事業名	項目	経営 類型	土地利用 区 分	1 年 目												2 年 目												3 年 目												4 年 目												備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
区 画 整 理	現 況	水稲 ＋ 雑穀	田																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</

上段:変更後
下段:変更前

4. 生産計画

(現況本地率 水田:93.5% 〃)
(現況本地率 水田:93.7% 畑:97.5%)
(計画本地率 水田:94.2% 〃)
(計画本地率 水田:94.6% 畑:98.5%)

(第9表-3)

事業名	項 目 土地利用区分		作物名	作付面積 (ha)			作付率 (%)		単位面積当たり収穫量(kg/10a)			生産量 (t)			同左生産量増減の内訳 (t)		備考	
				現況	計画	増減	現況	計画	現況	計画	増減	現況	計画	増減	面積増減	単位面積当たり 収量増加		
区画整理	水田	表作	水稻	8.2 8.6	9.9 10.9	1.7 2.3	34.9 35.1	〃 50.0	558 568	604 615	46 47	45.8 48.9	59.8 67.1	14.0 18.2	9.5 13.1	4.5 5.1		
			そば	7.5 8.0	4.2 5.2	△ 3.3 △ 2.8	31.9 32.6	21.3 23.9	〃 46	〃 73	〃 27	3.5 3.7	3.1 3.8	△ 0.4 0.1	△ 1.5 △ 1.3	1.1 1.4		
			はとむぎ	〃 -	4.1 5.2	4.1 5.2	〃 -	20.7 23.9	103 76	164 121	61 45	〃 -	6.7 6.3	6.7 6.3	4.2 4.0	2.5 2.3		
			玉ねぎ	〃 -	〃 0.5	〃 0.5	〃 -	2.5 2.2	2,093 2,117	2,400 2,440	307 323	〃 -	12.0 12.2	12.0 12.2	10.5 10.6	1.5 1.6		
	自己保全管理 調整水田	6.7 7.1	〃 -	△ 6.7 △ 7.1	28.5 29.0	〃 -												
	小 計			22.4 23.7	18.7 21.8	△ 3.7 △ 1.9	95.3 96.7	〃 100.0										
	普通畑	春夏秋作	そば	-	0.5	0.5	-	2.5	46	46	-	-	0.2	0.2	0.2	-		
			はとむぎ	-	0.6	0.6	-	3.0	103	103	-	-	0.6	0.6	0.6	-		
			自己保全管理	1.1 0.8	〃 -	△ 1.1 △ 0.8	4.7 3.3	〃 -										
小 計			1.1 0.8	1.1	- △ 0.8	4.7 3.3												
合 計			23.5 24.5	19.8 21.8	△ 3.7 △ 2.7	〃 100.0	〃 100.0											

※作付面積は本地面積で整理

上段:変更後
下段:変更前

5. 労働改善計画

(計画本地率 水田:94.2%)

(計画本地率 水田:94.6%)

(第9表-4)

事業名	項 目 土地利用区分	作物名	作付面積 (ha)	単位面積当たり労働投下量 (hr/10a)				備 考	
				区 分	現 況	計 画	増 減		
区画整理	水田	水稻	0.6 0.7	人 力	〃 45.5	13.1 23.5	△ 32.4 △ 22.0	〃 → 大区画乾田 (No. 1-1) 小区画湿田 → 大区画乾田 (No. 1-2)	
				機械力	〃 36.1	9.5 18.6	△ 26.6 △ 17.5		
			3.3	人 力	〃 45.5	5.1 23.5	△ 40.4 △ 22.0	小区画湿田 → 大区画乾田 (No. 1-3)	
				機械力	〃 36.1	5.4 18.6	△ 30.7 △ 17.5		
			6.0 10.2	人 力	〃 34.3	5.1 6.5	△ 29.2 △ 27.8	小区画湿田 → 大区画乾田 (No. 1-3) 小区画湿田 → 大区画乾田 (No. 4)	
				機械力	〃 29.9	5.4 8.4	△ 24.5 △ 21.5		
		そば	4.2 5.2	人 力	〃 3.3	〃 1.5	〃 △ 1.8	〃 → 〃 小区画湿田 → 大区画乾田	
				機械力	〃 4.4	〃 3.1	〃 △ 1.3		
		たまねぎ	0.5	人 力	56.1	54.2	△ 1.9	小区画湿田 → 大区画乾田	
				機械力	48.0	46.1	△ 1.9		
		はとむぎ	4.1	人 力	11.6	10.5	△ 1.1	小区画湿田 → 大区画乾田	
				機械力	31.0	28.7	△ 2.3		
		計			18.7 16.1				
		合計			18.7 16.1				

上段:変更後
下段:変更前

6. 級地別土地利用区分

該当なし

(第9表-5)

土地利用区分	区分 級地名	農 用 地 造 成 (ha)					干 拓 (ha)					合 計
		一級地	二級地	三級地	四級地	計	一級地	二級地	三級地	四級地	計	
農 地	田											
	輪換耕地											
	畑											
	(普通畑)											
	(牧草地)											
	樹園地											
	(果樹園)											
	(桑園)											
その他												
計												

7. 土地配分計画

該当なし

(第9表-6)

項目 区分		配分戸数 (戸)	地 目 別 配 分 計 画 (ha)							備 考	
			田	輪換耕地	畑						計
					普通畑	牧草地	樹園地				
増 反		()	()	()	()	()	()	()	()		
入 植		()	()	()	()	()	()	()	()		

第3節 用水計画

1. 計画基準年

昭和42年(県営かんがい排水事業 豊沢川地区に準拠)
平成6年(かんがい期有効雨量、かんがい期総干天日数、かんがい期連続干天日数とも1/10確率年に近い年)

2. 計画かんがい方式


水田(水稻) 湛水かんがい方式

	5月1日～9月10日	133日間
かんがい期間	4月26日～9月11日	138日間
	(代掻き期間 5月1日～5月10日	10日間)
	(代掻き期間 4月26日～5月10日	15日間)

3. 計画用水系統


次頁参照

変更後



大沢地区 計画用水系統図

変更前

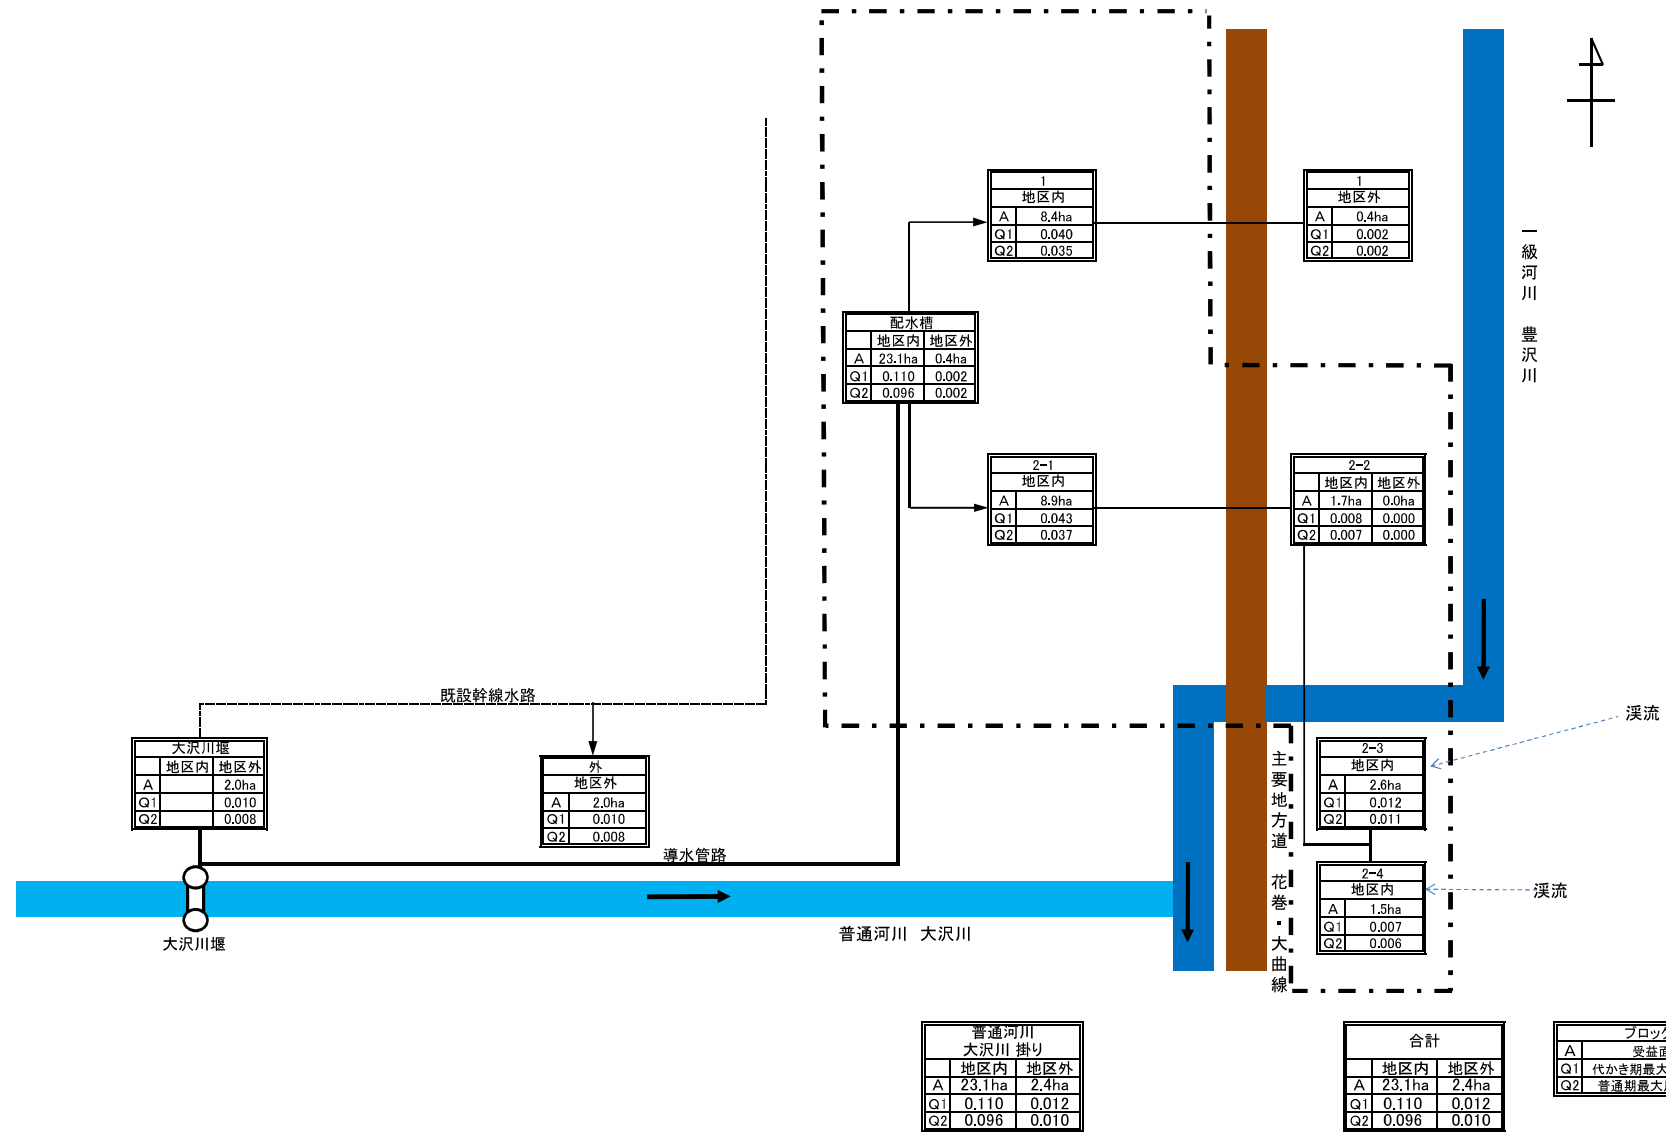

上段:変更後
下段:変更前

4. 計画用水量

(1) かんがい用水

(第10表-1-1)

項目 系統名	種別	面積 (ha)			水田かんがい			水田畑利用			畑地かんがい			その他		消費水量 (m3/s)	損失率 (%)	粗用水量		備考
		事業名			普通期 計単位 平均量 (mm/日)	代かき期 計単位 代用かき量 (mm)	面積 積 (ha)	一平均 日当たり 計水深 (mm/日)	平均 間断日数 (日)	面積 積 (ha)	一平均 日当たり 計水深 (mm/日)	平均 間断日数 (日)	面積 積 (ha)	量平均 計単位 用水 (mm/日)	面積 積 (ha)			平均 (m3/s)	最大 (m3/s)	
		区画 整理	地区 外	計																
普通 大沢川	農業用水	16.7 23.1	1.4 2.4	18.1 25.5	13 32	110 152	18.1 25.5									0.044 0.110	10	0.031 0.106	0.049 0.122	
溪流水	農業用水	3.2		3.2	13	110	3.2									0.008	10	0.005	0.009	
計		19.9 23.1	1.4 2.4	21.3 25.5			21.3 25.5									0.052 0.110		0.036 0.106	0.058 0.122	

上段:変更後
下段:変更前

(2) 営農飲雑用水

//
該当なし

(第10表-1-2)

区分	利用目的	対象面積（ha）			日当たり給水量		補給回数 （回）	関係戸数 （戸）	備考
		事業名			単位給水量	最大給水量			
				計	（ℓ/日）	（ℓ/日）			

上段:変更後
下段:変更前

5. 水源計画

(1) 水利用計画

有効雨量 水田(水稻) : 5mm/日～80mm/日の80%

(畑利用) : ー

TRAM 水田(畑利用) : ーmm

間断日数 水田(畑利用) : ー日

かんがい効率 水田(水稻) : 90%

水田(畑利用) : ー%

(第10表ー2)

項 目 区 分		消費水量	有効雨量	純用水量	粗用水量	現況利用可能水量		不足水量		水源依存量		水源工種	備 考
		a	b	c=a-b	d=c/(1-α)	水源名	取水地点 利用可能量	ほ場利用 可 能 量	純不足 水 量	全不足 水 量	水源名	水 量	損失率: α
		(千m ³)	(千m ³)	(千m ³)	(千m ³)		e (千m ³)	f (千m ³)	g=c-f (千m ³)	h=d-e (千m ³)		(千m ³)	
区画整理	区画整理	335 1,157		335 1,157	372 1,285	〃 普通河川大沢川	372 1,285	335 1,157					0.10 地区外含む
		55		55	61		61	55					
	計	390 1,212		390 1,212	433 1,346		433 1,346	390 1,212					

上段:変更後
下段:変更前

(エ) 用 水 路

(第 10 表 - 6)

項 目 名 称	かんがい面積 (ha)			最大通水量 (m ³ /s)	延 長 (m)	構 造	備 考
	事 業 名						
	区画整理	(地区外)	計				
用水路工	19.9	1.4	21.3	0.036	5,868	VU100～VU250	
	23.1	2.4	25.5	0.122	6,863	VU75～VU300、VP75～VP200	
計	19.9 23.1	1.4 2.4	21.3 25.5		5,868 6,863		

(オ) その他の水源施設 //

 該当なし

(3) 水質水温 //

 該当なし

第4節 排水計画

1. 計画基準雨量

(岩手県農林水産部農村計画課 計画樹立参考資料 平成26年3月版 豊沢地域雨量観測所)

	//	//
最大 2 4 時間雨量	172.8 mm (1/10年)	113.7 mm (1/2年)
	//	//
最大 4 時間雨量	88.2 mm (1/10年)	57.1 mm (1/2年)
	//	//
最大 1 時間雨量	32.2 mm (1/10年)	22.1 mm (1/2年)


2. 計画排水方式

//
自然流下排水

3. 計画排水系統

次頁参照


大沢地区計画排水系統図

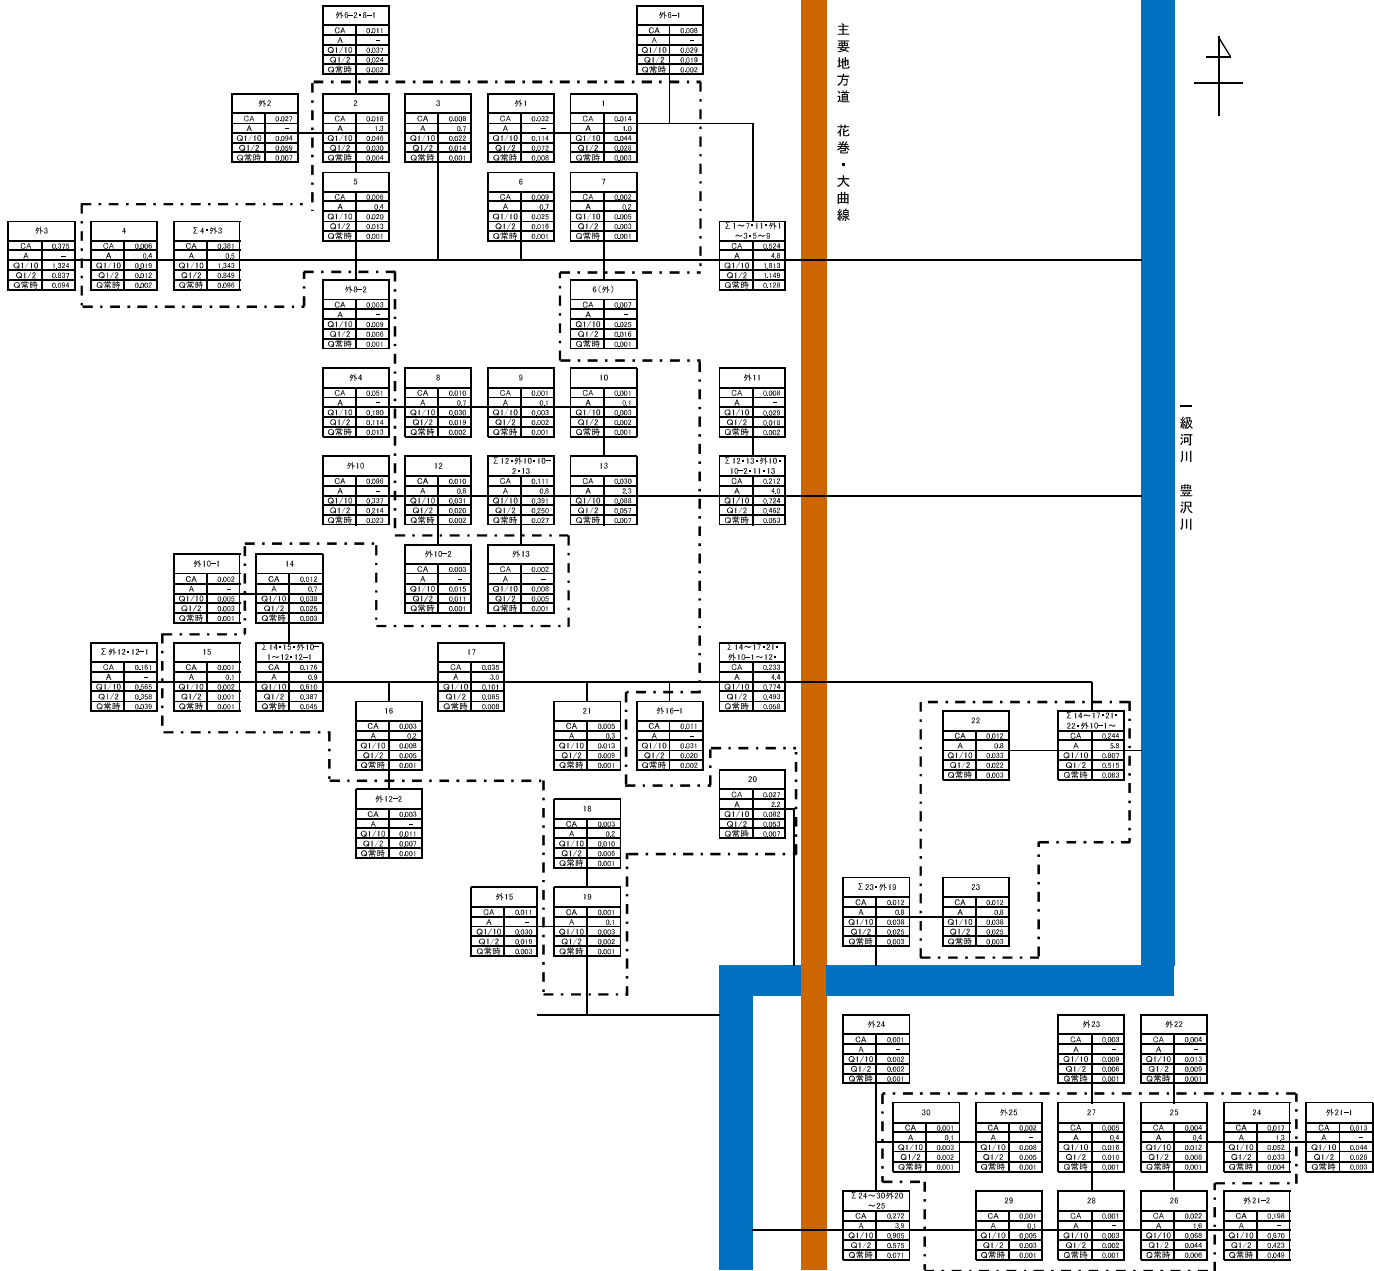

变更后

地区内		地区外		凡 例	
CA	0.275	CA	1.032	CA	流域面積 (km ²)
A	21.0	A	-	A	受益面積 (ha)
Q1/10	0.823	Q1/10	3.589	Q1/10	10年確率排水量 (m ³ /s)
Q1/2	0.531	Q1/2	2.275	Q1/2	2年確率排水量 (m ³ /s)
常時	0.070	常時	0.257	常時	常時排水量 (m ³ /s)

大沢地区計画排水系統図

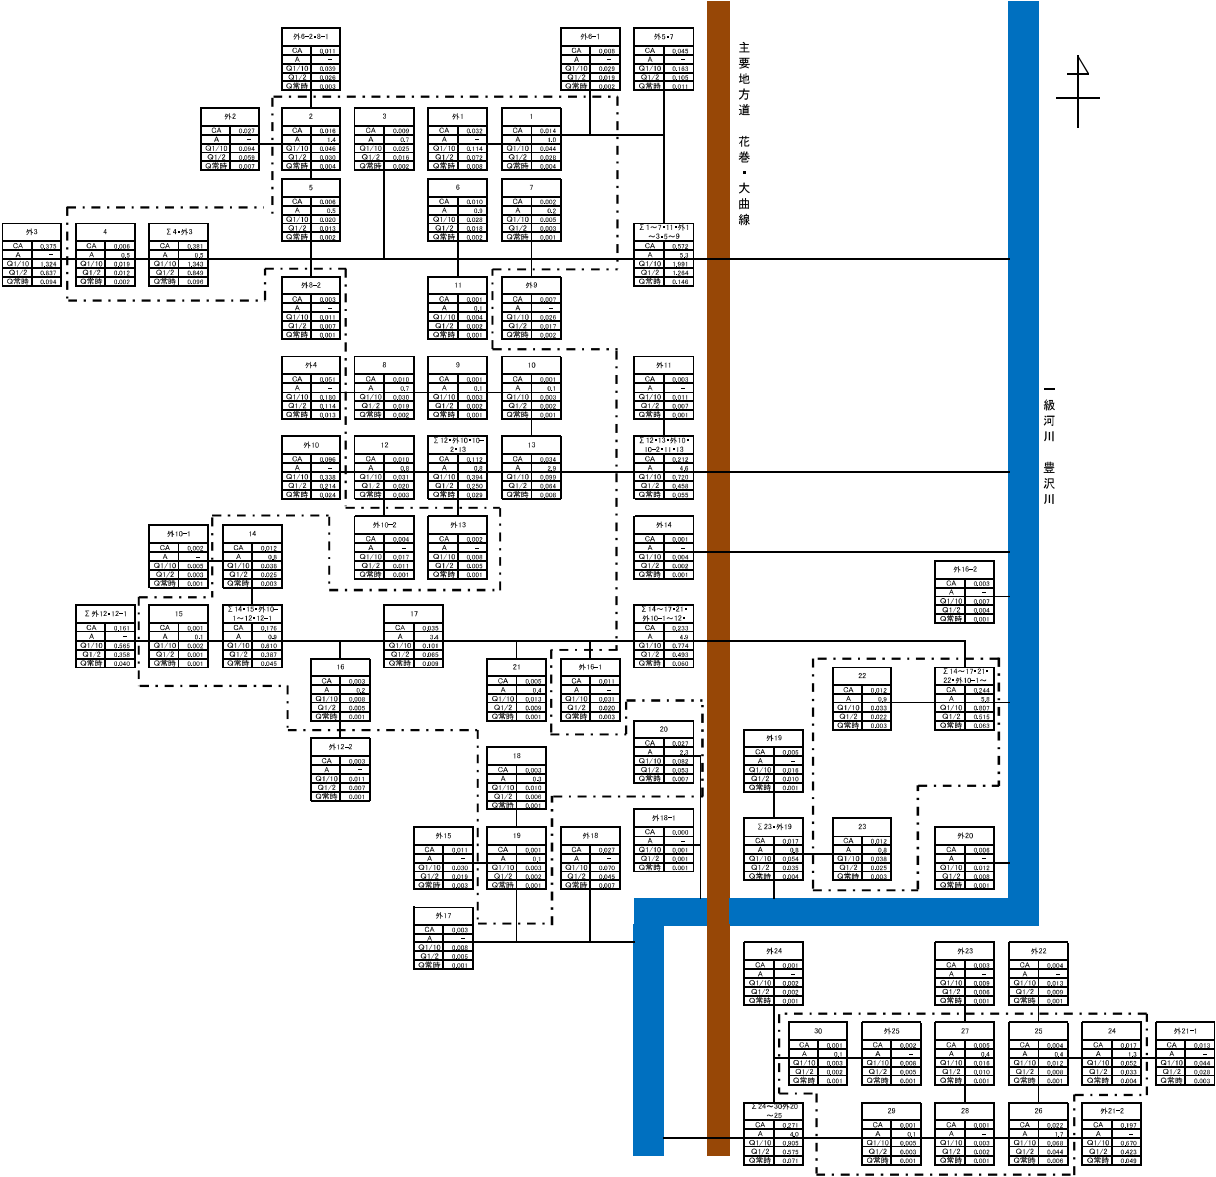

変更前

凡 例		
地区内	地区外	流域番号
CA 0.284	CA 1.117	CA 流域面積 (km ²)
A 2.51	A -	A 受益面積 (ha)
Q1/10 0.844	Q1/10 3.86	Q1/10 10年確率排水量 (m ³ /s)
Q1/2 0.544	Q1/2 2.448	Q1/2 2年確率排水量 (m ³ /s)
常時 0.078	常時 0.285	常時 常時排水量 (m ³ /s)

上段:変更後
下段:変更前

4. 計画排水量

(第11表-1)

項目 排水 系統名	受益面積 (ha)			流域面積 (km ²)		基準 雨量 (mm)	降雨による 直接単位流出量 (m ³ /s/km ²)		基底流出量 (m ³ /s/km ²)		全排水量 (m ³ /s)			単位排水量 (m ³ /s/km ²)		備 考
	事 業 名			山地	平地		山地	平地	山地	平地	山地	平 地		山地	平地	
	区画整理		計									自然排水	機械排水			
豊沢川	21.0 23.1		21.0 23.1	0.938 0.959	0.369 0.441	〃 88.2mm/4hr	〃 1/10確率 3.405～ 3.536	〃 1.838～ 3.981		〃 0.25	3.289 3.364	1.123 1.339	〃 －	〃 1/10確率 3.405～ 3.536	〃 1.838～ 3.981	
計	21.0 23.1		21.0 23.1	0.938 0.959	0.369 0.441						3.289 3.364	1.123 1.339	〃 －			

上段:変更後
下段:変更前

5. 排水対策

〃
(1) 排水水門 該当なし

(第11表-2)

項目 名称	流域面積 (km ²)	受 益 面 積(ha)			計 画		排 水 本 川			備 考
		事 業 名			排水量 (m ³ /s)	地区内たん 水深 (m)	名 称	計画洪水量 (m ³ /s)	計画洪水位 (m)	
				計						

〃
(2) 排水機 該当なし

(第11表-3)

項目 名称	流域面積 (km ²)	受 益 面 積(ha)			計 画		排 水 機				備 考
		事 業 名			排水量 (m ³ /s)	地区内たん 水深 (m)	実 揚 程 (m)	排 水 量 (m ³ /s)	台 数 (台)	全排水量 (m3/s)	
				計							

上段:変更後
下段:変更前

(3) 排水路

(第11表-4)

項 目 名 称	流域面積 (km ²)	受 益 面 積 (ha)			計画排水量 (m ³ /s)	延 長 (m)	構 造	排 水 本 川			備 考
		事 業 名						名 称	計画洪水量 (m ³ /s)	計画洪水位 (m)	
		区画整理		計							
小排水路	1.307 1.400	21.0 23.1		21.0 23.1	4.412 4.703	4,954 4,756	〃 排水ﾌﾘｭｰﾑ	〃 豊沢川	〃 —	〃 —	
計	1.307 1.400	21.0 23.1		21.0 23.1	4.412 4.703	4,954 4,756					

(4) その他

〃
該当なし

6. 湛水検討

〃
該当なし

第5節 道路計画

1. 道路及び索道

(1) 道路

(第12表-1)


路線名	項目 幅(有効)×延長 (m) (m)	構造	既設道路との関係	備考
支線道路(A)	5.0(4.0)×2,957 5.0(4.0)×1,012	敷砂利工 (t=0.10m)	県道・市道取付あり	
支線道路(B)	4.0(3.0)×719 4.0(3.0)×1,601	敷砂利工 (t=0.10m)	県道・市道取付あり	
支線道路(C)	5.0~4.0(4.0~3.0)×539	敷砂利工 (t=0.10m)	県道・市道取付あり	腹付け拡幅
支線道路(D)	3.0(2.0)×136			
計	3,812 3,152			


(2) 索道

該当なし

2. 路線配置図

別紙のとおり

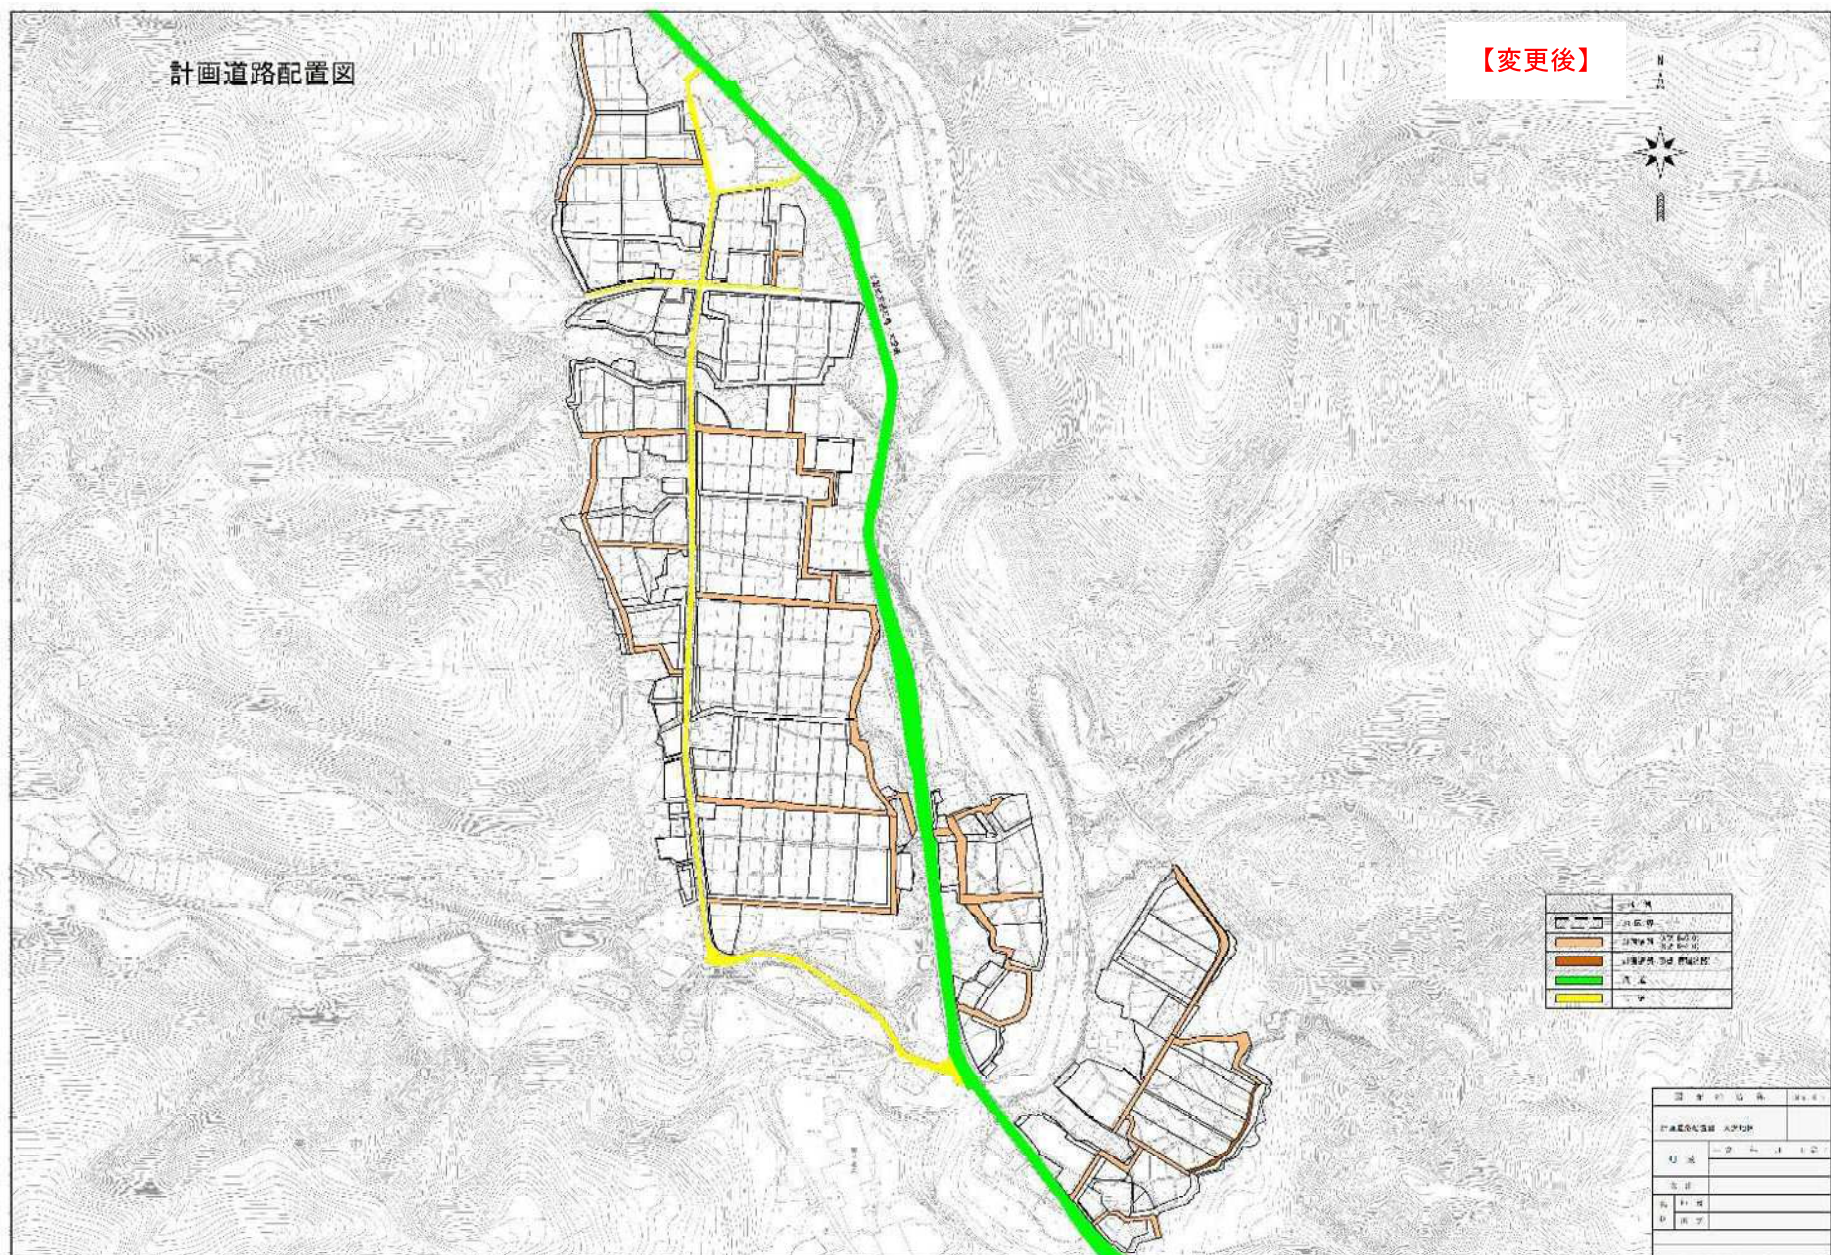

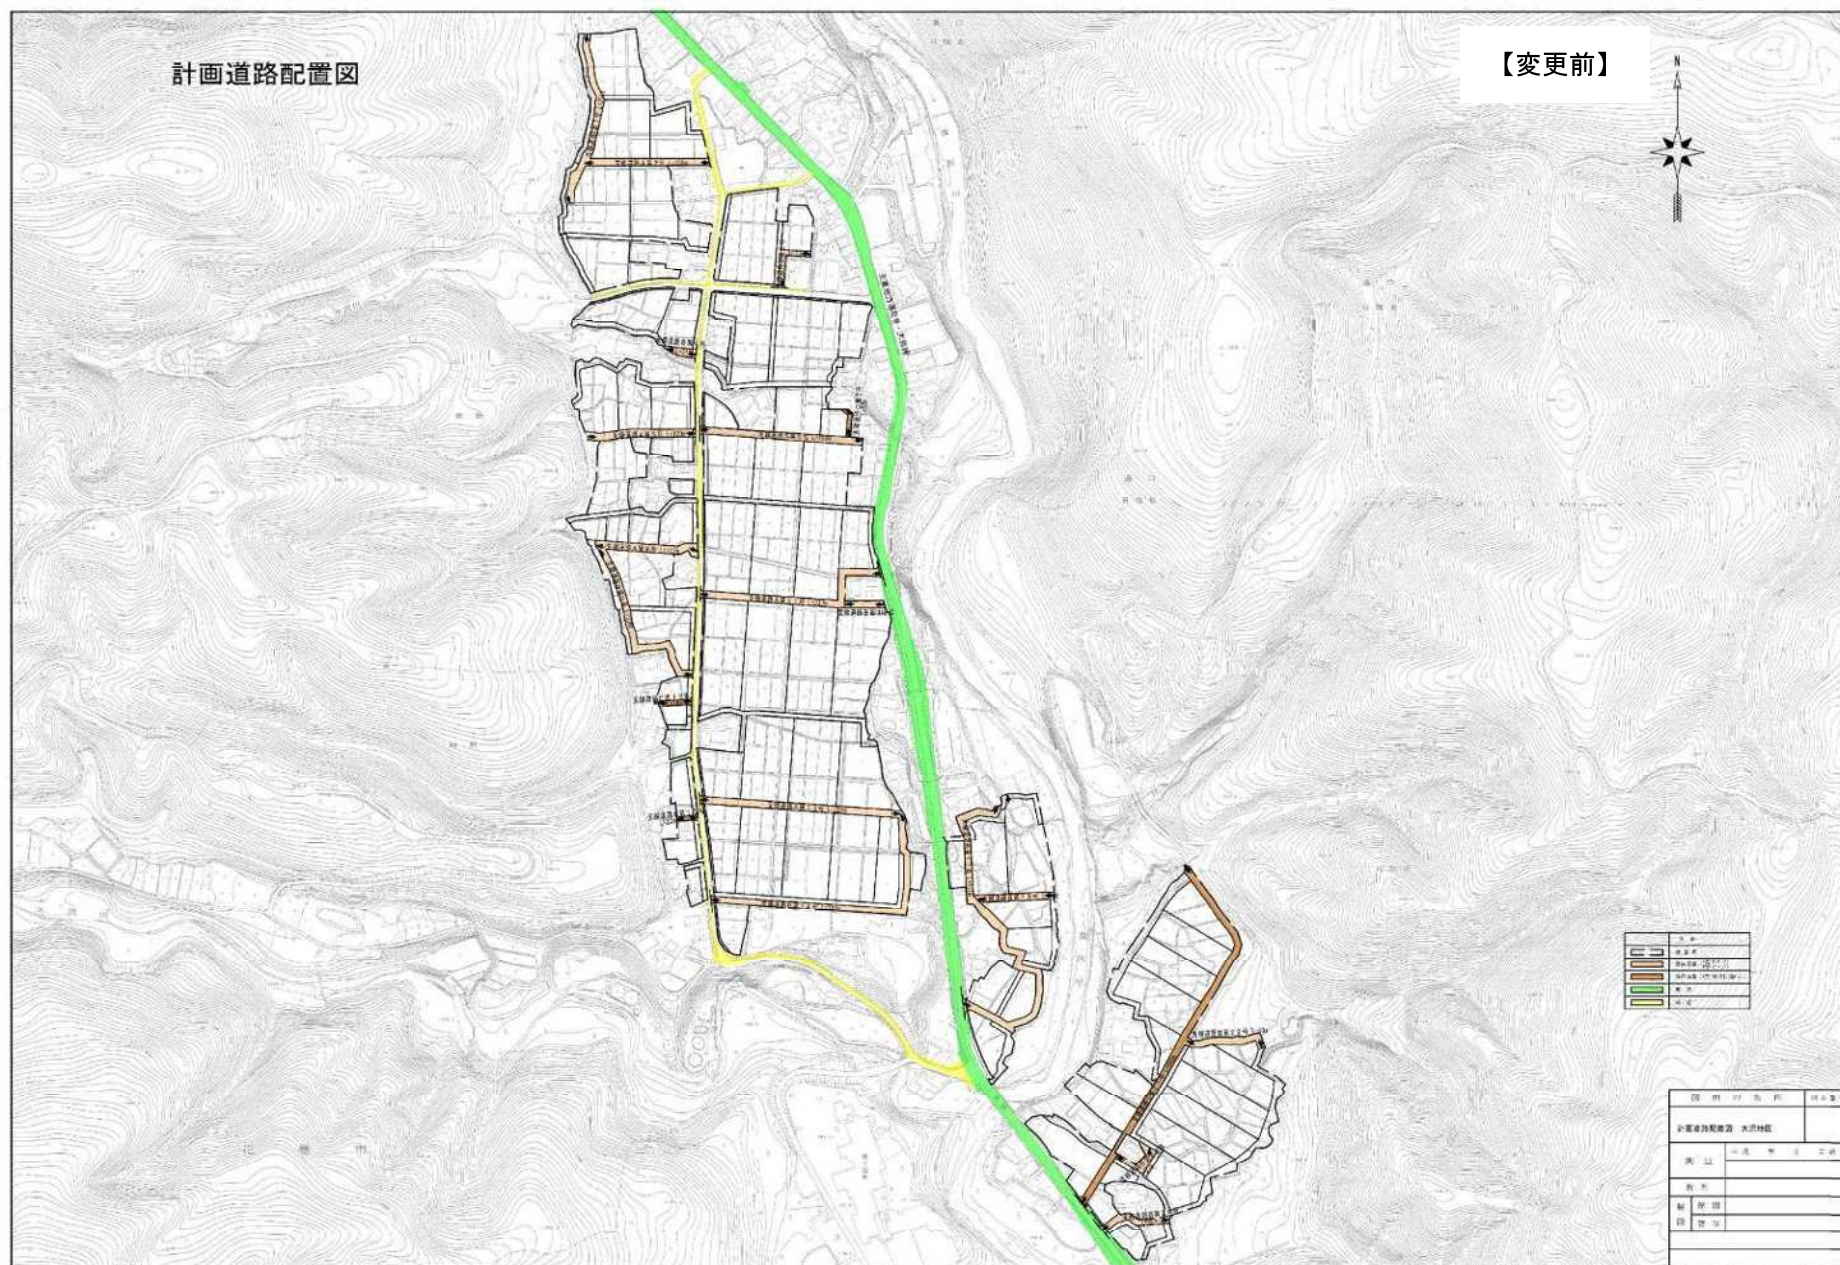

上段:変更後
下段:変更前

第6節 農用地造成計画

1. 農用地造成計画

(1) 農地造成計画

〃

該当なし

(第13表-1)

項目 地区名	主要作物	自然傾斜	耕地の形態	標準区画の形状	備 考

〃

(2) 末端道排水路配置計画

該当なし

2. 土壌改良

〃

該当なし

(第13表-2)

項目 区分	面 積 (ha)	土 壌 統 (区) 名	P H		置 換 酸 度 (Y ₁)	り ん 酸 吸 収 係 数 (mg/100g)	ha当たり所要量 (t/ha)			備 考
			H ₂ O	KG1			石炭	りん酸質資材	有機質資材	

上段:変更後
下段:変更前

第7節 洪水調節計画

1. 計画基準雨量 該当なし

2. 計画洪水量及び調節量 //

該当なし

(第14表-1)

地 点	流域面積 (km ²)	洪水到達時間 (hr)	計画洪水量 (m ³ /s)	安全洪水量 (m ³ /s)	必要調節量 (m ³ /s)	ピーク時 調 節 量 (m ³ /s)	調 節 後 最大流量 (m ³ /s)	調節前後の 最大流量の差 (m ³ /s)	最大調節量 (m ³ /s)

3. 貯水池 //

該当なし

(第14表-2)

項目 貯水地名	流域面積 (km ²)		計画洪水量 (m ³ /s)	貯水量 (千m ³)			計画調節流量 (m ³ /s)	可能調節流量 (m ³ /s)	備 考
	直接	間接		有効	洪水調節容量	他目的			

4. 洪水調節検討

- (1) 河川改修計画との関係 該当なし
- (2) 洪水調節が下流に及ぼす影響 該当なし
- (3) 計画基準雨量以外についての検討 該当なし

5. 管理計画

- (1) 管理機構 該当なし
- (2) ダム管理操作上の各種基準 該当なし
- (3) 洪水調節要領 該当なし

第8節 干拓計画

該当なし

(第15表)

項目 名称	延長 (m)	計画高潮(水)位 (I P m)	風向及び対岸距離 (km)	風 速 (m/s)	気 圧 (mb)	備 考

第9節 農用地整備計画

1. 区画整理

(1) 区画の形状

(第16表-1)

長辺×短辺 (m)	区画面積 (ha)	全体面積 (ha)	割合 (%)	田面差 (m)	備考
100 × 50	// 0.5	4.6 7.2	22 31	// 0.8	
100 × 30	// 0.3	7.2 9.2	35 40	// 0.4	
80 × 25	// 0.2	3.6 3.3	17 14	// 0.8	
その他	// —	4.5 3.4	21 15		
畑	—	1.1	5		
計		21.0 23.1			

(2) 表土扱い


(第16表-2)

面積 (ha)	表土扱い要否の理由	扱い深 (cm)	土量 (m3)	備考
21.0 23.1	地力の保持	// 15~20	32,050 34,650	

(3) 末端道水路配置図

別紙のとおり

末端道水路標準図

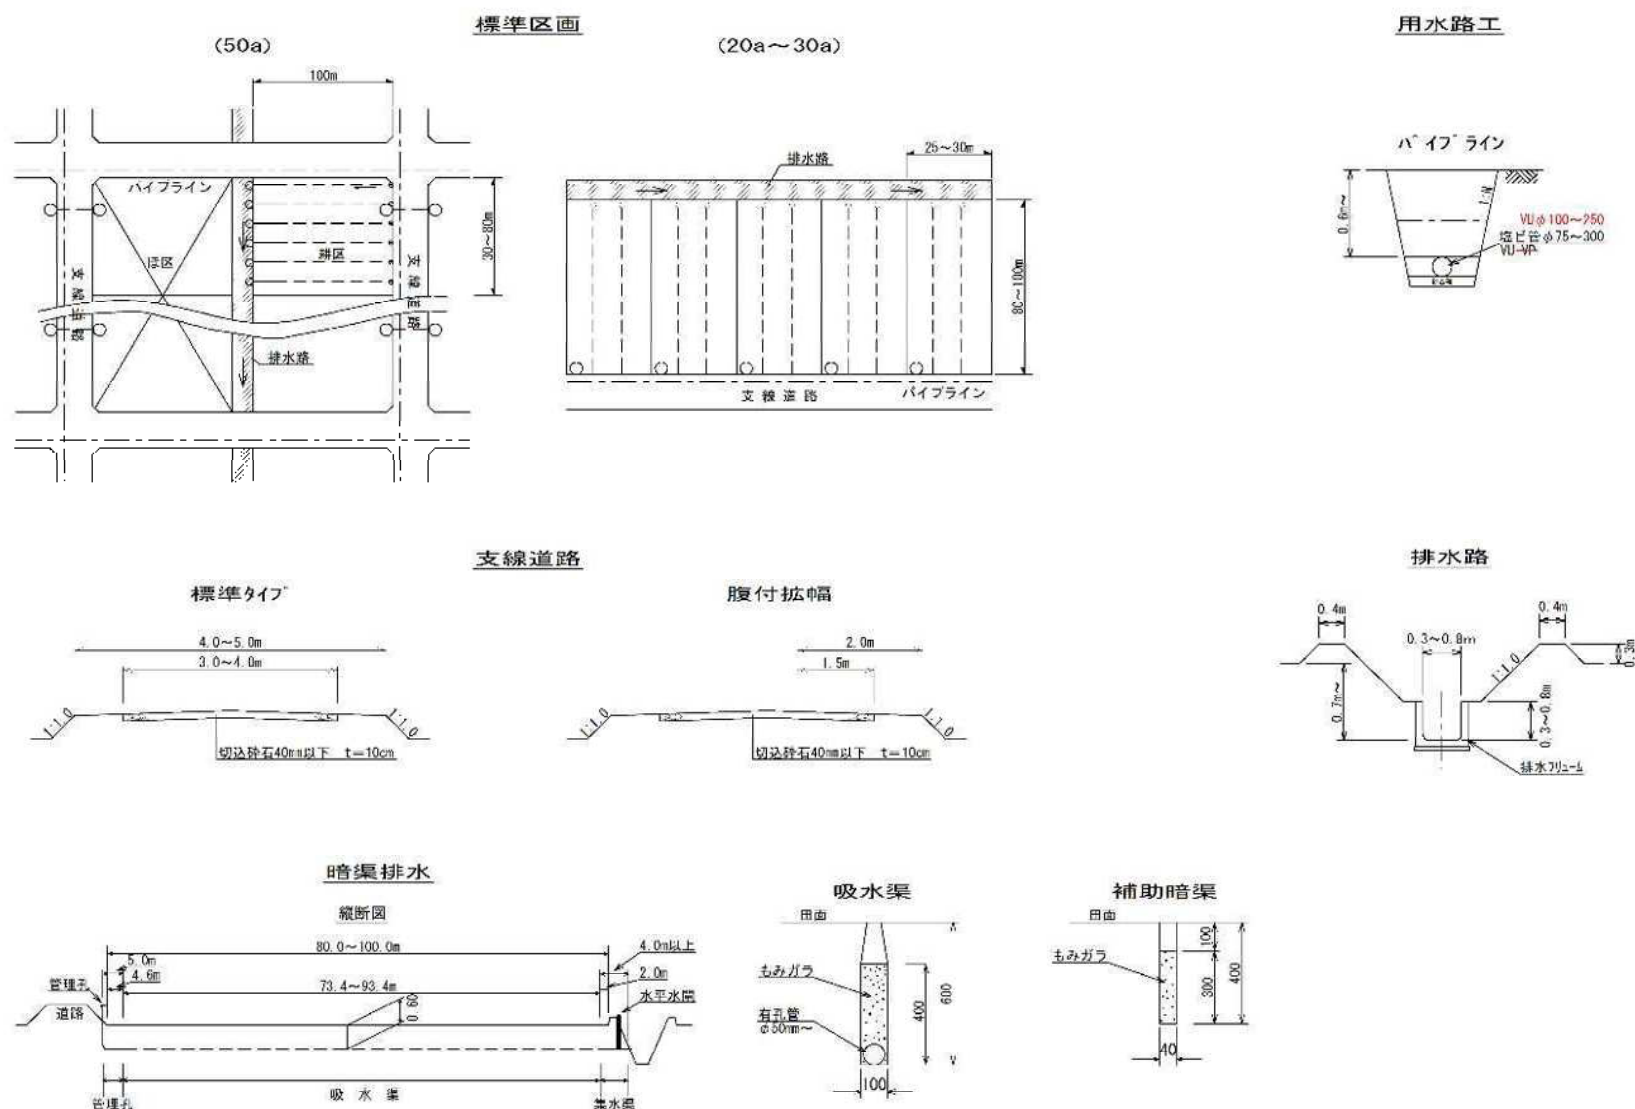

上段:変更後
下段:変更前

3. 客土 該当なし

(第16表-4)

項目 区分	面 積 (ha)			土 壤 統 (区) 名	減水深(mm/日)		作土の厚さ(cm)		10a当 たり 客 土 量 (m³)	土 壤 の 性 質		備 考
	事 業 名				現 況 平 均	計 画 平 均	現況平均	計画平均		受 益 地 (%)	採 土 地 (客土材 料) (%)	
			計									
計												

4. 農地保全 該当なし

(第16表-5-1)

項目 区分	最大風速 (m/ s)	幅 (m)	間 隔 (m)	備 考

(2) 排水工 該当なし

(第16表-5-2)

項目 区分	基準雨量 (mm/日)	土性	流出率	排水量		備 考
				単位排水量 (m³/s/ha)	全排水量 (m³/s)	

上段:変更後
下段:変更前

(3) 侵食（崩壊）防止工

〃
該当なし

(第16表-5-3)

区分 \ 項目	位 置	支配面積 (ha)	機 能	備 考
計				

第 1 0 節 老朽ため池改修計画

- 〃
1. 洪水吐改修計画 該当なし
- 〃
- (1) 計画基準雨量 該当なし
- 〃
- (2) 計画洪水量 該当なし
- 〃
2. 堤体補強計画 該当なし
- 〃
3. 取水施設改修計画 該当なし

第 5 章 主 要 工 事 計 画

第 1 節 用水施設

1. 貯水池 該当なし

(第 1 7 表-1)

名 称				位 置						備 考
堤 体	形 式	流域面積(km²)		堤 高 (m)	堤 長 (m)	堤 体 質 (千m³)	基盤地盤地質	貯 水 量 (千m³)		
		直 接	間 接					総 貯 水 量	有効貯水量	
洪 水 吐	形 式	排 水 量 (m³/s)	備 考	取水施設	形 式	取水量 (m³/s)	放流施設	形 式	放 流 量 (m³/s)	

上段:変更後
下段:変更前

//
2. 頭首工 該当なし

(第17表-2)

名 称				位 置	普通河川 大沢川			備 考
形 式	堤 高 (m)	堤 長 (m)			取 水 位 (m)	取 水 量 (m³/s)	付帯施設	
		固定部	可動部	計				

//
3. 揚水機 該当なし

(第17表-3)

項目 名称	位 置	揚 水 量 (m³/s)	揚 程 (m)		揚 水 機			原 動 機			備 考
			実揚程 (m)	全揚程 (m)	形 式	口 径 (mm)	台 数 (台)	形 式	動 力	台 数 (台)	

上段:変更後
下段:変更前

4. 用 水 路

(第17表-4)

項 目 水路名	かんがい面積 (ha)			通水量 (m ³ /s)	延 長 (m)			構 造	勾 配	主要構造物	備 考
	事 業 名				開渠	トンネル その他	計				
	区画整理	地区外	計								
用水路工	19.9 23.1	1.4 2.4	21.3 25.5	0.058 0.122		5,868 6,863	5,868 6,863	VU100～VU250 VU75～300、VP75～200		〃 取水工	
計	19.9 23.1	1.4 2.4	21.3 25.5	0.058 0.122		5,868 6,863	5,868 6,863				

5. その他かんがい施設 〃

該当なし

(第17表-5)

項 目 水路名	構 造	規 模	数 量	備 考

上段:変更後
下段:変更前

第2節 排水施設

1. 排水水門

//
該当なし

(第18表-1)

項目 名称	位置	形式	構造	内水位 (m)	外水位 (m)	排水量 (m³/s)	備考
計							

2. 排水機

//
該当なし

(第18表-2)

項目 名称	位置	排水量 (m³/s)	揚程		排水機			原動機			備考
			実揚程 (m)	全揚程 (m)	形式	口径 (m)	台数 (台)	形式	動力	台数 (台)	
計											

上段:変更後
下段:変更前

3. 排 水 路

(第18表-3)

項 目 水路名	受 益 面 積 (ha)			排水量 (m ³ /s)	延 長 (km)			構 造	勾 配	主要構造物	備 考
	事 業 名				開水路	トンネル その他	計				
	区画整理		計								
排水路工	21.0 23.1		21.0 23.1	// 0.004～1.606	4.317 4.369	0.637 0.387	4.954 4.756	// HF300×300 ～800×800	// 1/130～ 1/400	// 水槽工 横断暗渠工	
計	// 23.1		// 23.1		4.317 4.369	0.637 0.387	4.954 4.756				

4. その他排水施設 //
該当なし

上段:変更後
下段:変更前

第3節 道路及び索道

1. 道 路

(1) 道路の総括表

(第19表-1)

項 目 区 分	路 線 名	幅 (有効) × 延長 (m) (km)	構 造	付 帯 構 造 物			最 急 勾 配 (%)	同左の 延 長 (m)	最小曲線 半 径 (m)	備考
				名 称	構 造	数 量 (箇所)				
支線道路(A)	—	5.0(4.0)×2.957 5.0(4.0)×1.012	// 砂利道	—	—	—	—	—	—	
支線道路(B)	—	4.0(3.0)×0.719 4.0(3.0)×1.601	// 砂利道	—	—	—	—	—	—	
支線道路(C)	—	— 5.0~4.0(4.0~3.0)×0.539	— 砂利道	—	—	—	—	—	—	
支線道路(D)	—	3.0(2.0)×0.136	—	—	—	—	—	—	—	
計		3.812 3.152								

(2) 道路主要構造物

//
該当なし

2. 索 道

//
該当なし

第4節 農用地造成

1. 農用地造成工
〃
該当なし

(1) 抜 根
〃
該当なし

(第20表-1)

項目 区分	樹 種	樹 径 (cm)	ha当たり本数 (本/ha)	面 積 (ha)	工 法	備 考
計						

(2) 除 礫
〃
該当なし

(第20表-2)

項目 区分	対象土層の厚さ (cm)	ha当たり標準除去礫 (m³/ha)	面 積 (ha)	工 法	備 考
計					

上段:変更後
下段:変更前

(3) 開墾作業

〃
該当なし

(第20表-3)

（第26表-5）

項目		面 積 (ha)	工 法	備 考
区分	造成方法			
地 目				
計				

(4) 地目変換 省略

(第20表-4)

(5) 末端用水路 省略

(第20表-5)

(6) 末端排水路 省略

(第20表-6)

2. 土壌改良

〃
該当なし

(第20表-7)

項目	面積 (ha)	面積 (ha)	面積 (ha)	面積 (ha)	備 考
区分					
計					

上段:変更後
下段:変更前

第5節 洪水調節施設

1. 貯水池 該当なし
2. 頭首工及び導水路 該当なし
- (1) 頭首工 該当なし

(第21表-2)

名 称			位 置		(第 2 表 2)			備 考
			堤 長 (m)			計画洪水位 (m)	付帯施設	
形 式	集水面積 (km ²)	堤 高 (m)	固定部	可動部	計			

- (2) 導水路 該当なし

(第21表-3)

水 路 項目	通 水 量 (m ³ /s)	延 長 (m)			構 造	勾 配	備 考
		総延長	トンネル	その他			

第6節 干拓施設

1. 堤防 該当なし

(第22表-1)

名 称	面 積 (ha)	埋立標高 (m)	埋立土量 (m)	施工方法	備 考

2. 潮止め 該当なし

(第22表-2)

名 称	工 法	幅 見 (m)	敷高標高 (m)	潮止め堤標高 (m)	最大流速 (m/s)	床固め構造	備 考

3. 附属施設 該当なし

4. 埋立 該当なし

(第22表-3)

名 称	面 積 (ha)	埋立標高 (m)	埋立土量 (m)	施工方法 (m)	備 考

上段:変更後
下段:変更前

第7節 農用地整備施設

1. 区画整理

(1) 区画整理

(第23表-1)

工 区 名	面 積 (ha)	整 地 工		表 土 扱 い		備 考
		標 準 区 画	土 量 (m ³)	面 積 (ha)	土 量 (m ³)	
大沢	4.6	〃	〃	4.6	6,900	
	7.2	100 × 50	—	7.2	10,800	
	7.2	〃	〃	7.2	10,800	
	9.2	100 × 30	—	9.2	13,800	
	3.6	〃	〃	3.6	5,400	
	3.3	80 × 25	—	3.3	4,950	
	4.5	〃	〃	4.5	6,750	
	3.4	その他	—	3.4	5,100	
計	1.1	畑		1.1	2,200	
	21.0			21.0	32,050	
	23.1			23.1	34,650	

(2) 末端用水路等

〃
該当なし

(第23表-2)

項目 区分	数 量	規 模	構 造	備 考
計				

(3) 末端排水路等

〃
該当なし

(第23表-3)

項目 区分	数 量	規 模	構 造	備 考
計				

上段:変更後
下段:変更前

2. 暗渠排水

(1)暗渠排水

(第23表-4-1)

項目 区分	面 積 (ha)			集 水 渠				吸 水 渠						集水渠出口以下の排水施設			備 考
	事 業 名			勾配	管種	管径 (mm)	延長 (m/ha)	勾配	管種	管径 (mm)	深さ (m)	間隔 (m)	延長 (m/ha)	名称	構造	数量 (m/ha)	
	区画整理		計														
自動埋設型暗渠工	19.2 23.1		19.2 23.1	// レベル	// ポリ管	// φ50~65	// 841	// 水頭差	// ポリ管	// φ50~60	// 0.6	// 0.6	// 1,040	// 小排水路	// HF	// 126	
計																	

(2)心土破碎 該当なし

(第23表-4-2)

項目 区分	対象土層の厚さ (cm)	ha当たり標準 除礫量(m ³ /ha)	面 積 (ha)	工 法	備 考
計					

3. 客 土

該当なし

(第23表-5)

項目 区分	面 積 (ha)			客入土量 (m ³)	土取場土量 (m ³)	運搬距離 (km)	運搬方法	備 考
	事 業 名							
			計					
計								

4. 除 礫

該当なし

(第23表-6)

項目 区分	対象土層の厚さ (cm)	ha当たり標準 除礫量(m ³ /ha)	面 積 (ha)	工 法	備 考
計					

上段:変更後
下段:変更前

4. 農地保全 //

該当なし

(1) 防災林 //

該当なし

(第23表-4)

区分 \ 項目	幅 (m)	延長 (m)	面積 (ha)	樹種	植栽本数 (本)	備考
計						

(2) 排水路 //

該当なし

(第23表-5)

区分 \ 項目	延長 (m)	流量 (m)	構造	備考
計				

(3) 侵食防止工 //

該当なし

(第23表-6)

名称 \ 項目	構造	数量	備考
計			

第8節 老朽ため池改修施設

//

1. 貯水池 該当なし

(第24表)

名 称					位 置			
堤 体	形 式	流 域 (km ²)	堤 高 (m)	堤 長 (m)	堤体積 (m ³)	堤頂幅 (m)	貯水量 (千m ³)	備 考
洪水吐	形 式	洪水量 (m ³ /s)	規 模 (m)	備 考	取水施設	形 式	取水量 (m ³ /s)	備 考

2. 堤体補強施設 // 該当なし

(1) のり面保護施設 // 該当なし

(2) 漏水防止工 // 該当なし

第6章 付 帯 工 事 計 画

//
該当なし

第7章 工事の着手及び完了の予定時期

着 手	平成	// 29	年度
完 了	令和 令和	7 6	年度

第8章 環境との調和への配慮

//
本地区は田園環境整備マスタープランにおいて「環境配慮区域」とされており、地域で生育・生息が確認されている動植物の生息環境への負荷の低減に努め、現況保全すること等により、環境の改変を最小限にするよう努めることとしている。

//
環境との調和への配慮として、整備区域内の法面等に生育する希少種の植物は近傍の類似環境へ移植する。また、移植が難しい希少種が生育する区域は現況保存とするなど、生態系に配慮した計画とする。

第9章 換地計画の概要

第1節 換地計画を作成する上での基本的な考え方

〃

本地区の農地は、一部昭和30年代に整備されているものの、区画形状は5aと小区画であるとともに、農道が狭小であり、農業用機械の通行に支障をきたしている。

また、地区内の幹線水路は、急峻な山腹に建設されており浚渫等の維持管理に多大な労力を要し、末端水路は用排兼用の土水路が主であり、断面が狭小で深さも浅いため、十分な排水機能が果たせず、農業機械の作業効率低下を来すとともに、乾田化による高収益作物の導入が困難な状況にある。

このような状況を解消し、効率的な営農を展開するため、ほ場整備を行うとともに、担い手への利用権設定など利用集積の促進を図り、生産性の高い農業を実現できるよう換地計画を樹立する必要がある。

第2節 換地区の設定

1. 換地区の名称、所在、面積

(第25表-1)

換地区名	換地区の所在	面積 (ha)
〃 大沢	〃 岩手県花巻市湯口地内	27.5 28.7
計		27.5 28.7

2. 換地区を設定する理由

〃

営農形態のまとまりが形成されている区域を1つの換地工区として設定する。

第3節 換地計画樹立の基本方針

1. 従前の土地の地積の基準

(第25表-2)

換地区名	地 積 の 基 準
大 沢	// 換地交付の基準とする従前の土地の地積は、国土調査法に基づく地積調査が実施されていることから、土地改良事業計画決定の日の登記簿地積とする。 但し、上記の日から2ヶ月以内に測量士等資格者が測量した実測図に隣接所有者の承諾書を添付して申し出があった場合は、その申出地積とする。

上段:変更後
下段:変更前

2. 用途別予定地積

(単位: ha) (第25表-3)

換地区名	用途 (取得 予定者) 前 後	非農用地区域外に換地する土地												非農用地区域に換地する土地										機能交換に係る土地				一般 国 公 有 地	総 合 計	
		田	畑	山林・ 原野	その他	通常事業施工地域に 含める土地（令第 1条の（ ）書き			計	本事業によって生ず る土地改良施設用地			創 設 農 用 地	合 計	特定用途用地			異 種 目 換 地	創設非農用地					合 計	国	県	市 町 村 他			合 計
						土地 改良 施設	そ の 他	小 計		改良 区	そ の 他	小 計			宅 地	そ の 他	計		農 業 経 営 理 化 施 用 地	生 活 上 必 要 な 施 用 地	公 共 用 施 用 地	宅 地 等	計							
大沢	従前の土地	24.0	1.1	〃	0.2	〃	〃	〃	25.8	〃	〃	〃	〃	25.8	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	27.5
		25.3	0.8	0.5	0.1	-	-	-	26.7	-	-	-	-	26.7	-	-	-	-	〃	〃	〃	〃	〃	-	-	0.0	2.0	2.0	-	28.7
	換地	19.9	1.1	〃	0.6	〃	〃	〃	21.6	0.4	〃	0.4	〃	22.0	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	-	5.5	5.5	〃	27.5	
		23.1	-	-	-	-	-	23.1	0.2	-	0.2	-	23.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	5.4	5.4	-	28.7	
	従前の土地																		〃	〃	〃	〃	〃							
	換地																		〃	〃	〃	〃	〃							
	従前の土地																		〃	〃	〃	〃	〃							
	換地																		〃	〃	〃	〃	〃							
	従前の土地																		〃	〃	〃	〃	〃							
	換地																		〃	〃	〃	〃	〃							
	従前の土地																		〃	〃	〃	〃	〃							
	換地																		〃	〃	〃	〃	〃							
合計	従前の土地	24.0	1.1	〃	0.2	〃	〃	〃	25.8	〃	〃	〃	〃	25.8	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	-	1.7	1.7	〃	27.5
		25.3	0.8	0.5	0.1	-	-	-	26.7	-	-	-	-	26.7	-	-	-	-	〃	〃	〃	〃	〃	-	-	0.0	2.0	2.0	-	28.7
	換地	24.0	1.1	〃	0.6	〃	〃	〃	21.6	0.4	〃	0.4	〃	22.0	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	-	5.5	5.5	〃	27.5	
		23.1	-	-	-	-	-	23.1	0.2	-	0.2	-	23.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	5.4	5.4	-	28.7	

上段:変更後
下段:変更前

3. 農用地集団化の方針

(第25表-4)

区分 換地区名	地帯別、グループ別団地の設定	個人別換地の方法		
		位置の選択方法	1戸当たり目標団地数	区画畦畔の取扱い
大 沢	// 集落別集団化、営農別集団化を図る	// 各人の従前の土地が最も密集した位置を基本とするが、育成すべき経営体の経営農用地を中心として農用地集積が図れるように配慮する。	// 1～2団地	// 固定畦畔

4. 非農用地換地の方法 該当なし

(第25表-5)

区分 地区名	用 途	非農用地区域の位置の概略	面 積(m ²)	換地の手法	換地取得予定者	そ の 他

第4節 土地の評価及び清算の方法

1. 評価の方法

項目別配点方式

〃

従前の土地と換地をそれぞれ個別に、かつ、1筆毎に、各評価項目について採点し、項目別に得られた採点結果を積み上げてその土地の点数とし、点数に対応する等位をつける。

2. 清算の方法

比例地積清算方式

〃

事業による利益（増価額）を従前の土地の地積に比例して配分する方法

第5節 換地計画樹立の年度計画

(第25表-6)

区 分 換地区名	一時利用地の 指 定 予 定 年 度	換 地 計 画 の 決 定 予 定 年 度	換 地 処 分 予 定 年 度	備 考
大 沢	令和2～4年度 令和2～3年度	令和6年度 令和5年度	令和7年度 令和6年度	〃 令和5年度 確定測量 令和4年度

第6節 換地処分の時期に関する特則

〃

本地区については、換地区全部について区画整理が完了し、確定測量が行われたときは、土地改良法第89条の2第10項により準用する同法第54条第2項本文の規定ただし書きに基づき、換地処分を行うことができる。

上段:変更後
下段:変更前

第10章 事業費の総額及び内訳

単位:千円

事業区分	事業費		資金計画			
			国費	県費	市町村費	受益者負担
区画整理	純工事費	648,000 534,000	356,400 293,700 (55%)	194,400 160,200 (30%)	64,800 53,400 (10%)	32,400 26,700 (5%)
	測量試験費	74,000 80,000	40,700 44,000 (55%)	22,200 24,000 (30%)	7,400 8,000 (10%)	3,700 4,000 (5%)
	用地買収補償費	24,000 30,000	13,200 16,500 (55%)	7,200 9,000 (30%)	2,400 3,000 (10%)	1,200 1,500 (5%)
	換地費	52,000 36,000	28,600 19,800 (55%)	15,600 10,800 (30%)	5,200 3,600 (10%)	2,600 1,800 (5%)
	工事雑費					
	計	798,000 680,000	438,900 374,000	239,400 204,000	79,800 68,000	39,900 34,000
	事務費					
	総事業費	798,000 680,000	438,900 374,000	239,400 204,000	79,800 68,000	39,900 34,000

第11章 効 用

単位:千円

事業区分	項目 区分	年総効果(便益)額	年増加農業所得額	備考
区画整理	作物生産効果	4,627 5,159	1,521 1,793	
	営農経費節減効果	39,530 30,132	40,952 32,021	
	維持管理費節減効果	△ 288 △ 21	552 800	
	耕作放棄防止効果	〃 -		
	国産農作物安定供給効果	1,957 1,194		
	計	45,826 36,464	43,025 34,614	総費用総便益比 〃 1.08

上段:変更後
下段:変更前

第12章 関 連 す る 事 業

//
該当なし

(第28表)

区 分	事 業 名	事 業 主 体	受 益 面 積 (ha)	事 業 内 容

第13章 現況・計画図面

- | | |
|------------|-----------|
| 1. 位置図 | 〃
別途添付 |
| 2. 現況計画平面図 | 〃
別途添付 |
| 3. 土地利用計画図 | 〃
別途添付 |
| 4. 主要構造図 | 〃
別途添付 |

農業競争力強化基盤整備事業


(農地整備事業【経営体育成型】)

大沢地区 計画一般図

S=1/25,000

【変更後】

県内位置図

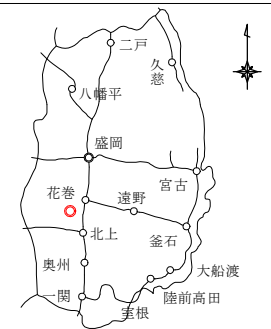

受益面積A=21.0ha

凡 例	
	受益
	県道

農業競争力強化基盤整備事業


(農地整備事業【経営体育成型】)

大沢地区 計画一般図

S=1/25,000

【変更前】


県内位置図

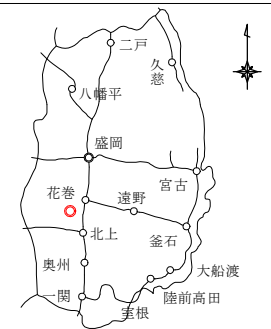

受益面積A=23.1ha

凡 例	
	受益
	県道



農業競争力強化基盤整備事業
(農地整備事業【経営体育成型】)
現況計画平面図 大沢地区【変更後】
S=1/2,500

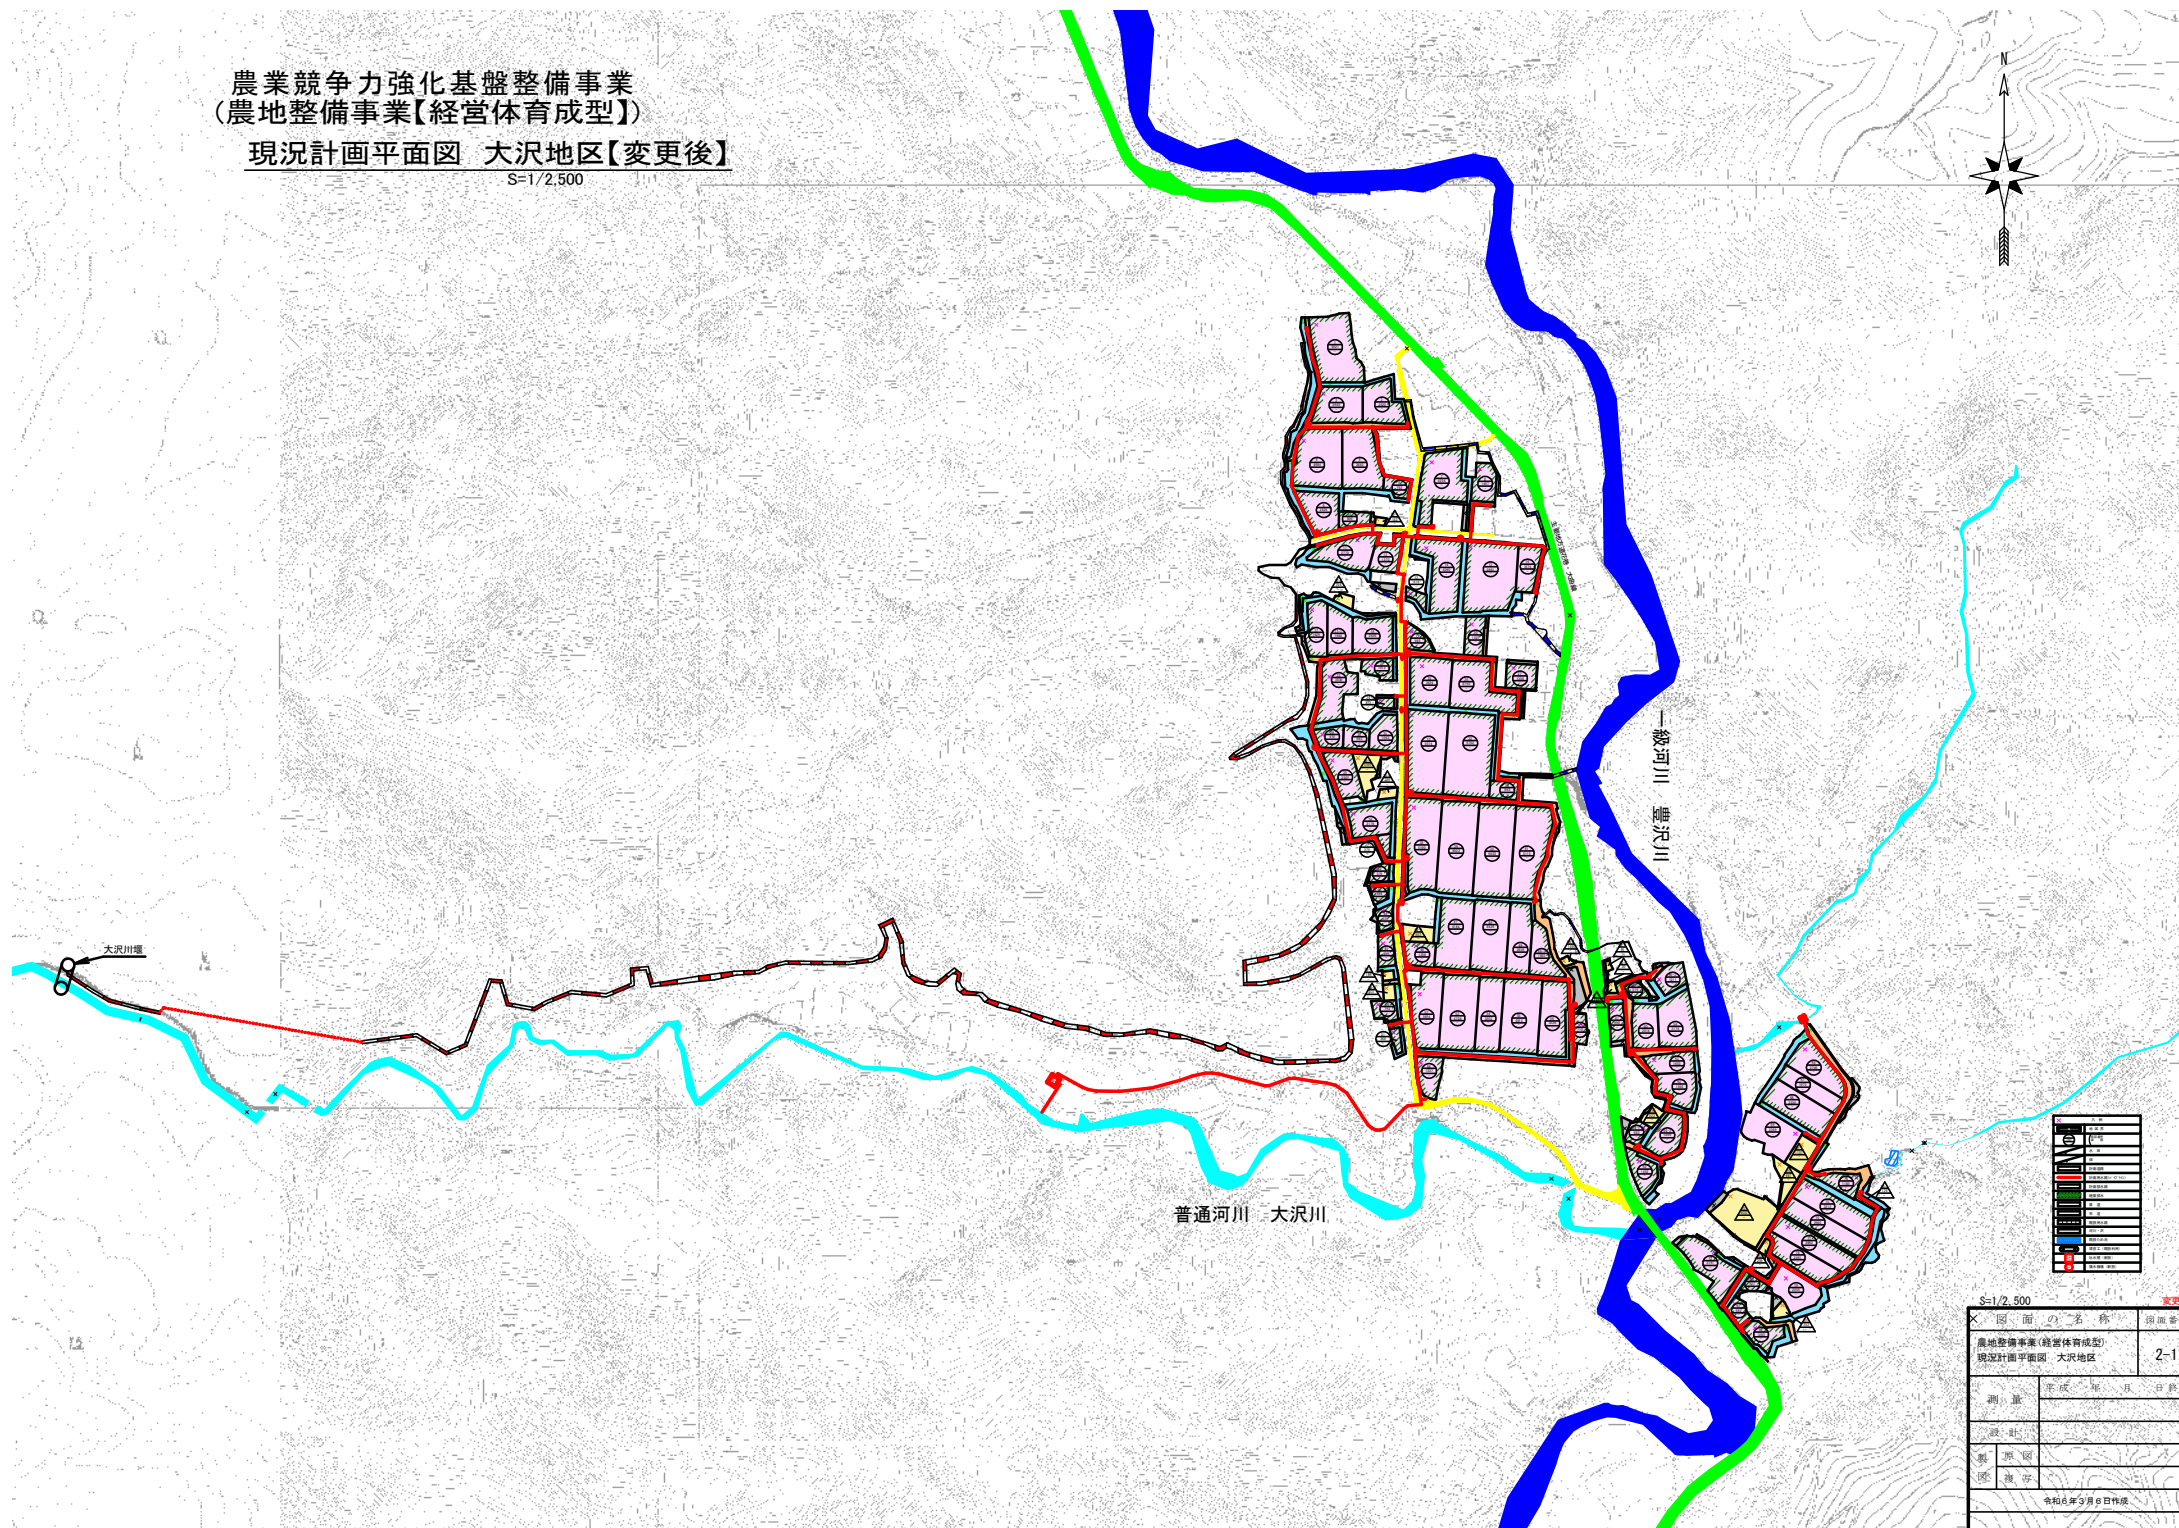

①	河川
②	河川
③	河川
④	河川
⑤	河川
⑥	河川
⑦	河川
⑧	河川
⑨	河川
⑩	河川
⑪	河川
⑫	河川
⑬	河川
⑭	河川
⑮	河川
⑯	河川
⑰	河川
⑱	河川
⑲	河川
⑳	河川
㉑	河川
㉒	河川
㉓	河川
㉔	河川
㉕	河川
㉖	河川
㉗	河川
㉘	河川
㉙	河川
㉚	河川
㉛	河川
㉜	河川
㉝	河川
㉞	河川
㉟	河川
㊱	河川
㊲	河川
㊳	河川
㊴	河川
㊵	河川
㊶	河川
㊷	河川
㊸	河川
㊹	河川
㊺	河川
㊻	河川
㊼	河川
㊽	河川
㊾	河川
㊿	河川

S=1/2,500		変更後
X	図 面 の 名 称	図面番
	農地整備事業(経営体育成型) 現況計画平面図 大沢地区	2-1
測 量	平成 年 月 日 終	
図 紙		
製 図 者		
認 可	令和 年 月 日 作成	

農業競争力強化基盤整備事業
(農地整備事業【経営体育成型】)
現況計画平面図 大沢地区 【変更前】
S=1/2,500

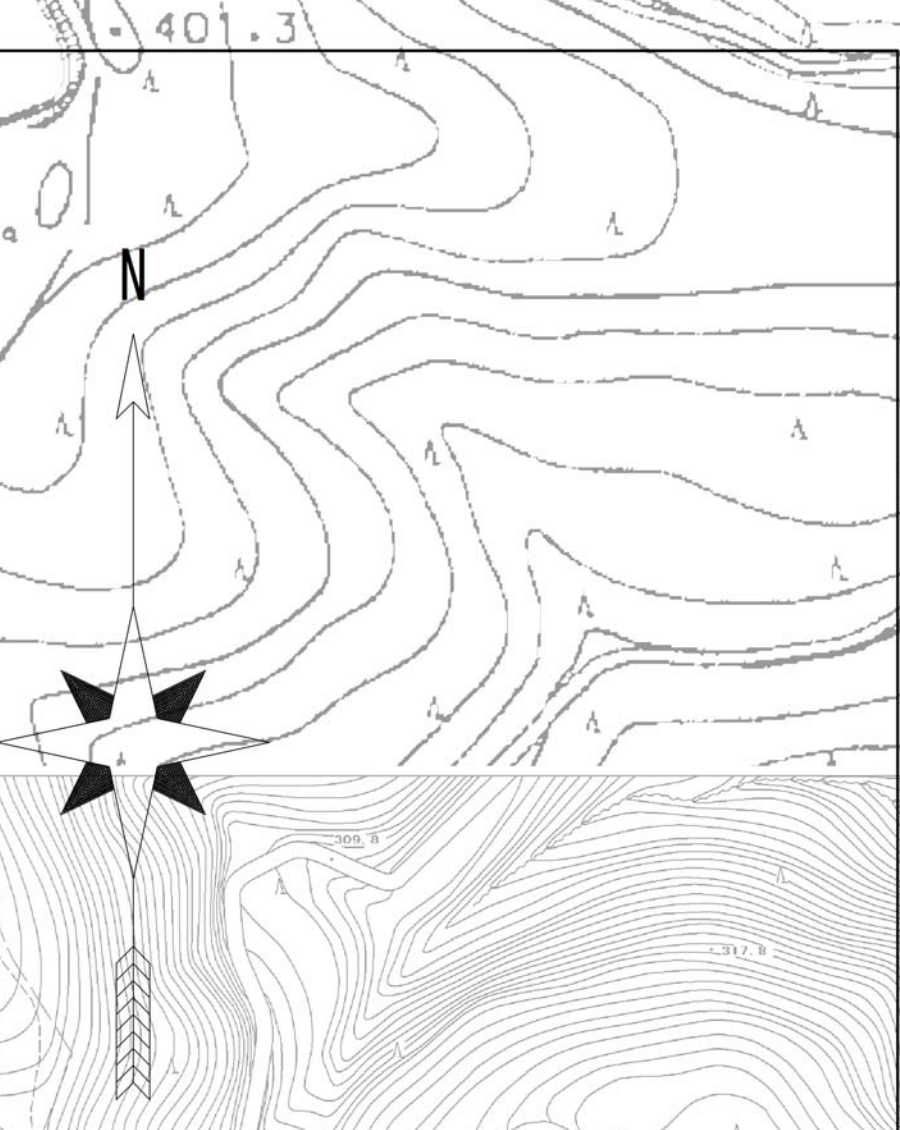


北	東
西	南
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

S=1/2,500	
図面の名称	図面番号
農地整備事業(経営体育成型) 現況計画平面図 大沢地区【変更前】	2-1
測量	平成 年 月 日 終了
設計	
製図	原図
図複写	
平成28年11月18日	


大沢地区標準図

変更後
変更前


標準区画

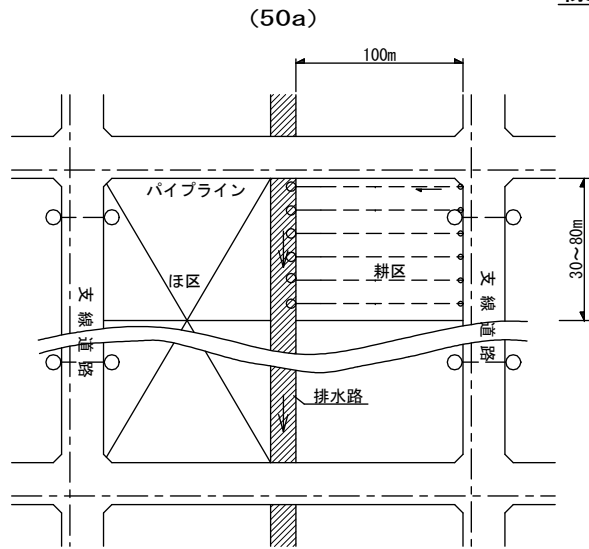

(20a~30a)

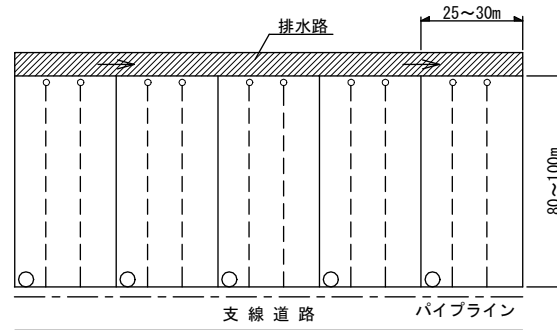


用水路工




支線道路


標準タイプ



腹付拡幅




排水路




暗渠排水

縦断面



吸水渠



補助暗渠

