

中山間地域総合整備事業〔集落型事業（生産基盤型事業）〕

市^{いち}野^の々^の地 区

土 地 改 良 事 業（変 更） 計 画 書

（ 農 業 用 用 排 水 施 設 整 備 ）

県	名	岩	手	県
地 区	名	市	野	々
所 在	地	一	関	市
事 業 主 体		岩	手	県

土 地 改 良 事 業 計 画 書

目 次

第1章	目 的	1	第2節	営農計画及び土地利用計画	25
第2章	地域及び地積	2	1.	営農計画の概要	25
第1節	地域	2	2.	土地利用区分	25
第2節	地積	2	3.	作付方式	26
第3章	現況	3	4.	生産計画	27
第1節	気象及び海象	3	5.	労働改善計画	28
	1. 一般気象	3	6.	級地別土地利用区分	該当なし
	2. 特殊気象	4	7.	土地配分計画	該当なし
	3. 海象	該当なし	第3節	用水計画	29
第2節	土地状況	5	1.	計画基準年	29
	1. 地形、土壌及び浸食の程度	5	2.	計画かんがい方式	29
	2. 土地分類	該当なし	3.	計画用水系統図	29
	3. 土地利用の状況	7	4.	計画用水量	31
	4. 土地所有の状況	8	5.	水源計画	32
第3節	水利状況	9	第4節	排水計画	35
	1. 用水状況	9	1.	計画基準雨量	35
	2. 排水状況	13	2.	計画排水方式	35
	3. 河川状況	該当なし	3.	計画排水系統図	35
第4節	道路概況	16	4.	計画排水量	37
	1. 道路概況	16	5.	排水対策	38
	2. 主要道路一覧表	17	6.	湛水検討	該当なし
第5節	地域農業の概況	19	第5節	道路計画	39
	1. 産業別就業人口	19	1.	道路及び索道	該当なし
	2. 経営耕地広狭別農家数及び耕地の分散状況並びに専兼業別農家数	20	2.	路線配置図	該当なし
	3. 動力農機具及び主要家畜頭数	21	第6節	農用地造成計画	該当なし
	4. 主要作物作付状況	22	1.	農用地造成計画	該当なし
	5. 農業の動向	23	2.	土壌改良	該当なし
第6節	地域環境の概況	23	第7節	洪水調節計画	該当なし
第4章	一般計画	24	1.	計画基準雨量	該当なし
第1節	事業計画の要旨	24	2.	計画洪水量及び調節量	該当なし
	1. 要旨	24	3.	貯水池	該当なし
	2. 事業別面積	24	4.	洪水調節検討	該当なし
			5.	管理計画	該当なし

第8節	干拓計画	-----	該当なし
第9節	農用地整備計画	-----	42
	1. 区画整理	-----	該当なし
	2. 暗渠排水	-----	該当なし
	3. 客土	-----	該当なし
	4. 農地保全	-----	該当なし
第10節	老朽ため池改修計画	-----	該当なし
	1. 洪水吐改修計画	-----	該当なし
	2. 堤体補強計画	-----	該当なし
	3. 取水施設改修計画	-----	該当なし
第5章	主要工事計画	-----	45
第1節	用水施設	-----	45
	1. 貯水池	-----	該当なし
	2. 頭首工	-----	該当なし
	3. 揚水機	-----	該当なし
	4. 用水路	-----	46
	5. その他かんがい施設	-----	該当なし
第2節	排水施設	-----	47
	1. 排水水門	-----	該当なし
	2. 排水機	-----	該当なし
	3. 排水路	-----	47
	4. その他排水施設	-----	該当なし
第3節	道路及び索道	-----	48
	1. 道路	-----	該当なし
	2. 索道	-----	該当なし
第4節	農用地造成	-----	該当なし
	1. 農用地造成	-----	該当なし
	2. 土壌改良	-----	該当なし
第5節	洪水調節施設	-----	該当なし
	1. 貯水池	-----	該当なし
	2. 頭首工及び導水路	-----	該当なし
第6節	干拓施設	-----	該当なし
	1. 堤防	-----	該当なし
	2. 潮止め	-----	該当なし
	3. 付属施設	-----	該当なし
	4. 埋立	-----	該当なし

第7節	農用地整備施設	-----	50
	1. 区画整理	-----	該当なし
	2. 暗渠排水	-----	該当なし
	3. 客土	-----	該当なし
	4. 除礫	-----	該当なし
	5. 農地保全	-----	該当なし
第8節	老朽ため池改修施設	-----	該当なし
	1. 貯水池	-----	該当なし
	2. 堤体補強施設	-----	該当なし
第6章	附帯工事計画	-----	該当なし
第7章	工事の着手及び完了の予定時期	-----	51
第8章	環境との調和への配慮	-----	51
第9章	換地計画の概要	-----	52
第1節	換地計画を作成する上での基本的な考え方	-----	52
第2節	換地区の設定	-----	52
	1. 換地区の名称、所在、面積	-----	該当なし
	2. 換地区を設定する理由	-----	該当なし
第3節	換地計画樹立の基本方針	-----	53
	1. 従前の土地の地積の基準	-----	該当なし
	2. 用途別予定地積	-----	該当なし
	3. 農用地集団化の方針	-----	該当なし
	4. 非農用地の換地方法	-----	該当なし
第4節	土地の評価及び清算の方法	-----	該当なし
	1. 評価の方法	-----	該当なし
	2. 清算の方法	-----	該当なし
第5節	換地計画樹立の年度計画	-----	該当なし
第6節	換地処分 of 時期の関する特則	-----	該当なし
第10章	事業費の総額及び内訳	-----	57
第11章	効用	-----	57
第12章	関連する事業	-----	58
第13章	現況・計画図面	-----	59
	1. 位置図	-----	59
	2. 現況計画平面図	-----	59
	3. 土地利用計画図	-----	59
	4. 主要構造図	-----	59

第1章 目 的

本計画地域は、岩手県の最南端の一関市中心部より西方10kmの一関市萩荘に位置し、地区の西側に連なる須川岳（栗駒山）をはじめとする奥羽山脈の裾野に広がる丘陵地帯である。地区内には、一級河川久保川、一級河川市野々川、一級河川栃倉川及びその他複数の河川が流れ、また、国道457号と県道本郷・五串線が走り、各河川沿いに形成された松原、市野々の集落からなる水田地帯である。

本地区は、団体営土地改良事業市野々地区及び団体営土地改良事業松原地区で整備し、30a区画となっている。

地区内の水路は、一部土水路であるが、大部分がコンクリートフリーム及びコンクリート柵渠で装工されているものの老朽化による劣化が著しく、用水路の目地からの漏水や排水路の柵渠の倒壊による土壌の浸食等が生じ、水管理の負担の増加、及び水路の補修・更新などの維持管理費の増加が地区の問題となっている。

以上の問題を解消するために、用排水路の更新整備を行い、水管理及び維持管理の負担を軽減し、営農意欲の向上と担い手の育成、確保につなげ、農業経営の安定化を図るものである。

第2章 地 域 及 び 地 積

第1節 地 域

(第1表)

事業名	地 域
// 用排水整備	// 岩手県一関市萩荘地内

第2節 地 積

(令和6年12月現在)

(令和3年3月現在) (第2表)

事業名	現況地目 市町村名	田 (ha)	畑 (ha)	原 野 (ha)	山 林 (ha)	その他 (ha)	計 (ha)	備 考
用排水整備	一関市	75.6 75.7					75.6 75.7	現況地区面積
	計	75.6 75.7					75.6 75.7	
	計							
合 計		75.6 75.7					75.6 75.7	

第3章 現 況

第1節 気象及び海象

1. 一般気象

(岩手県農林水産部農村計画課 計画樹立参考資料 令和 6年3月版)

(岩手県農林水産部農村計画課 計画樹立参考資料 平成31年3月版)

(第3表-1)

観測所名	一関気象観測所	かんがい期	非かんがい期	計又は平均	備 考
観測期間	H25年～ R 4年 H20年～ H29年	〃 5月～8月	〃 9月～4月		
平均気温(℃)		21.1 20.8	7.6 7.3	12.1 11.8	
降水量	平均(mm)	543.1 501.1	659.3 678.0	1,202.4 1,179.1	
	基準年(mm)	〃 —	〃 —	〃 —	
降水日数	平均(日)	44 42	70 75	114 117	
	基準年(日)	〃 —	〃 —	〃 —	
根雪期間		〃 月 日 ～ 月 日	〃 月 日	〃 日間	
無霜期間		〃 4月28日 ～ 10月31日	10月30日	186日間 187日間	
最多風向		〃 NNW	最大風速 (風 向)	〃 10.7 m/s 〃 (NNW)	最多風向発生時期 〃 9月～5月 最大風速発生年月日 〃 平成28年12月2日

上段: 変更後
下段: 変更前

2. 特殊気象

(計画樹立参考資料 令和 6年)

(計画樹立参考資料 平成31年) (第3表-2)

（計画調査参考資料）平成31年度（第3表）																
観 測 所 名	第 1 位			第 2 位			第 3 位			第 4 位			第 5 位			備 考
一関気象観測所																
観 測 期 間	数	年	発	数	年	発	数	年	発	数	年	発	数	年	発	
M34年～ R4年 M34年～H29年	量	月 日	生 確 率	量	月 日	生 確 率	量	月 日	生 確 率	量	月 日	生 確 率	量	月 日	生 確 率	
最 大 日 雨 量 (mm)	〃 285	〃 S22. 7. 22	〃 ・・・	〃 246	〃 S23. 9. 16	・・・ 1/845	〃 212	〃 M42. 8. 28	1/400 1/365	〃 153	〃 S61. 8. 5	1/42 1/41	〃 153	〃 S43. 8. 11	1/42 1/41	
最大時間雨量 (mm)	〃 49	〃 H6. 8. 19. 15	1/67 1/60	〃 45	〃 S48. 6. 20. 17	1/35 1/32	〃 43	〃 H2. 10. 26. 14	1/26 1/24	〃 41	〃 H17. 8. 14. 18	1/19 1/17	〃 40	〃 H3. 8. 31. 13	1/16 1/15	
最大 4 時間雨量 (mm)	〃 89	〃 S41. 9. 25. 8	1/35 1/34	〃 87	〃 H14. 7. 11. 8	1/30 1/29	〃 87	〃 S43. 8. 11. 24	1/30 1/29	〃 86	〃 S33. 8. 18. 14	1/28 1/27	〃 83	〃 H25. 7. 26. 18	〃 1/22	
最大連続雨量 (mm)	〃 318	〃 S22. 7. 22	・・・ 1/872	〃 236	〃 M43. 8. 15	1/99 1/89	〃 223	〃 H14. 7. 11	1/66 1/61	〃 212	〃 M42. 8. 28	1/47 1/44	〃 205	〃 S33. 7. 24	1/38 1/36	
最大連続旱天日数 (日)	〃 41	〃 S21. 7. 14	〃 ・・・	〃 40	〃 S48. 6. 24	〃 ・・・	〃 35	〃 S13. 7. 26	1/402 1/392	〃 32	〃 S2. 7. 31	1/96 1/94	〃 31	〃 S39. 7. 20	1/63 1/62	

3. 海 象 該当なし

上段: 変更後
下段: 変更前

第2節 土地状況

1. 地形、土壌及び浸食の程度

(第4表-1-1)

事業名	地 目	田						畑 ・ そ の 他								受益地標高 (m)		備考
	傾斜区分	1/1,000 以 下	1/1,000 ～ 1/100	1/100 ～ 1/20	1/20 ～ 1/11.5	1/11.5 以上	計	3° 以下	3° ～8°	8° ～15°			15° ～20°	20° 以上	計	最高	最低	
										8° ～10°	10° ～15°	8° ～15°						
用排水整備	面積(ha)			75.6 75.7			75.6 75.7									〃 150	〃 60	
	比率(%)			〃 100			〃 100											
	面積(ha)																	
	比率(%)																	
合計	面積(ha)			75.6 75.7			75.6 75.7											
	比率(%)			〃 100			〃 100											

上段:変更後
下段:変更前

〔水田土壌〕

(第4表－1－2)

土 壤 統 (区) 名	項 目	土 壤 統 (区) 区 分 一 覧 表									面 積 (ha)			備 考
		土 壤 断 面							堆 積 様 式	母 材	事 業 名			
		色	腐 植	礫 層	酸化沈殿物	土 性					泥 炭 層 黒 泥 層 及びグライ層	区画整理	計	
						表土	下層土							
						一層	二層	三層						
北寄木統 強グライ土壌 強粘土還元型	青灰 青灰	なし	なし	あり 0～30cm	Lic	LiC	-	なし なし あり	水積	非固結火成岩 非固結堆積岩	64.4 64.5		64.4 64.5	D-30
狐禅寺統 黄褐色土壌 強粘土型	黄褐 黄褐	なし	なし	あり	Lic	LiC	-	なし なし なし	水積	非固結堆積岩	11.2		11.2	I-81
計											75.6 75.7		75.6 75.7	

上段:変更後
下段:変更前

2. 土地分類 該当なし

3. 土地利用の状況

(令和6年12月現在)
(令和2年3月現在) (第4表-3)

事業名	土地利用別 市町村名	耕 地						山 林		採草放牧地 (ha)	原 野 (ha)	そ の 他 (ha)	計 (ha)	備 考
		水田 (ha)	普通畑 (ha)	牧草畑 (ha)	果樹園 (ha)	茶園 (ha)	その他の地 (ha)	用材林 (ha)	薪炭林 (ha)					
用排水整備	一関市	75.6 75.7											75.6 75.7	
	計	75.6 75.7											75.6 75.7	
	計													
	計													
合 計		75.6 75.7											75.6 75.7	

上段:変更後
下段:変更前

4. 土地所有の状況

(令和6年12月現在)
(令和3年3月現在) (第4表-4)

事業名	所有別 区 分	個人有	市有	国有	その他			計	備 考
用排水整備	面 積(ha)	75.6 75.7						75.6 75.7	
	受益者数(人)	// 102						// 102	
	筆 数(筆)	// 471						// 471	
	権 利 関 係								
	備 考 (関係戸数)	// (102)						// (102)	
	面 積(ha)								
	受益者数(人)								
	筆 数(筆)								
	権 利 関 係								
	備 考 (関係戸数)								
合 計	面 積(ha)	75.6 75.7						75.6 75.7	
	受益者数(人)	// 102						// 102	
	筆 数(筆)	// 471						// 471	
	権 利 関 係								
	備 考 (関係戸数)	// (102)						// (102)	

第3節 水利状況

1. 用水状況


//

水源は、一級河川久保川、一級河川市野々川、普通河川藤沢川であり、大堰頭首工、松原頭首工、焼切頭首工より取水されているが、堂ノ沢ため池、本郷ため池、八瀬ため池からも取水している。水路は、コンクリートフリームで装工されているが、老朽化による劣化が著しく、目地からの漏水もあり、補修・更新を行うなど、水管理や維持管理費に多大な労力を費やしている状況である。


(1) 用水系統

次頁参照

市野々地区（用排水整備） 現況用水系統模式図

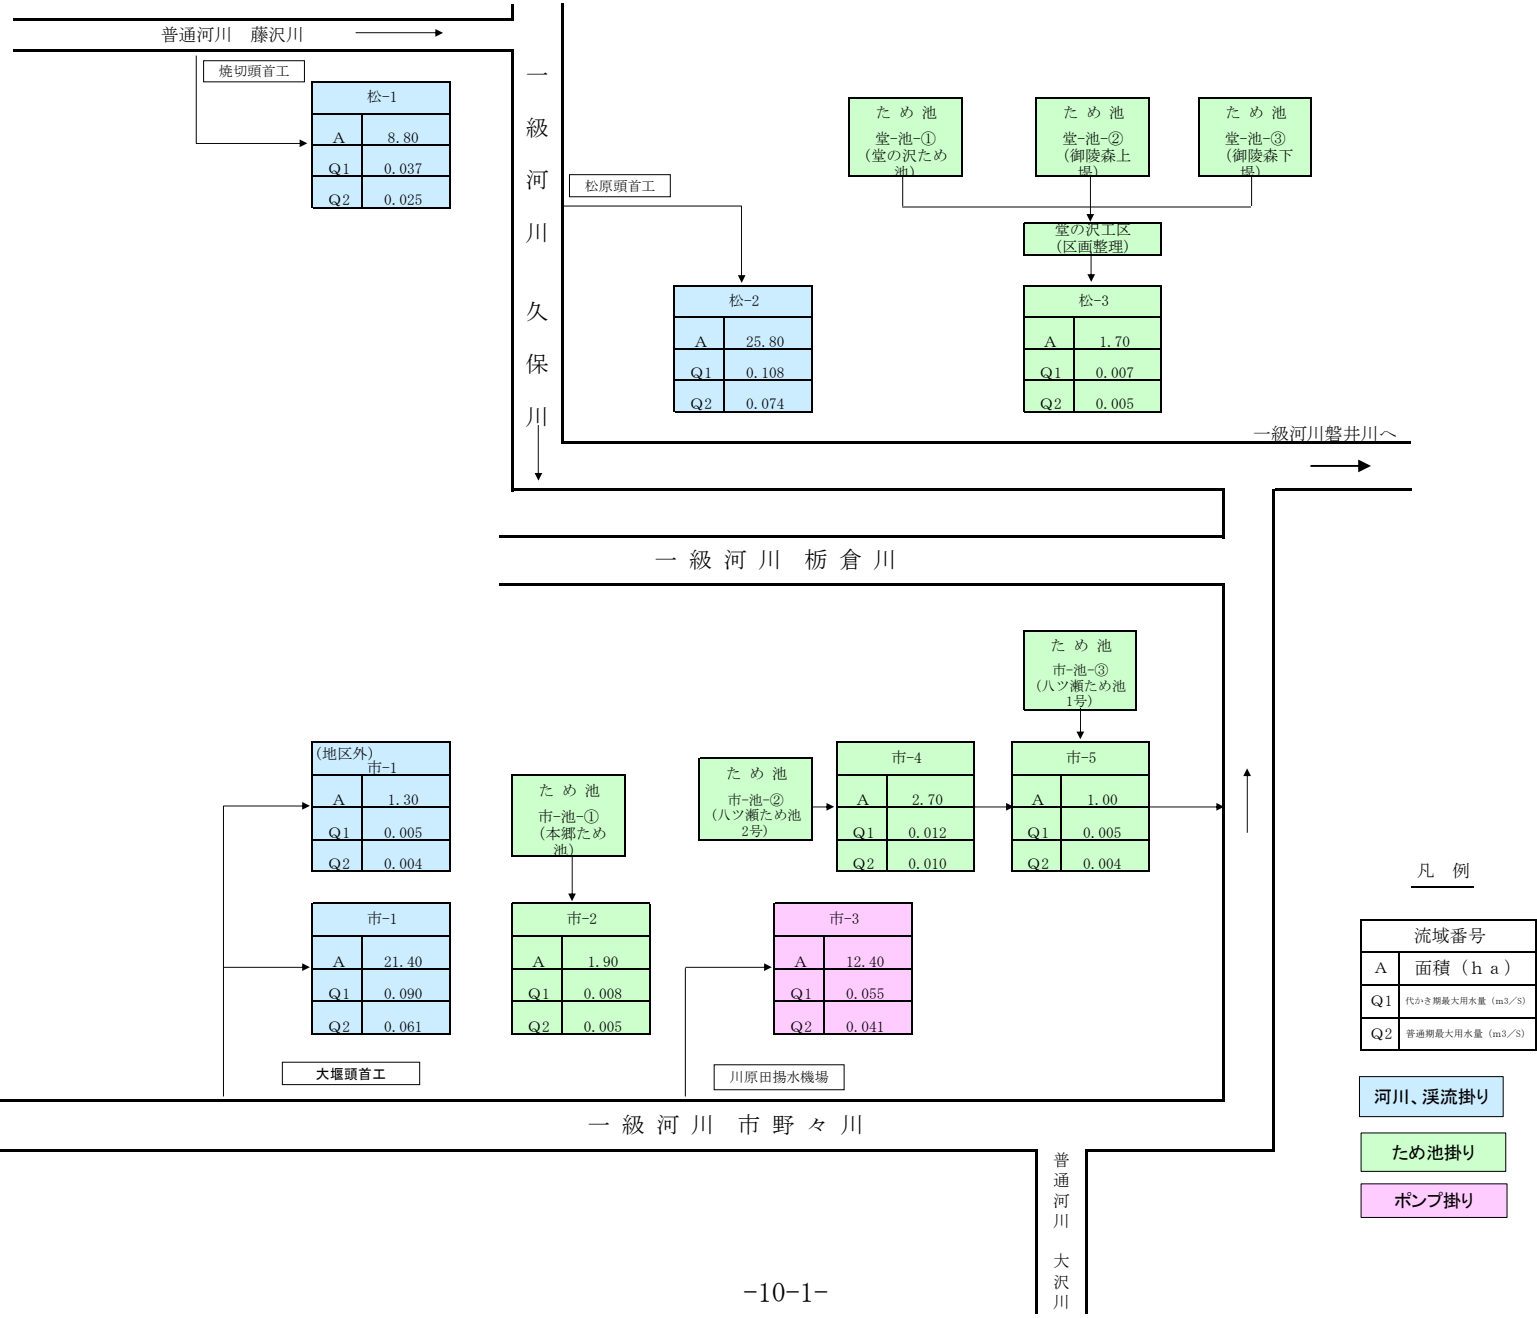

市野々地区（用排水整備） 現況用水系統模式図

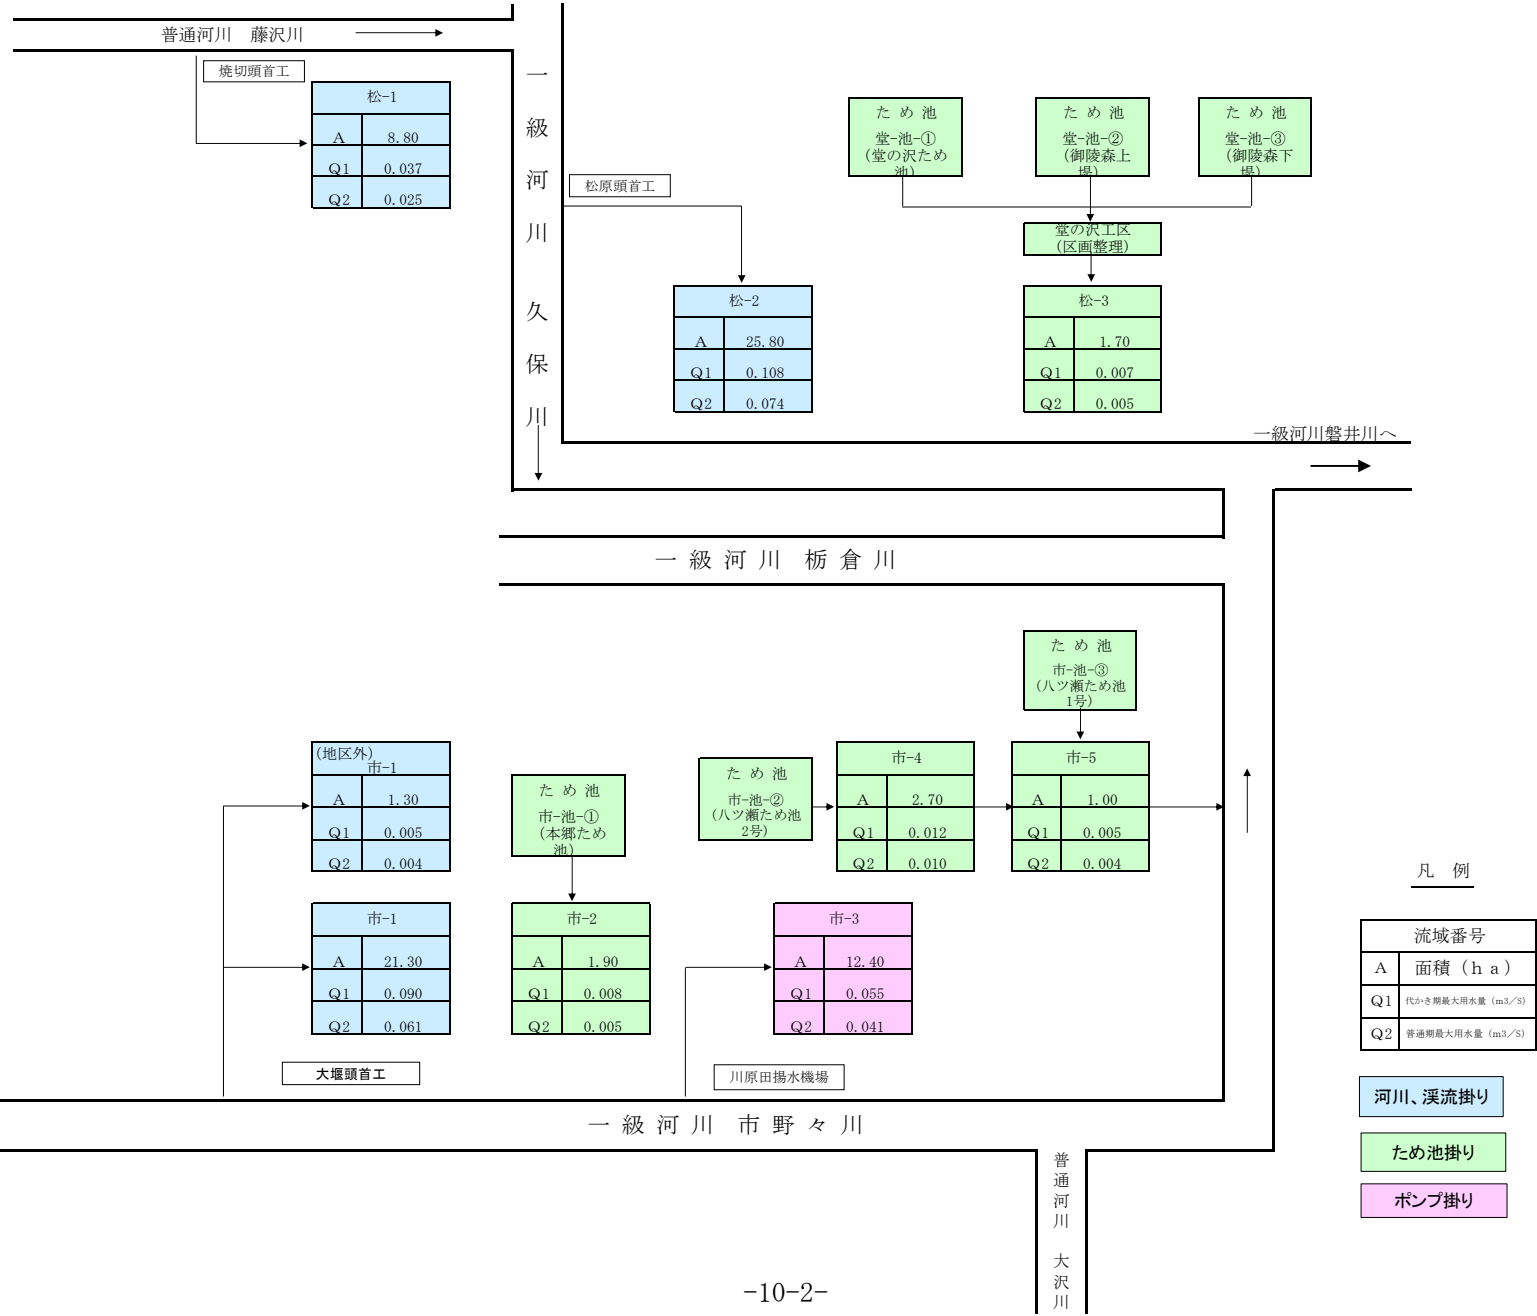

(2) 用水施設

(ア) 取水方法一覧表

(第5表-1)

事業名	項 目 施設名	か ん が い 面 積						計		水利権		慣行水利権		延取水量	備 考
		500ha以上		500～100ha		100ha未満									
		箇所	ha	箇所	ha	箇所	ha	箇所	ha	箇所	m ³ /s	箇所	m ³ /s	m ³ /s	
用排水整備	貯 水 池					〃 6	〃 7.3	〃 6	〃 7.3						上段:代掻き 下段:普通期
	井 堰					〃 3	〃 55.9 56.0	〃 3	〃 55.9 56.0			〃 3	〃 0.335 0.293	〃 0.335 0.293	
	自然取水口														
	揚 水 機					〃 1	〃 12.4	〃 1	〃 12.4			〃 1	〃 0.047 0.020	〃 0.047 0.020	
	そ の 他														
	計					〃 10	〃 75.6 75.7	〃 10	〃 75.6 75.7					〃 0.382 0.313	
合 計						〃 10	〃 75.6 75.7	〃 10	〃 75.6 75.7					〃 0.382 0.313	

(イ) 改修を要する施設一覧表

(第5表-2)

事業名	項 目 施設名	施設名 又は 箇所数	受益面積 (ha)	構 造	規 模	新設年 又は 更新年	改修を必要 とする理由	備 考
用排水整備	貯 水 池							
	井 堰							
	自然取水口							
	揚 水 機	〃 —	〃 —		〃 —	〃 —	〃 —	
	用 水 路	〃 —	75.6 75.7	〃 開水路	〃 L=13, 398m	〃 S 54	〃 老朽化	
	そ の 他							
	計		75.6 75.7		〃 L=13, 398m			
合 計			75.6 75.7		〃 L=13, 398m			

(3) 用水に関する被害状況

〃
該当なし

(4) ため池決壊の場合の想定被害状況

〃
該当なし

2. 排水状況


//

排水は、用水と分離されており、地区内の水路を経て、一級河川久保川、一級河川市野々川へ自然排水される。

水路は、コンクリート柵渠又は土水路となっており、柵渠の倒壊や土羽の崩壊が多数に見られる。柵渠の更新や土砂上げ等の維持管理に多大な労力を費やしている状況である。

(1) 排水系統 次頁参照

市野々地区（用排水整備） 現況排水系統模式図(松原工区)

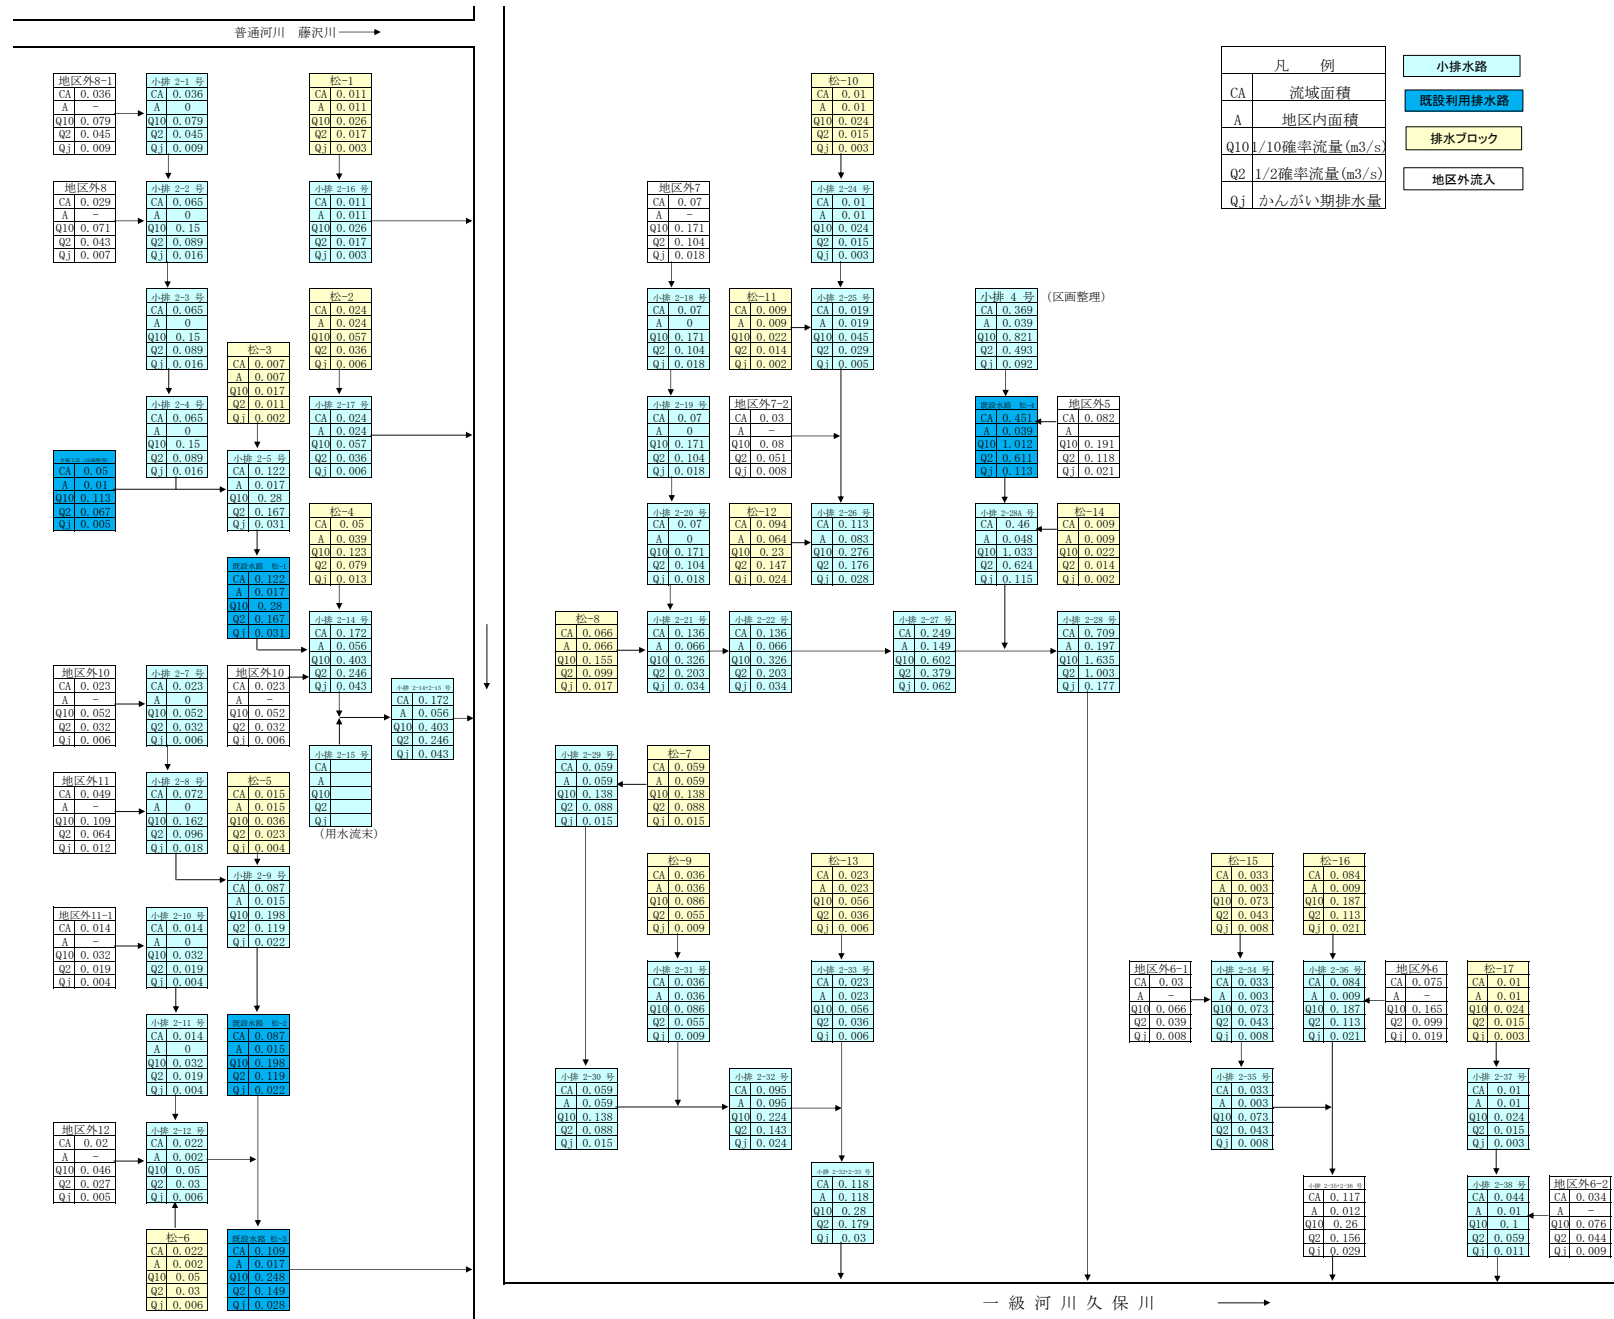


市野々地区（用排水整備） 現況排水系統模式図(市野々工区)

変更前

凡 例	
CA	流域面積
A	地区内面積
Q10	1/10確率流量(m ³ /s)
Q2	1/2確率流量(m ³ /s)
Q1	かんがい期排水量

小排水路
既設利用排水路
排水ブロック
地区外流入

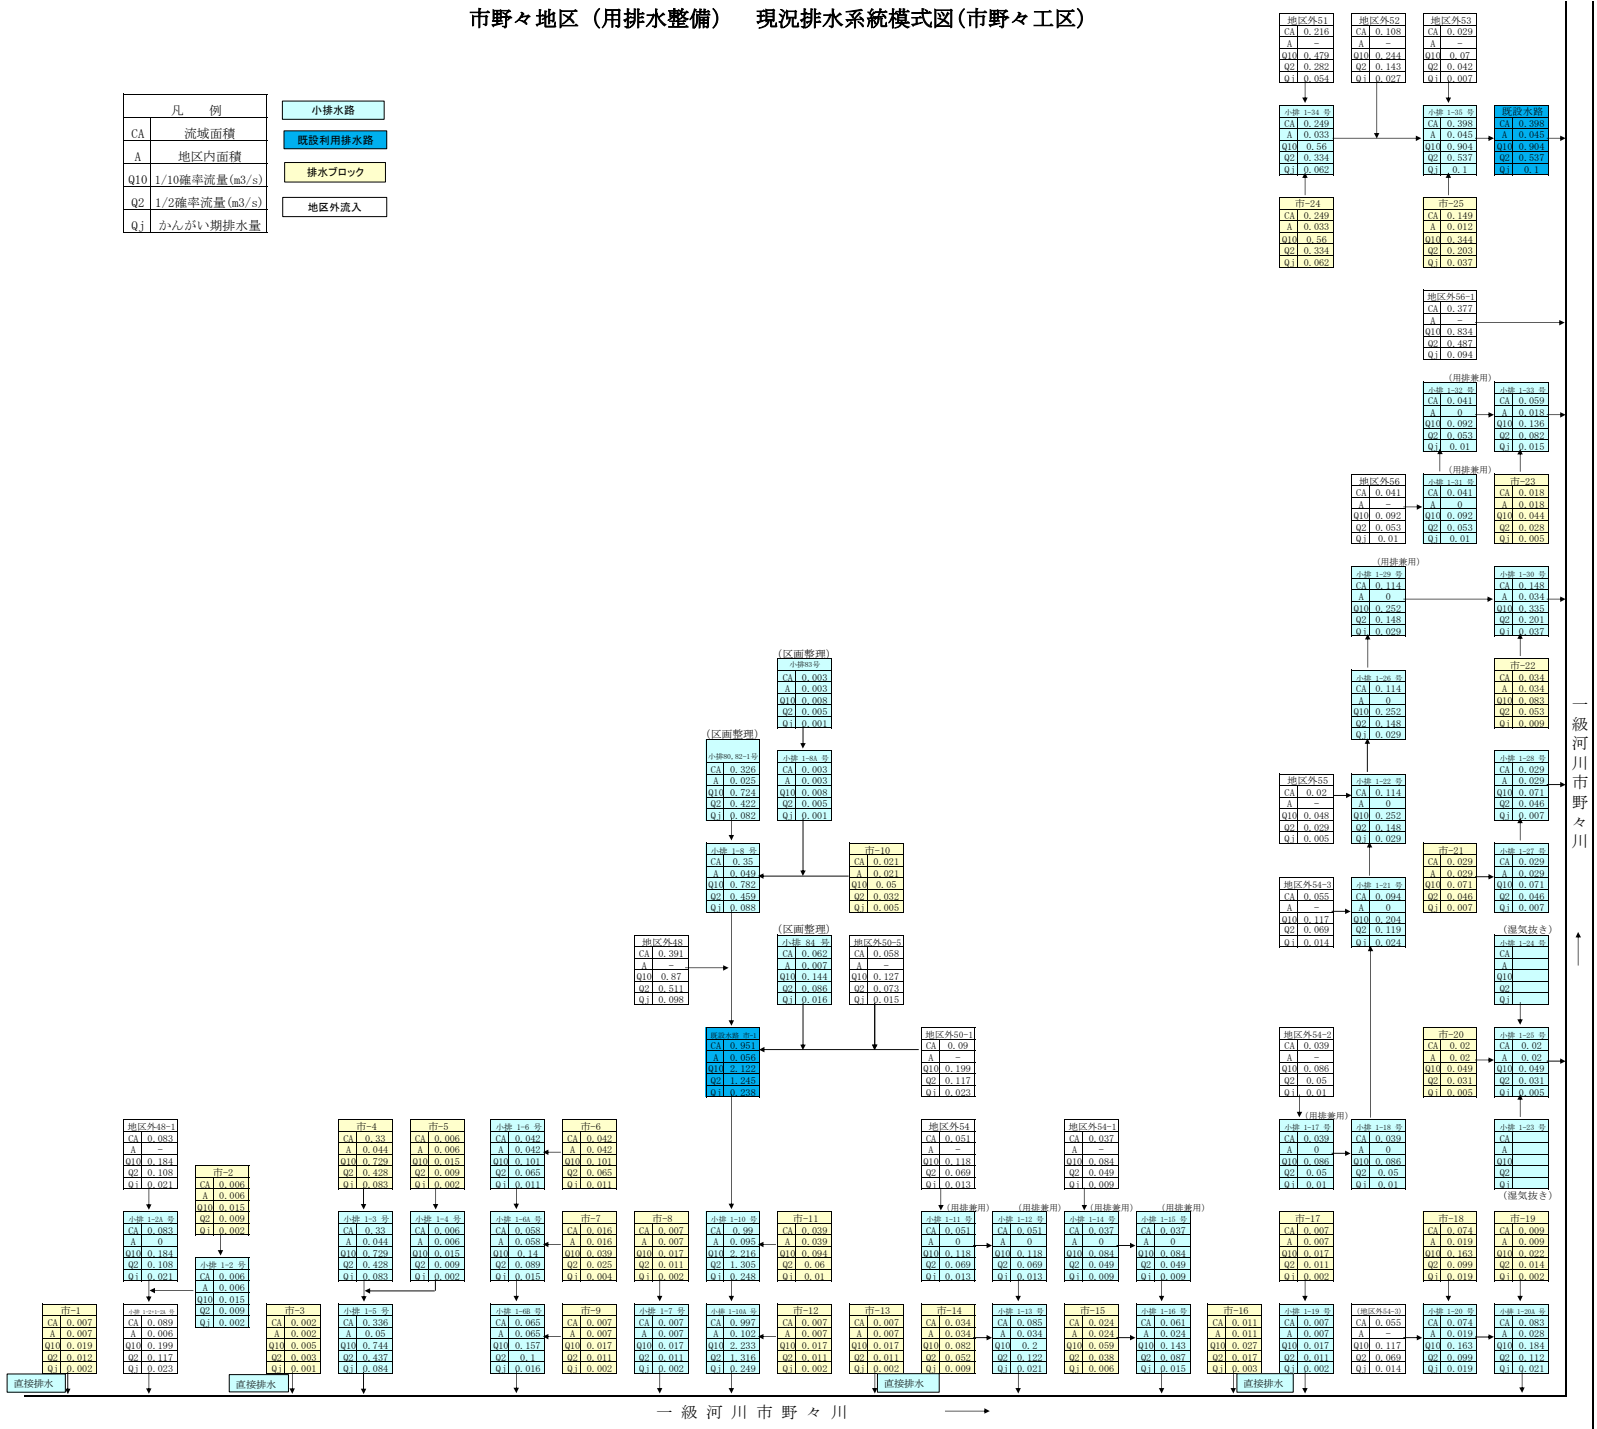

一級河川市野々川

一級河川市野々川


普通河川

市野々地区（用排水整備） 現況排水系統模式図(市野々工区)

変更後

凡 例	
CA	流域面積
A	地区内面積
Q10	1/10確率流量(m ³ /s)
Q2	1/2確率流量(m ³ /s)
Q1	かんがい期排水量

小排水路
既設利用排水路
排水ブロック
地区外流入

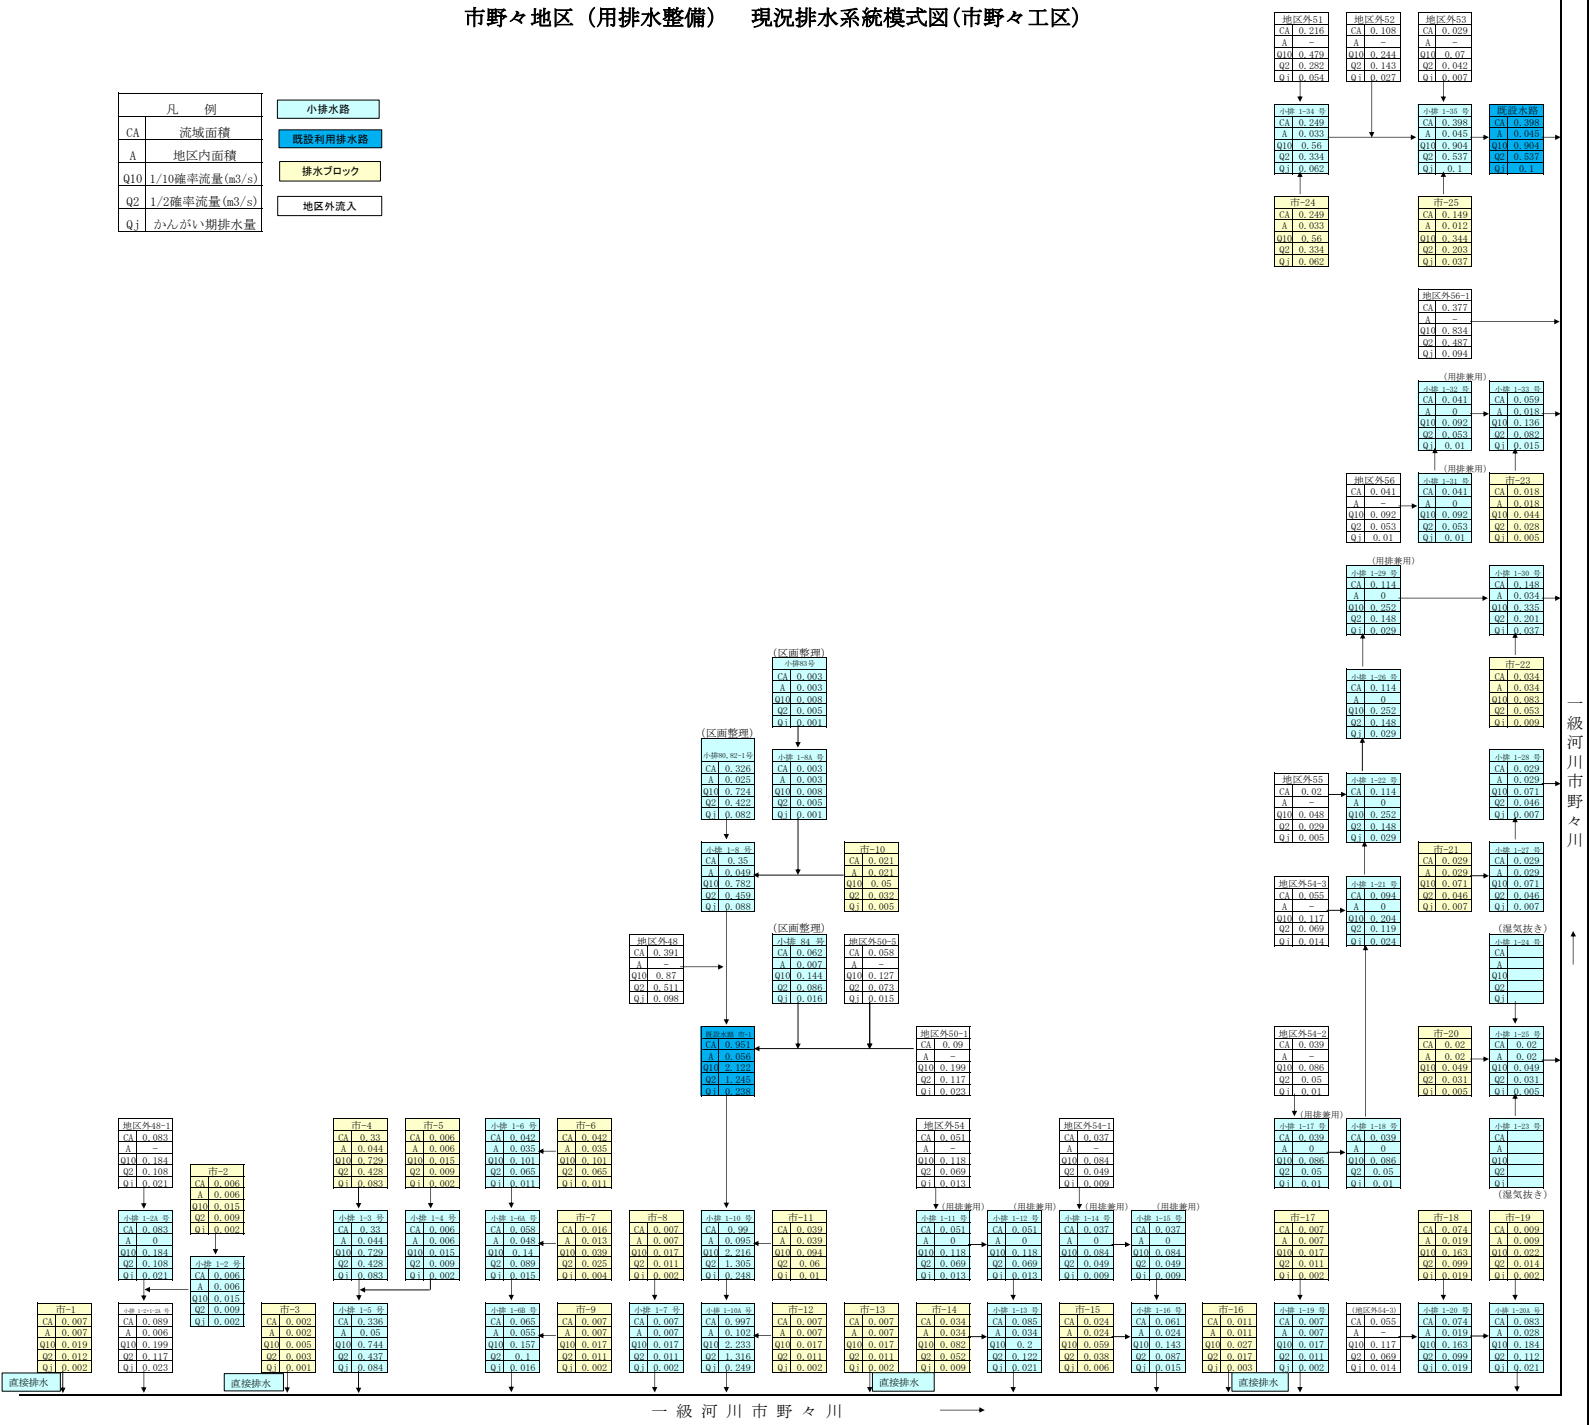

上段:変更後
下段:変更前

(2) 排水施設

(ア) 排水方法一覧表

(第5表-4)

事業名	項 目		排 水 面 積						計		排水慣行 (m³/s)	現況排水能力 (m³/s)	備 考
			500ha以上		500～100ha		100ha未満						
	施 設 名		箇所	ha	箇所	ha	箇所	ha	箇所	ha			
用排水整備	自然	排 水 路					〃	〃	〃	〃	〃		
		水 門					27	171.7	27	171.7	3.982		
	機械	排 水 機											
		水 門 及 び 排 水 機											
		排水路及び排水機											
	計						〃	〃	〃	〃	〃		
合 計						27	171.7	27	171.7	3.982			

(イ) 改修を要する施設一覧表

(第5表-5)

事業名	項目		施設名 又は 箇所数	受益面積 (ha)	構 造	規 模	新 設 年 又は 更 新 年	改修を必要 とする理由	備 考
	施 設 名								
用排水整備	自然	排 水 路	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
			—	171.7	コンクリート柵渠	L=7,924m	S54	老朽化	
	機械	水 門							
		排 水 機							
		水 門 及 び 排 水 機							
		排水路及び排水機							
	計			〃		〃			
			171.7		L=7,924m				
合 計				〃		〃			
				171.7		L=7,924m			

(3) 排水に関する被害状況

〃
該当なし

3. 河川状況

〃
該当なし

第4節 道路概況

1. 道路概況

//

本地区の耕作道は、昭和54年に完工した団体営土地改良区改良事業市野々地区、同じく昭和54年完工の団体営土地改良事業松原地区により整備され、幅員4.0～5.0mの砂利道となっている。営農上の支障は特にない。

上段:変更後
下段:変更前

2. 主要道路一覧表

県道・主要地方道 該当なし (第6表)

NO.	路 線 名	管理区分別	延 長 (m)	幅 員 (m)		構 造	改修の要否	備 考
				全 幅	有 効			

市道

NO.	路 線 名	管理区分別	延 長 (m)	幅 員 (m)		構 造	改修の要否	備 考
				全 幅	有 効			
1	松原広面線	市	770	8.5		アスファルト舗装	否	
2	中沢線	"	22	5.3		"	"	
3	上要害栃倉線	"	319	5.3		"	"	
4	馬場線	"	758	5.9		"	"	
5	松原2号線	"	228	5.0		砂利道	"	
6	松原3号線	"	416	3.8		砂利道	"	
7	堂の沢1号線	"	583	5.0		アスファルト舗装	"	
8	曲渕線	"	394	4.0		"	"	
9	老流・外山線	"	466	5.2		"	"	

上段: 変更後
下段: 変更前

第5節 地域農業の概況

1. 産業別就業人口

(第7表-1)

項 目 市町村名	総 数 (人)	農 業 (人)	林 業 (人)	漁 業 (人)	鉱 業 (人)	建設業 (人)	製造業 (人)	電気ガス熱 供給水道業 (人)	運 輸 通信業 (人)	卸売小売業 飲食店 (人)	金 融 保険業 (人)	不動産業 (人)	サービス業 (人)	公 務 (人)	その他 (人)	備考
〃 一関市	56,355 60,063	6,543 7,675	222 227	20 37	68 100	5,030 5,784	11,473 12,194	168 192	2,935 3,078	7,254 7,869	811 872	464 469	8,420 19,065	1,700 1,783	11,247 718	
計	56,355 60,063	6,543 7,675	222 227	20 37	68 100	5,030 5,784	11,473 12,194	168 192	2,935 3,078	7,254 7,869	811 872	464 469	8,420 19,065	1,700 1,783	11,247 718	
比 率 (%)	〃 100%	〃 13%	〃 0%	〃 0%	〃 0%	9% 10%	〃 20%	〃 0%	〃 5%	〃 13%	1% 2%	〃 1%	15% 32%	〃 3%	20% 1%	

岩手県統計年鑑 (R2国勢調査)
岩手県統計年鑑 (H31国勢調査)

上段: 変更後
下段: 変更前

2. 経営耕地広狭別農家数及び耕地の分散状況並びに専兼業別農家数

(第7表-2)

区 分 市 町 村 名	農 家 総 戸 数 (戸)	経営耕地広狭別農家数 (戸)										一 戸 当 た り 平 均 農 用 地 面 積 (ha)						耕地の 分散状況		専兼業別 農 家 数 (戸)			備 考
		例外 規定 の適用を 受けるもの	0.3	0.5	1.0	1.5	2.0	3.0	5.0	10.0	自 給 的 農 家	田	畑	樹 園 地	小 計	草 地	計	一戸 当たり 団地 数	団地 当たり 面積 (ha)	専 業	兼 業		
			～	～	～	～	～	～	～	ha											第 一 種	第 二 種	
			0.5	1.0	1.5	2.0	3.0	5.0	10.0	以上													
〃 一関市	8,996 11,352	－ 12	－ 1625	－ 2615	－ 1437	－ 752	－ 656	－ 384	－ 225	－ 89	3,487 3,557	1.50 1.1	0.46 0.2	0.05 0.2	2.01 1.5	－ －	2.01 1.5	－ －	－ －	－ 1733	－ 801	－ 5261	
計	8,996 11,352	－ 12	－ 1,625	－ 2,615	－ 1,437	－ 752	－ 656	－ 384	－ 225	－ 89	3,487 3,557	1.50 1.1	0.46 0.2	0.05 0.2	2.01 1.5	－ －	2.01 1.5	－ －	－ －	－ 1,733	－ 801	－ 5,261	
比 率	100% 〃	－ 0%	－ 14%	－ 23%	－ 13%	－ 7%	－ 6%	－ 3%	－ 2%	－ 1%	39% 31%	75% 74%	23% 13%	2% 13%	100% 100%	－ 0%	100% 100%	－ －	－ －	－ 22%	－ 10%	－ 68%	

2020農林業センサス
H27農林業センサス

上段:変更後
下段:変更前

3. 動力農機具及び主要家畜頭数

(第7表-3)

項 目 市町村名	動 力 農 機 具						主 要 家 畜						備考
	トラクター		動力田植機		コンバイン		乳 用 牛		肉 用 牛		豚		
	数 量 (台)	戸 数 (戸)	数 量 (台)	戸 数 (戸)	数 量 (台)	戸 数 (戸)	数 量 (頭)	戸 数 (戸)	数 量 (頭)	戸 数 (戸)	数 量 (頭)	戸 数 (戸)	
〃 一関市	- 7,249	- 5,951	- 4,876	- 4,735	- 2,419	- 2,303	2,723 3,480	128 157	10,753 15,021	766 1,030	136,066 82,878	11 10	
計	〃 7,249	〃 5,951	〃 4,876	〃 4,735	〃 2,419	〃 2,303	2,723 3,480	128 157	10,753 15,021	766 1,030	136,066 82,878	11 10	
100戸当たり 数 量 (台、頭)	- 122		- 103		- 105		30 2,217		120 1,458		1,513 828,780		
利用戸数 割 合 (%)		- 52%		- 42%		- 21%		〃 1%		〃 9%		〃 0%	農家戸数 8,996戸 11,352戸

2020農林業センサス
H27農林業センサス

上段:変更後
下段:変更前

4. 主要作物作付状況

(第7表-4)

市 町 村 名			一関市				計	平 均	作付率	備 考
総耕地面積(ha)			18,100 18,200				18,100 18,200			
区 分			作付面積	単 位 面 積	作付面積	単 位 面 積	作付面積	単 位 面 積	(%)	
作 物 名			(ha)	当たり収量 (kg/10a)	(ha)	当たり収量 (kg/10a)	(ha)	当たり収量 (kg/10a)		
田	表 作	〃 水 稲	5,431 6,009	509 519			5,431 6,009	509 519	49 64	
		〃 小麦 等	113 127	194 140			113 127	194 140	1 1	
		小 計		5,544 6,136			5,544 6,136		74 65	
	普 通 畑	春 夏 作	〃 麦 類(小麦他)	〃 -	〃 -			〃 -	〃 -	〃 -
〃 豆 類(大豆他)			118 157	106 101			118 157	106 101	1 2	
〃 野菜類(なす他)			37 197	1,460 3,447			37 197	1,460 3,447	0 2	
〃 花き類・花木(りんどう他)			- 83	- 2,220			- 83	- 2,220	- 1	- 単収(1000本/10a)
〃 牧草			1,416 1,809	2,640 -			1,416 1,809	2,640 -	13 19	
〃 その他			1,115 767	〃 -			1,115 767	〃 -	10 8	
〃 -			〃 -	〃 -			〃 -	〃 -	〃 -	
小 計			2,686 3,013			2,686 3,013		23 32		
樹 園 地		果樹類(りんご他)		260	〃			260	〃	2
	果樹類		235	-			235	-	3	
	小 計		260 235			260 235		2 3		
計			11,052 9,384				11,052 9,384		99 100	
市 町 村 別 延べ作付率(%)			61 52				61 52			

2020農林業センサス
H27農林業センサス

上段: 変更後
下段: 変更前

5. 農業の動向

(2020農林業センサス)

(2015農林業センサス)

(第7表－5)

項 目 区 分	農 家			土 地			主要作物			大 家 畜			動力農機具			その他	地 域 指定等	備 考
		B (H27) (H22)	A (R2) (H27)		B (H27) (H22)	A (R2) (H27)	作物名	B (H27) (H22)	A (R2) (H27)	家畜名	B (H27) (H22)	A (R2) (H27)	農機具名	B (H27) (H22)	A (R2) (H27)			
変化の 状 況 (C年を100 とする指数)	総農家	88 92	70 81	耕地	92 92	75 81	水稻	95 98	86 93	乳用牛	70 81	57 57	耕耘機 トラクター	89 89	－ 79		農振 S48.3 S45.3	A: 令和2年 (2020)
	専業 農家数	89 121	－ 108	田	95 91	77 81	雑穀	－ 72	－ 109	肉用牛	76 76	56 57	動力田植機	80 82	－ 64		野菜 S45	A: 平成27年 (2015)
	第一種 兼業農家	83 77	－ 64	畑	84 99	68 82	大豆	85 118	64 100	豚	67 100	73 66	コンバイン	92 74	－ 68		果樹 S55	B: 平成27年 (2015)
	第二種 兼業農家	81 81	－ 65	樹園地	93 72	74 68	小麦	115 73	103 84	採卵鶏	82 93	68 76	動力防除機	〃 －	〃 －		酪農 S59	B: 平成22年 (2010)
	農業 従事者	76 160	51 121	草地	－ 100	－ 91	野菜	102 82	92 82								過疎 H17.9 －	C: 平成22年 (2010)
																	山振 S45.12 －	C: 平成17年 (2005)
																	特農指定 H5.9 －	
変化の 理 由	総農家数、農業従事者は減少している。 法人組織育成により総農家数、農業従事者数とも減少している。			農地転用が進み農用地の減少が進んでいる。 農地転用が進み農用地の減少が進んでいる。			水稻は水田畑の利用の推進により、減少している。 水稻は水田畑利用の推進により、近年は減少傾向になっている。また、転作農地の有効利用は減少している。			畜産農家が減少している。 畜産農家の減少に伴い肥育家畜数も減少している。			農作業の省力化を図るため、大型トラクター、コンバインの導入が進み、機械台数が減少している。 農作業の省力化を図るため、大型トラクター、コンバインの導入が進んでいる。一方、水稻の作付面積が減少しているため農機具も減少傾向にある。					

第6節 地域環境の概況

一関市では豊かな水と彩りある美しい緑に包まれており、市の中央を南流する北上川には、磐井川、砂鉄川、千厩川、金流川などが注ぎ込み、多様な水辺環境を形成している。市の西部には栗駒国定公園に指定されている奥羽山系や、東部は室根高原県立自然公園となっている室根山をはじめとする：高地の丘陵地帯が広がっている。なお、本地域内には、「環境省レッドリスト」及び「いわてレッドデータブック」に搭載されている希少種の生育・生息が確認されて

地域では、水田や水路・ため池が隣接して、水路付近には、シナイモツゴ、スナヤツメ等の魚類や、ドブガイ等の貝類、クロサンショウオ等の両生類、サンコウチョウ等の鳥類、ゲンジボタル、オゼイトトンボ等の昆虫類の生息が確認されている。

また、植物では、キキョウ、オミナエシ、ノダイオウ、オオニガナ等が生育している。

地域ではそれらの生態保護に配慮し、隣接する森林などの水源地の保全、ため池や用排水路の維持管理に取り組んでいる。

第4章 一 般 計 画

第1節 事業計画の要旨

1. 要 旨

//

本計画地域は、岩手県の最南端の一関市中心部より西方10kmの一関市萩荘に位置し、地区の西側に連なる須川岳（栗駒山）をはじめとする奥羽山脈の裾野に広がる丘陵地帯である。地区内には、一級河川久保川、一級河川市野々川、一級河川栃倉川及びその他複数の河川が流れ、また、国道457号と県道本郷・五串線が走り、各河川沿いに形成された松原、市野々の集落からなる水田地帯である。

本地区は、団体営土地改良事業市野々地区及び団体営土地改良事業松原地区で整備し、30a区画となっている。

地区内の水路は、一部土水路であるが、大部分がコンクリートフリューム及びコンクリート柵渠で装工されているものの老朽化による劣化が著しく、用水路の目地からの漏水や排水路の柵渠の倒壊による土壌の浸食等が生じ、水管理の負担の増加、及び水路の補修・更新などの維持管理費の増加が地区の問題となっている。

以上の問題を解消するために、用排水路の更新整備を行い、水管理及び維持管理の負担を軽減し、営農意欲の向上と担い手の育成、確保につなげ、農業経営の安定化を図るものである。

2. 事業別面積

(第8表)

事業名 土地 利用区分 事業目的	区 画 整 理																		計 (ha)	備 考
	水 田 (ha)	普 通 畑 (ha)	牧 草 畑 (ha)	果 樹 園 (ha)	そ の 他 (ha)	小 計 (ha)	水 田 (ha)	普 通 畑 (ha)	牧 草 畑 (ha)	果 樹 園 (ha)	(ha)	小 計 (ha)	水 田 (ha)	普 通 畑 (ha)	牧 草 畑 (ha)	果 樹 園 (ha)	(ha)	小 計 (ha)		
用排水整備	75.6 75.7					75.6 75.7													75.6 75.7	
計	75.6 75.7					75.6 75.7													75.6 75.7	

第2節 営農計画及び土地利用計画

1. 営農計画の概要

本事業において、用水のBFによる舗装によつての用水の有効利用を図るとともに、排水路の整備を行い、
農地の集積に妨げとなっている営農条件を解消することにより、経営規模拡大による低コスト農業を目指す。

- 1) 経営方式 水田
- 2) 経営組織 大型機械による
- 3) 作付体系及び作業体系 移植栽培

2. 土地利用区分

(第9表-1)

事業名	土地利用 区分	水 田 (ha)	普通畑 (ha)	牧草畑 (ha)	果樹園 (ha)	茶 園 (ha)	その他 (ha)	小 計 (ha)	原 野 (ha)	山 林 (ha)	その他 (ha)	計 (ha)	備考
用排水整備	現 況	75.6 75.7						75.6 75.7				75.6 75.7	
	計 画	75.6 75.7						75.6 75.7				75.6 75.7	
	現 況												
	計 画												
計	現 況	75.6 75.7						75.6 75.7				75.6 75.7	
	計 画	75.6 75.7						75.6 75.7				75.6 75.7	

上段: 変更後
下段: 変更前

3. 作付方式

(第9表-2)

事業名	項目	経営 類型	土地利用 区 分	1 年 目												2 年 目												3 年 目												4 年 目												備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
用排水整備	現況	水稻 + 大豆 WCS 加工米	田				○			水	稲																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

上段:変更後
下段:変更前

4. 生産計画

(第9表-3)

事業名	項 目 土地利用区分		作物名	作付面積 (ha)			作付率 (%)		単位面積当たり収穫量(kg/10a)			生産量 (t)			同左生産量増減の内訳 (t)		備考
				現況	計画	増減	現況	計画	現況	計画	増減	現況	計画	増減	面積増減	単位面積当たり収量増加	
用排水整備	水田	表作	水稲	57.6 57.7	57.6 57.7		79.4 79.5	79.4 79.5	522 525	553 557	31 32	300.7 302.9	318.5 321.4	17.8 18.5		17.8 18.5	
			加工米	2.3 2.4	2.3 2.4		3.2 3.3	3.2 3.3	522 525	553 557	31 32	12.0 12.6	12.7 13.4	0.7 0.8		0.7 0.8	
			大豆	- 1.7	- 1.7		- 2.3	- 2.3	- 89	- 147	- 58	- 1.5	- 2.5	- 1.0		- 1.0	
			W C S	12.6 10.8	12.6 10.8		17.4 14.9	17.4 14.9									

※作付面積は本地面積で整理

上段: 変更後
下段: 変更前

5. 労働改善計画

(第9表-4)

事業名	項目 土地利用区分	作物名	作付面積 (ha)	単位面積当たり労働投下量 (hr/10a)				備 考
				区 分	現 況	計 画	増 減	
用 排 水 整 備	水 田	水 稻	24.9 22.7	人 力	16.3 20.4	16.3 20.4		30a乾田(1ha) →30a乾田(2ha)(No, 1-1)
				機械力	10.8 15.7	10.8 15.7		30a乾田(1ha) →30a乾田(2ha)(No, 1-1)
				人 力				
				機械力				
				人 力				
				機械力				
				人 力				
				機械力				
		計		人 力				
				機械力				
				人 力				
				機械力				
合 計			24.9 22.7					

6. 級地別土地利用区分

〃
該当なし

7. 土地配分計画

〃
該当なし

第3節 用水計画

1. 計画基準年

昭和45年
(かんがい期有効雨量、かんがい期総干天日数、かんがい期連続干天日数とも1/10確率年に近い年)


2. 計画かんがい方式

水田(水稻)	開水路方式
水田(転作物)	開水路方式


3. 計画用水系統図

次頁参照

市野々地区（用排水整備） 計画用水系統模式図

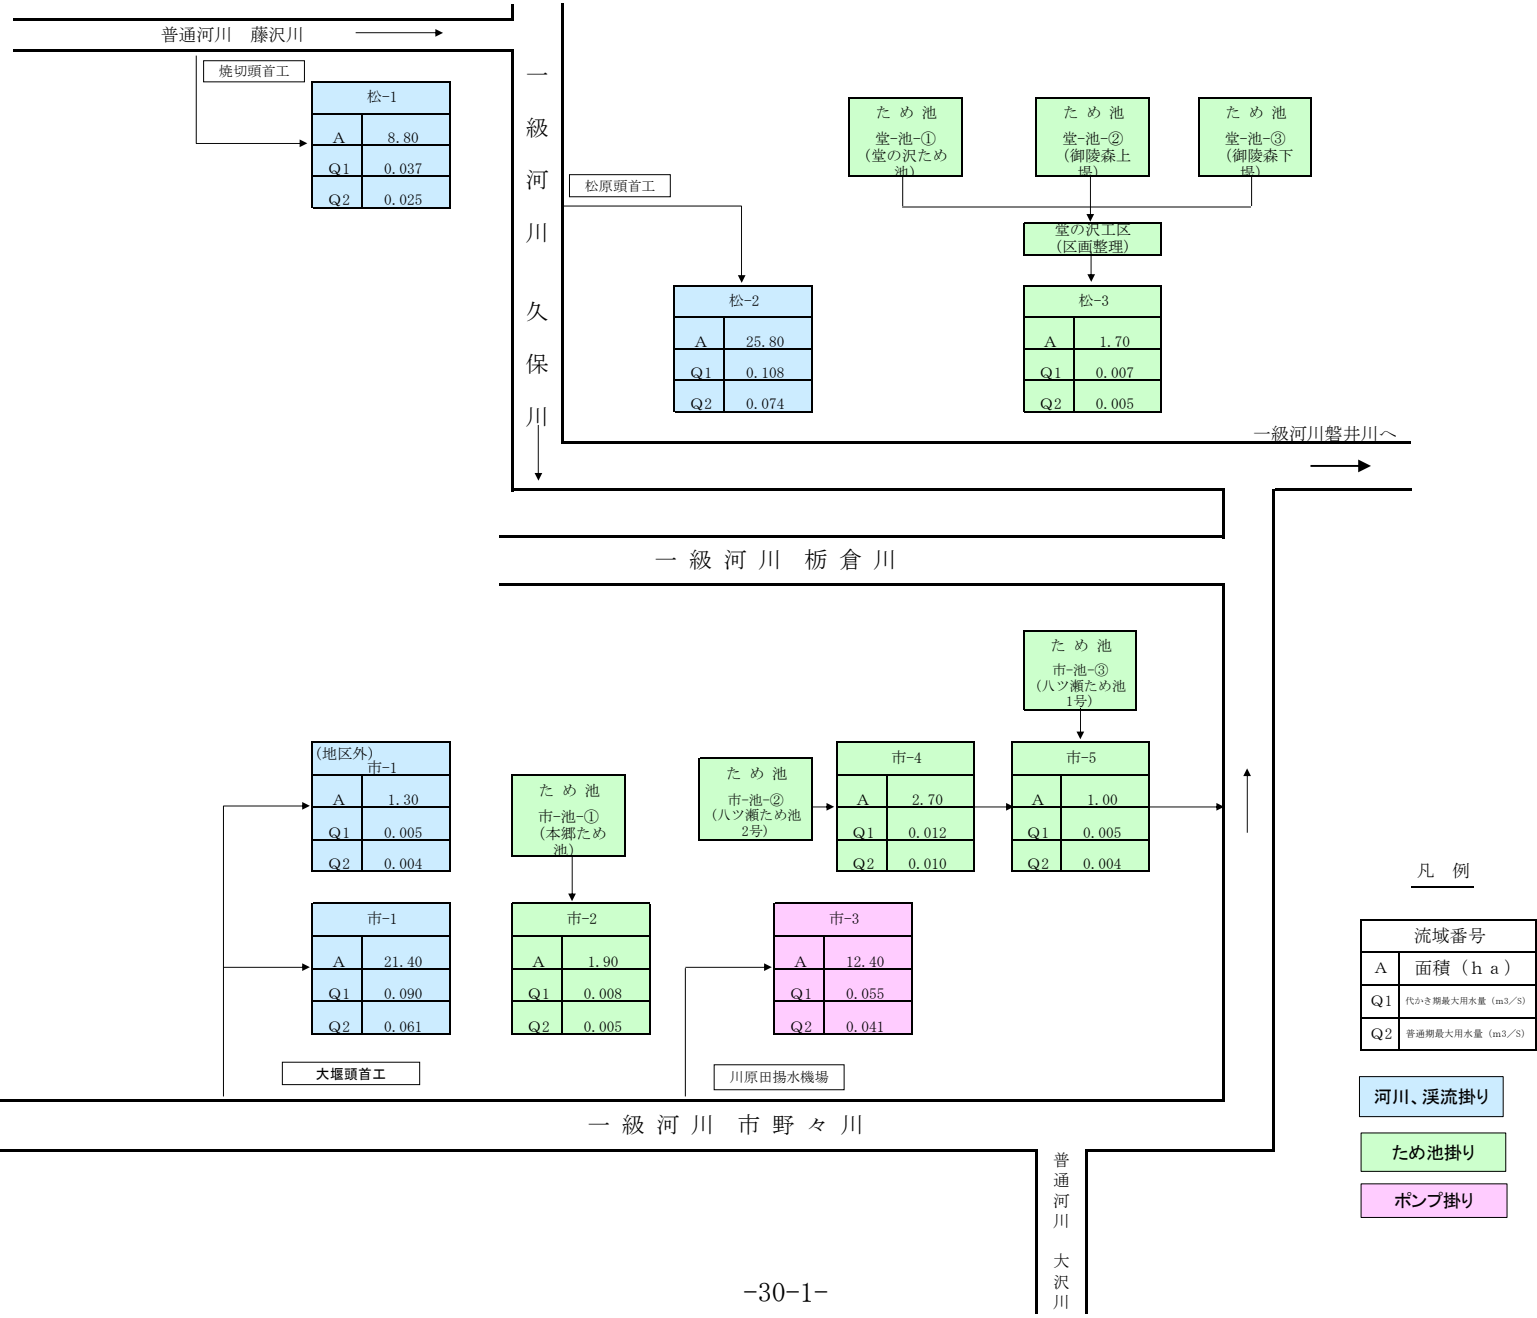

市野々地区（用排水整備） 計画用水系統模式図

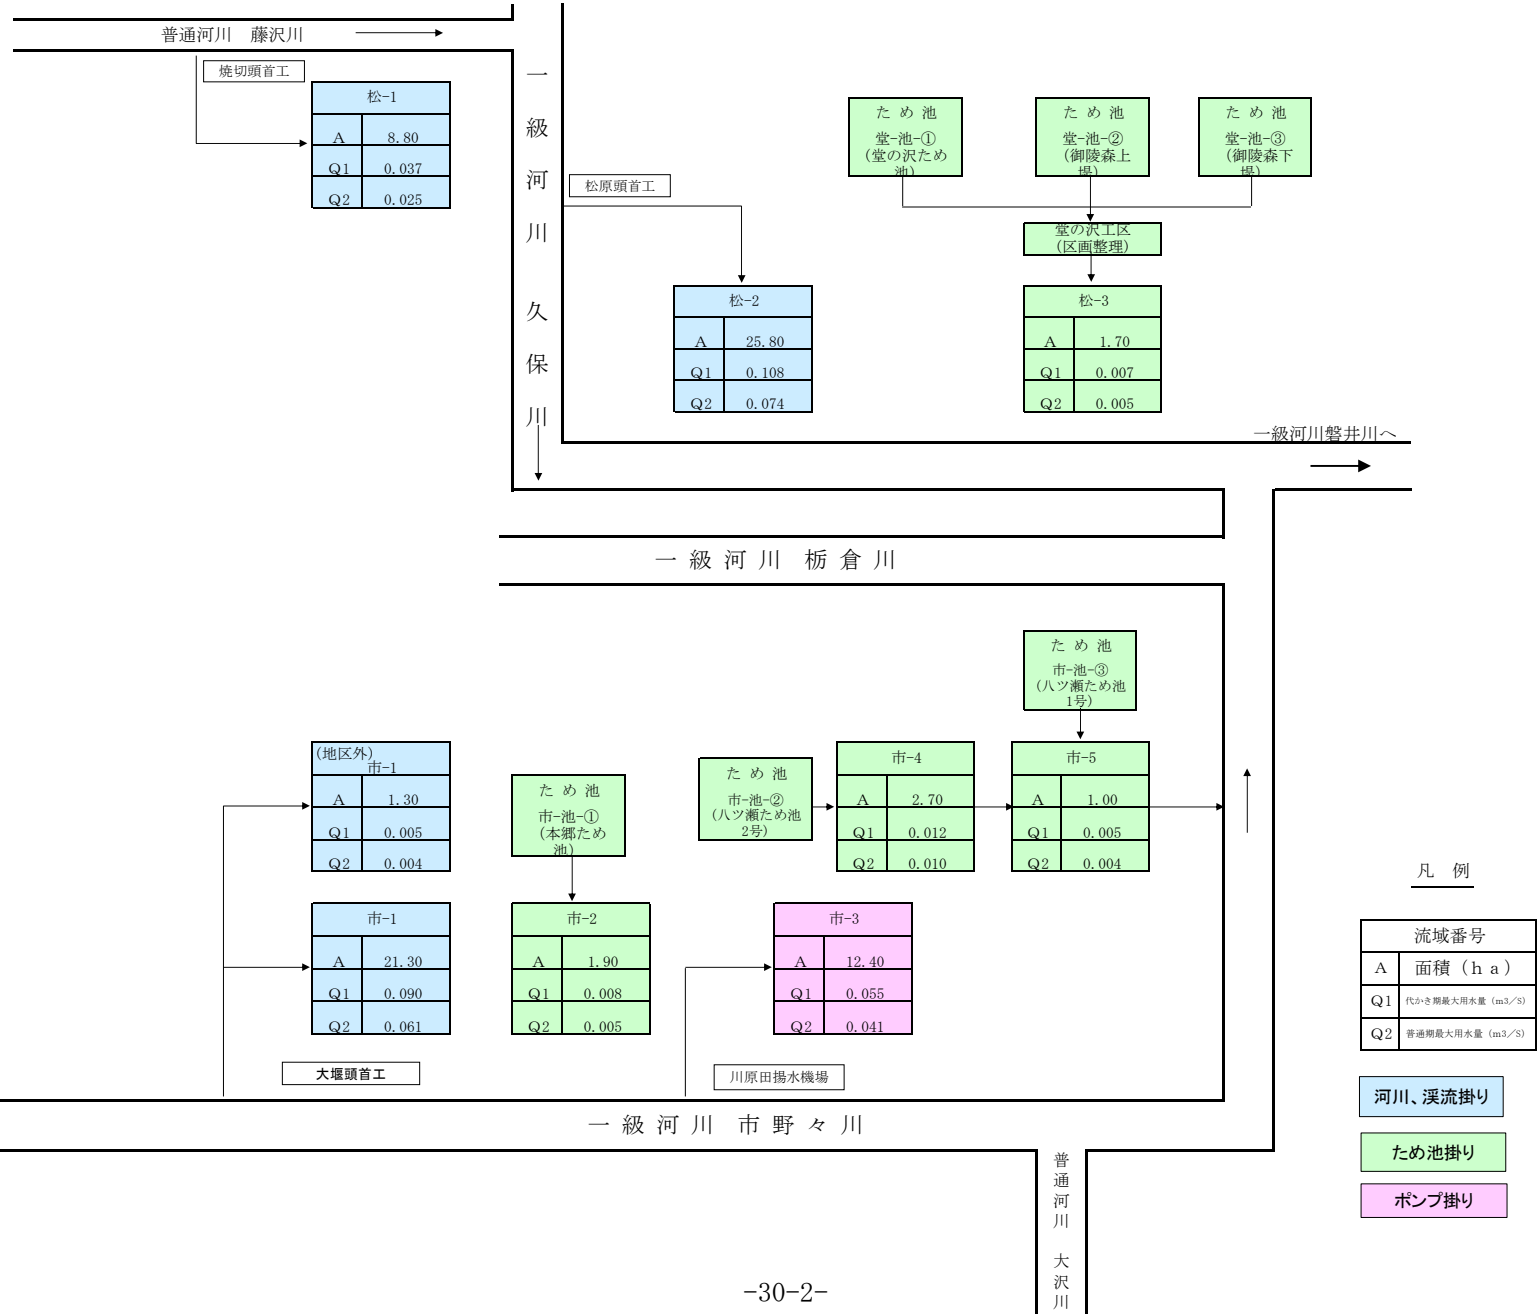

上段:変更後
下段:変更前

4. 計画用水量

(1) かんがい用水

(第10表-1-1)

項目 系統名	種別	面積 (ha)			水田かんがい			水田畑利用			畑地かんがい			その他		消費水量 (m ³ /s)	損失率 (%)	粗用水量		備考
		事業名			普通期	代かき期	面積 (ha)	一平均 日当たり 計画深	平均 間断日 数	面積 (ha)	一平均 日当たり 計画深	平均 間断日 数	面積 (ha)	計平均 単位用 水量	面積 (ha)			平	最	
		用排水 整備	(地区外)	計	計画 単位用 水平均 量 (mm/日)	計画 単位用 か水量 (mm)		(mm/日)	(日)	(ha)	(mm/日)	(日)	(ha)	(mm/日)	(ha)			均 (m ³ /s)	大 (m ³ /s)	
市野々川	農業用水	33.7 33.8		33.7 33.8	〃 21~26	〃 120	33.7 33.8									〃 0.123	〃 15	〃 0.102	〃 0.145	
藤沢川	農業用水	〃 8.8		〃 8.8	〃 21	〃 120	〃 8.8									〃 0.031	〃 15	〃 0.025	〃 0.037	
久保川	農業用水	〃 25.8		〃 25.8	〃 21	〃 120	〃 25.8									〃 0.092	〃 15	〃 0.074	〃 0.108	
ため池	農業用水	〃 7.3		〃 7.3	〃 21~26	〃 120	〃 7.3									〃 0.027	〃 15	〃 0.024	〃 0.032	
計		75.6 75.7		75.6 75.7			75.6 75.7									〃 0.273		〃 0.225	〃 0.322	

(2) 営農飲雑用水

〃
該当なし

上段:変更後
下段:変更前

5. 水源計画

(1) 水利用計画

(第10表-2)

項 目 区 分		消費水量	有効雨量	純用水量	粗用水量	現況利用可能水量			不足水量		水源依存量		水源工種	備 考
		a	b	c=a-b	d=c/(1-α)	水源名	取水地点 利用可能量	ほ場利用 可 能 量	純不足 水 量	全不足 水 量	水源名	水 量		
		(千m ³)	(千m ³)	(千m ³)	(千m ³)		e (千m ³)	f (千m ³)	g=c-f (千m ³)	h=d-e (千m ³)		(千m ³)		損失率: α
用排水整備		〃		〃	〃	〃	〃	〃			〃	〃	〃	〃
	松原	212		212	249	藤沢川	581	212			—	—	取水工	0.15
		〃		〃	〃	〃	〃	〃			〃	〃	〃	〃
	松原	511		511	601	久保川	1,355	511			—	—	取水工	0.15
		〃		〃	〃	〃	〃	〃			〃	〃	〃	〃
	市野々	861		861	1,013	市野々川	1,050	861			—	—	取水工・揚水機場	0.15
		〃		〃	〃	〃	〃	〃			〃	〃	〃	〃
	ため池	201		201	237	ため池	237	201			—	—		0.15
	計	1,785		1,785	2,100		3,223	1,785						

上段:変更後
下段:変更前

(2) 用水対策

(ア) 貯水池 該当なし

(第10表-3)

項 目 貯 水 池 名	流域面積 (km ²)		かんがい面積 (ha)			純貯水量 (千m ³)	純貯水量 (千m ³)	利用貯水量 (千m ³)	利用回数 (回)	最大取水量 (m ³ ／s)	備 考
	直 接	間 接	事 業 名								
			用排水整備		計						

(イ) 井堰及び自然取入口

該当なし

(第10表-4)

項 目 取水施設名	河川名	流域面積 (km ²)	かんがい面積 (ha)			取水量(m ³ /s)		備 考
			事 業 名			最大	平均	
			用排水整備		計			

(ウ) 揚水機

該当なし

(第10表-5)

項 目 名 称	水 源 名	かんがい面積 (ha)			所要水量(m³/s)		揚 水 機				備 考
		事 業 名			最 大	平 均	実揚程 (m)	揚水量 (m³/s)	台 数 (台)	全揚水量 (m³/s)	
		用排水整備		計							

第4節 排水計画

1. 計画基準雨量

(計画樹立参考資料 H21. 2月版 一関気象観測所)

最大 2 4 時間雨量	131.4 mm (1/10年)	87.0 mm (1/2年)
最大 4 時間雨量	73.1 mm (1/10年)	46.7 mm (1/2年)
最大 1 時間雨量	36.8 mm (1/10年)	23.3 mm (1/2年)


2. 計画排水方式

自然流下排水

3. 計画排水系統図

次頁参照

市野々地区（用排水整備） 計画排水系統模式図(松原工区)

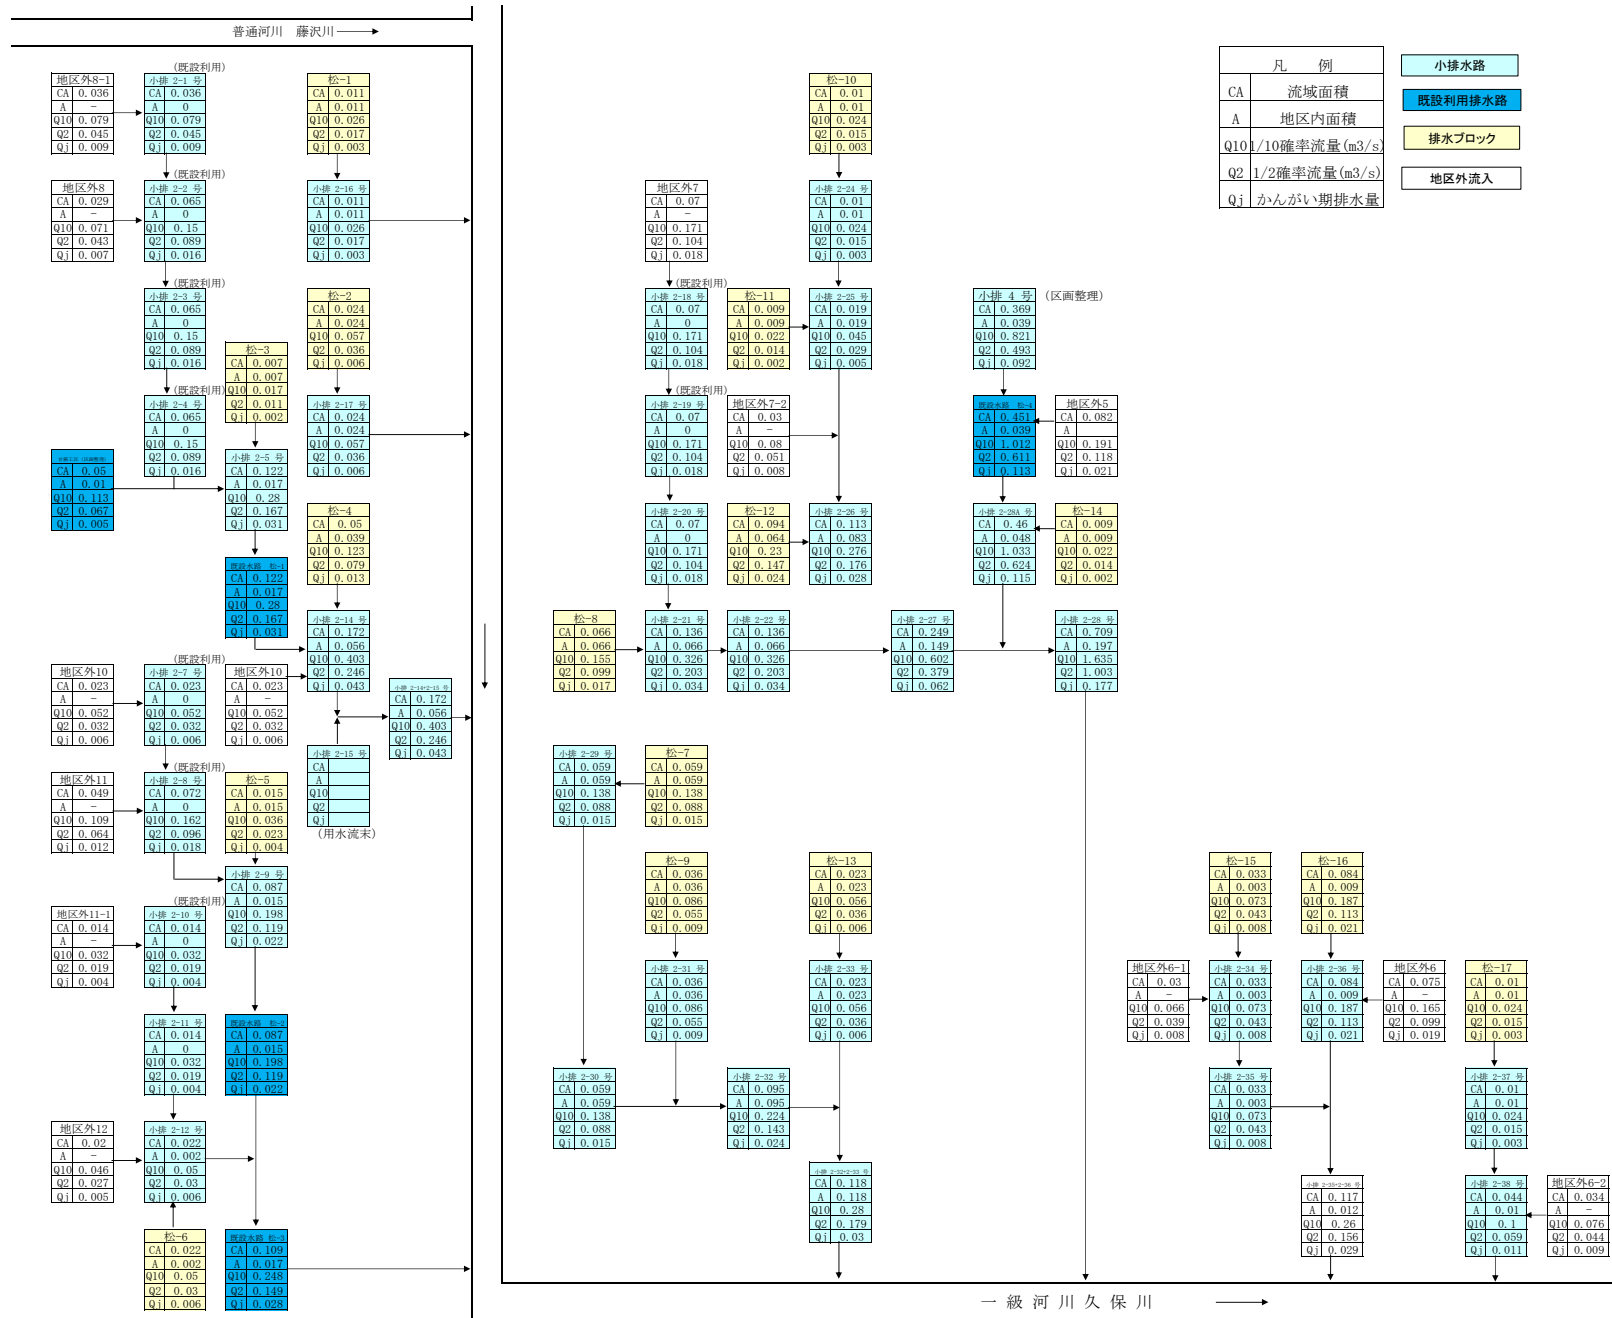

市野々地区（用排水整備） 計画排水系統模式図(市野々工区)

変更前後同


凡 例	
CA	流域面積
A	地区内面積
Q10	1/10確率流量(m ³ /s)
Q2	1/2確率流量(m ³ /s)
Q1	かんがい期排水量

小排水路

既設利用排水路

排水ブロック

地区外流入

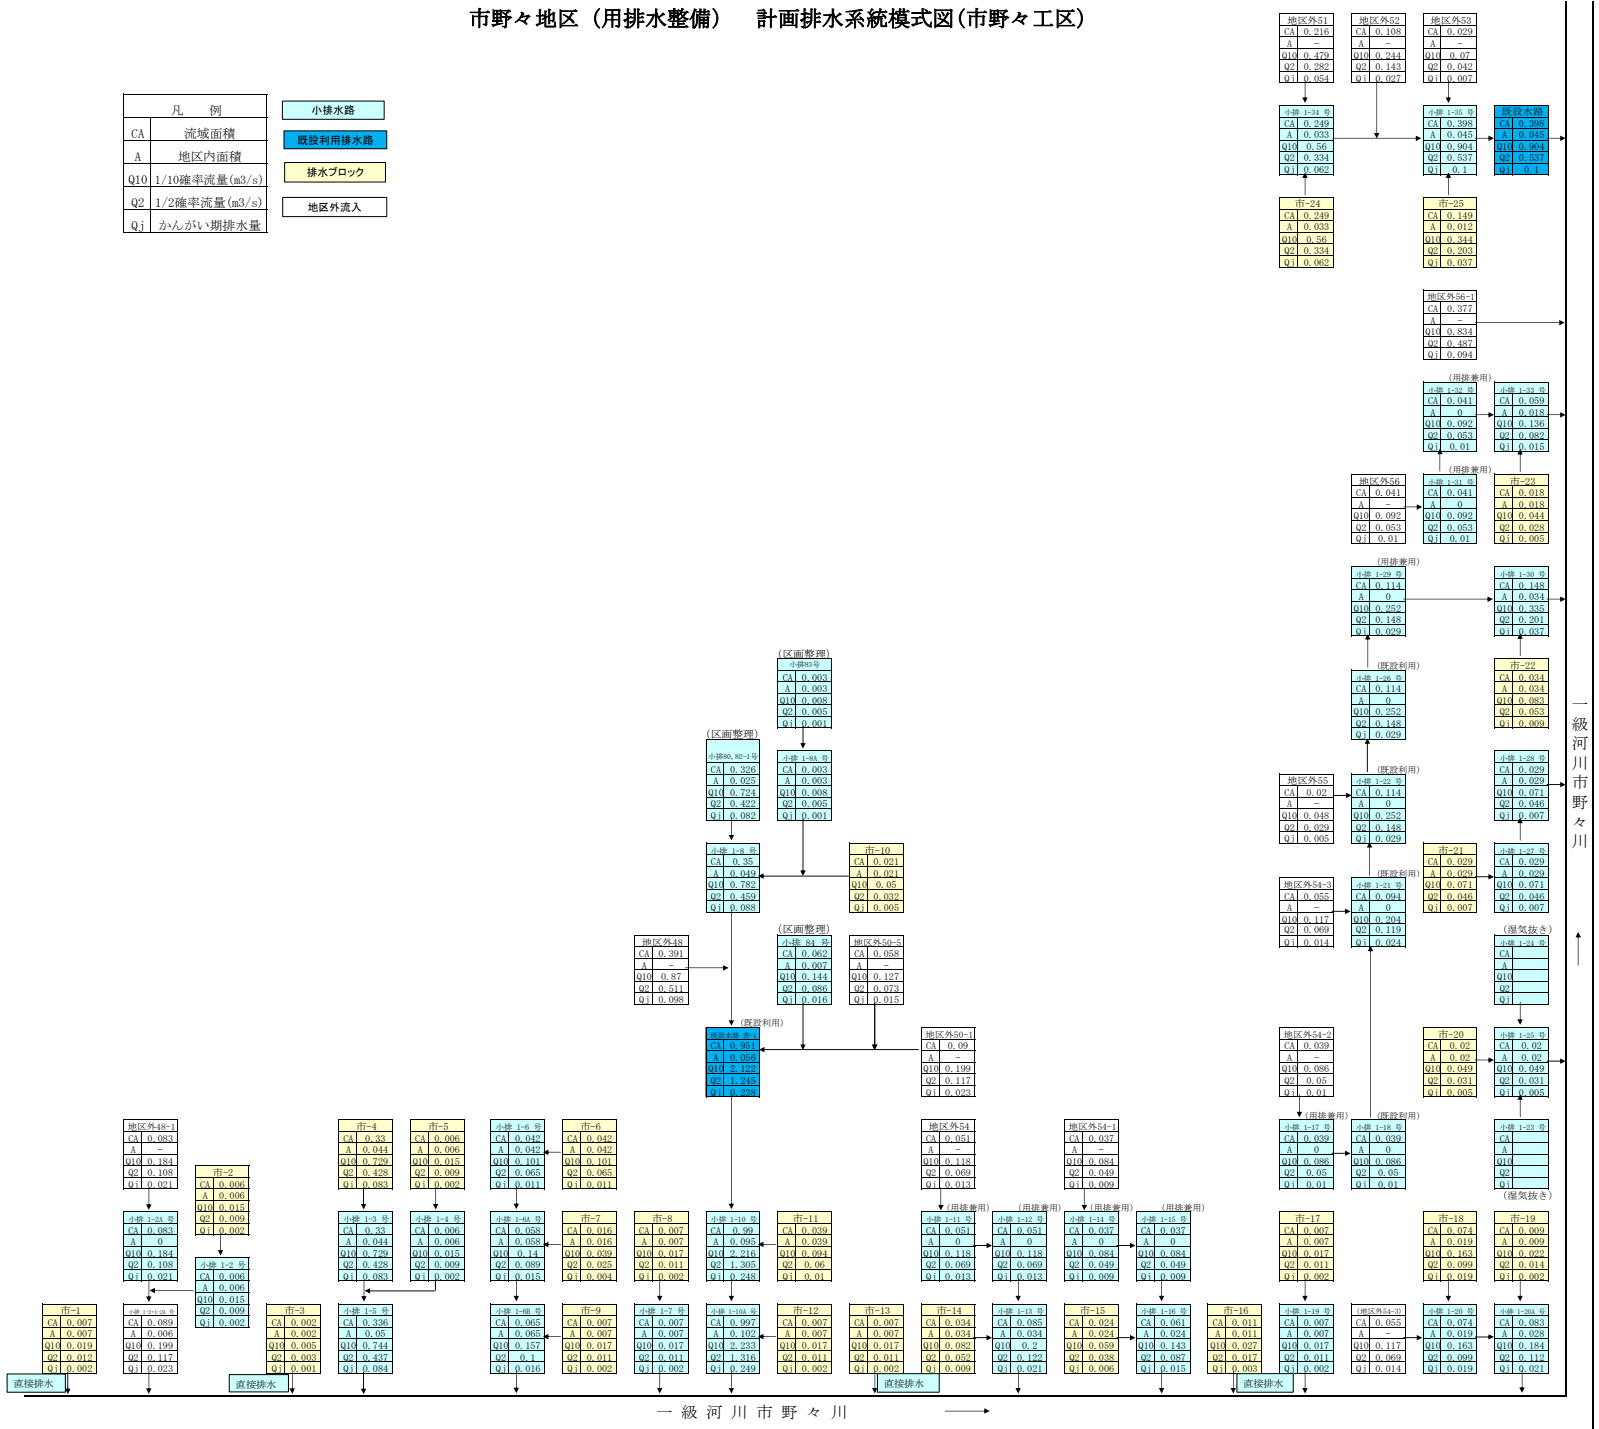

一級河川市野々川

市野々川

上段: 変更後
下段: 変更前

4. 計画排水量

(第11表-1)

項目 排水 系統名	受益面積 (ha)			流域面積 (km ²)		基準 雨量 (mm)	降 雨 に よ る 直接単位流出量 (m ³ /s/km ²)		基底流出量 (m ³ /s/km ²)		全排水量 (m ³ /s)			単位排水量 (m ³ /s/km ²)		備 考
	事 業 名						山地	平地	山地	平地	山地	平 地		山地	平地	
	用排水整備		計	自然排水	機械排水											
久保川	〃 36.3		〃 36.3	〃 0.087	〃 0.475	〃 73.1mm/4hr	1/10確率 〃 2.19	〃 1.458～ 3.3		〃 0.20	〃 0.190	〃 1.136	〃 －	1/10確率 〃 2.19	〃 1.458～ 3.3	
市野々川	39.3 39.4		39.3 39.4	〃 0.609	〃 0.546	〃 〃	〃 〃	〃 〃		〃 〃	〃 1.332	〃 1.324	〃 －	〃 〃	〃 〃	
計	75.6 75.7		75.6 75.7	〃 0.696	〃 1.021						〃 1.522	〃 2.460	〃 －			

上段: 変更後
下段: 変更前

5. 排水対策

(1) 排水水門 該当なし

(2) 排水機 該当なし

(3) 排水路

(第11表-4)

項 目 名 称	流域面積 (km ²)	受 益 面 積 (ha)			計画排水量 (m ³ /s)	延 長 (km)	構 造	排 水 本 川			備 考
		事 業 名						名 称	計画洪水量 (m ³ /s)	計画洪水位 (m)	
		区画整理		計							
小排水路	〃 0.562	〃 36.3		〃 36.3	〃 1.326	4.017 3.943	〃 排水リウム	〃 久保川	〃 -	〃 -	
	〃 1.155	39.3 39.4		39.3 39.4	〃 2.656	3.681 3.614	〃 排水リウム	〃 市野々川	〃 -	〃 -	
計	〃 1.717	75.6 75.7		75.6 75.7	〃 3.982	7.698 7.557					

(4) その他 〃
該当なし

6. 湛水検討 〃
該当なし

第 5 節 道路計画

1. 道路及び索道

(1) 道路

//
該当なし

(第 1 2 表－ 1)

項 目 路線名	幅(有効)×延長 (m) (km)	構 造	既設道路との関係	備 考
計				

(2) 索道

//
該当なし

2. 路線配置図

//
該当なし

路線配置図

//
該当なし

上段: 変更後
下段: 変更前

第6節 農用地造成計画

”
該当なし

第7節 洪水調節計画

”
該当なし

第8節 干拓計画

”
該当なし

第9節 農用地整備計画

上段: 変更後
下段: 変更前

1. 区画整理

(1) 区画の形状

//
該当なし

(第16表-1)

長辺×短辺 (m)	区画面積 (ha)	全体面積 (ha)	割合 (%)	田面差 (m)	備考
計					

(2) 表土扱い

//
該当なし

(第16表-2)

面積 (ha)	表土扱い要否の理由	扱い深 (cm)	土量 (m3)	備考

(3) 末端道水路配置図

//
別紙のとおり

上段: 変更後
下段: 変更前

2. 暗渠排水

(1) 暗渠排水

//
該当なし

(第16表-3-1)

項 目 区 分	面 積 (ha)			土壌統(区)名	基準雨量 (mm/日)	単位排水量 ($\frac{l}{s}$ /ha)	計画後の地下水位 (m)	集水渠出口下の 排 水 方 式	備 考
	事 業 名								
	区画整理		計						
計									

3. 客 土

//
該当なし

4. 農 地 保 全

//
該当なし

第10節 老朽ため池改修計画

//
該当なし

第5章 主要工事計画

上段: 変更後
下段: 変更前

第1節 用水施設

1. 貯水池 //
2. 頭首工 //
3. 揚水機 //

(第17表-3)

項目 名称	位置	揚水量 (m ³ /s)	揚程		揚水機			原動機			備考
			全揚程 (m)	実揚程 (m)	型式	口径 (mm)	台数 (台)	型式	動力 (kw)	台数 (台)	

上段:変更後
下段:変更前

4. 用 水 路

(第17表-4)

水路名	かんがい面積 (ha)			通水量 (m ³ /s)	延 長 (km)			構 造	勾 配	主要構造物	備 考
	事 業 名				開渠	トンネル その他	計				
	用排水整備	(地区外)	計								
用水路工	75.6		75.6	0.001～0.145	13.603	—	13.603	〃		〃	
	75.7		75.7	0.001～0.146	13.455	—	13.455	BF300～600		取水工	
計	75.6 75.7		75.6 75.7		13.603 13.455	— —	13.603 13.455				

5. その他かんがい施設

〃
該当なし

第2節 排水施設

1. 排水水門 //

2. 排水機 //

3. 排水路

(第18表-3)

項 目 水路名	受 益 面 積 (ha)			排水量 (m ³ /s)	延 長 (km)			構 造	勾 配	主要構造物	備 考
	事 業 名				開水路	トンネル その他	計				
	用排水整備		計								
排水路工	75.6 75.7		75.6 75.7	// 0.005～2.229	7.698 7.557		7.698 7.557	// HF300×300 1100×900 ～1500×900	// 1/150～ 1/500	// 水槽工	
計	75.6 75.7		75.6 75.7		7.698 7.557		7.698 7.557				

4. その他排水施設 //

該当なし

第3節 道路及び索道

1. 道 路

(1) 道路の総括表

//
該当なし

(第19表-1)

項 目 区 分	路 線 名	幅 (有効) × 延長 (m) (km)	構 造	付 帯 構 造 物			最 急 勾 配 (%)	同左の 延 長 (m)	最小曲線 半 径 (m)	備 考
				名 称	構 造	数 量 (箇所)				
計										

(2) 道路主要構造物

//
該当なし

2. 索 道

//
該当なし

第4節 農用地造成

”
該当なし

上段:変更後
下段:変更前

第5節 洪水調節施設

”
該当なし

第6節 干拓施設

”
該当なし

第7節 農用地整備施設

1. 区画整理

〃
(1) 区画整理 該当なし

(第23表-1)

工 区 名	面 積 (ha)	整 地 工		表 土 扱 い		備 考
		標 準 区 画	土 量 (m ³)	面 積 (ha)	土 量 (m ³)	

2. 暗渠排水

〃
(1) 暗渠排水 該当なし

(第23表-2)

項 目 区 分	面 積 (ha)			集 水 渠				吸 水 渠						集水渠出口以下の排水施設			備 考
	事 業 名			勾配	管種	管径 (mm)	延長 (m/ha)	勾配	管種	管径 (mm)	深さ (m)	間隔 (m)	延長 (m/ha)	名称	構造	数量 (m/ha)	
	区画整理		計														
計																	

〃
3. 客 土 該当なし

〃
4. 除 礫 該当なし

〃
5. 農地保全 該当なし

第8節 老朽ため池改修施設 〃
該当なし

第6章 付 帯 工 事 計 画

//
該当なし

第7章 工事の着手及び完了の予定時期

着 手	平成	// 25	年度
完 了	令和	7 5	年度

第8章 環境との調和への配慮

//
本地区は、昭和50年代に団体営土地改良事業により区画整理済みの区域であり、特に希少野生動植物は確認されていないが、工事の際、希少野生動植物が確認された場合は、施工前に生息可能な場所に移植等を行い、生態系や景観に配慮した計画とする。

第9章 換地計画の概要

上段:変更後
下段:変更前

第1節 換地計画を作成する上での基本的な考え方

//
該当なし

第2節 換地区の設定

1. 換地区の名称、所在、面積 // 該当なし

(第25表-1)

換地区名	換地区の所在	面積 (ha)
計		

2. 換地区を設定する理由 // 該当なし

第3節 換地計画樹立の基本方針

1. 従前の土地の地積の基準 〃
該当なし (第25表-2)

換地区名	地 積 の 基 準

上段:変更後
下段:変更前

2. 用途別予定地積 該当なし

(単位: ha) (第25表-3)

換地区名	用途 (取得 予定者) 前後	非農用地区域外に換地する土地											非農用地区域に換地する土地											機能交換に係る土地				一般 国 公 有 地	総 合 計		
		田	畑	山林・ 原野	その他	通常事業施工地域に 含める土地（令第 1条の（ ）書き			計	本事業によって生ず る土地改良施設用地			創 設 農 用 地	合 計	特定用途用地			異 種 目 換 地	創設非農用地					合 計	国	県	市 町 村 他			合 計	
						土地 改良 施設	その他	小 計		改良 区	その他	小 計			宅 地	その他	計		農 業 生 活 上 の 経 営 に 必 要 な 施 設 用 地	公用・ 公共用 施設 用地	宅 地 等	計									
	従前の土地																														
	換地																														
	従前の土地																														
	換地																														
	従前の土地																														
	換地																														
	従前の土地																														
	換地																														
	従前の土地																														
	換地																														
合計	従前の土地																														
	換地																														

上段: 変更後
下段: 変更前

3. 農用地集団化の方針

//
該当なし

(第25表-4)

区分 換地区名	地帯別、グループ別団地の設定	個人別換地の方法		
		位置の選択方法	1戸当たり目標団地数	区画畦畔の取扱い

4. 非農用地換地の方法

//
該当なし

(第25表-5)

区分 地区名	用途	非農用地区域の位置の概略	面積(m ²)	換地の手法	換地取得予定者	その他

第4節 土地の評価及び清算の方法

1. 評価の方法

//
該当なし

2. 清算の方法

//
該当なし

第5節 換地計画樹立の年度計画

//
該当なし

(第25表-6)

区 分 換地区名	一時利用地の 指定予定年度	換地計画の 決定予定年度	換地処分 予定年度	備 考

第6節 換地処分の時期に関する特則

//
該当なし

上段: 変更後
下段: 変更前

第10章 事業費の総額及び内訳

単位: 千円

事業区分	事業費		資金計画			
			国費	県費	市町村費	受益者負担
用排水整備	純工事費	813,000 720,000	447,150 396,000 (55%)	243,900 216,000 (30%)	81,300 72,000 (10%)	40,650 36,000 (5%)
	測量試験費	110,000 75,000	60,500 41,250 (55%)	33,000 22,500 (30%)	11,000 7,500 (10%)	5,500 3,750 (5%)
	用地買収補償	9,000 15,000	4,950 8,250 (55%)	2,700 4,500 (30%)	900 1,500 (10%)	450 750 (5%)
	換地費					
	工事雑費	〃 —		〃 —		
	計	932,000 810,000	512,600 445,500	279,600 243,000	93,200 81,000	46,600 40,500
	事務費	〃 —		〃 —		
	総事業費	932,000 810,000	512,600 445,500	279,600 243,000	93,200 81,000	46,600 40,500

第11章 効 用

単位: 千円

事業区分	項目 区分	年総効果(便益)額	年増加農業所得額	備考
用排水整備	作物生産効果	32,303 25,938		
	営農経費節減効果	25,642 19,006	40,700 24,755	
	維持管理費節減効果	△ 2,037 △ 1,552	18 △ 45	
	国産農産物安定供給効果	7,030 3,544		
	計	62,938 46,936	40,718 24,710	総費用総便益比 1.57 1.49

第12章 関 連 す る 事 業

上段:変更後
下段:変更前

//
該当なし

(第28表)

区 分	事 業 名	事 業 主 体	受 益 面 積 (ha)	事 業 内 容

第13章 現況・計画図面

上段:変更後
下段:変更前



- | | |
|------------|-----------|
| 1. 位置図 | 〃
別途添付 |
| 2. 現況計画平面図 | 〃
別途添付 |
| 3. 土地利用計画図 | 〃
別途添付 |
| 4. 主要構造図 | 〃
別途添付 |

令和6年度計画変更

中山間地域総合整備事業〔集落型事業（生産基盤型事業）〕

岩手県 市野々地区 計画一般図


S=1:25,000

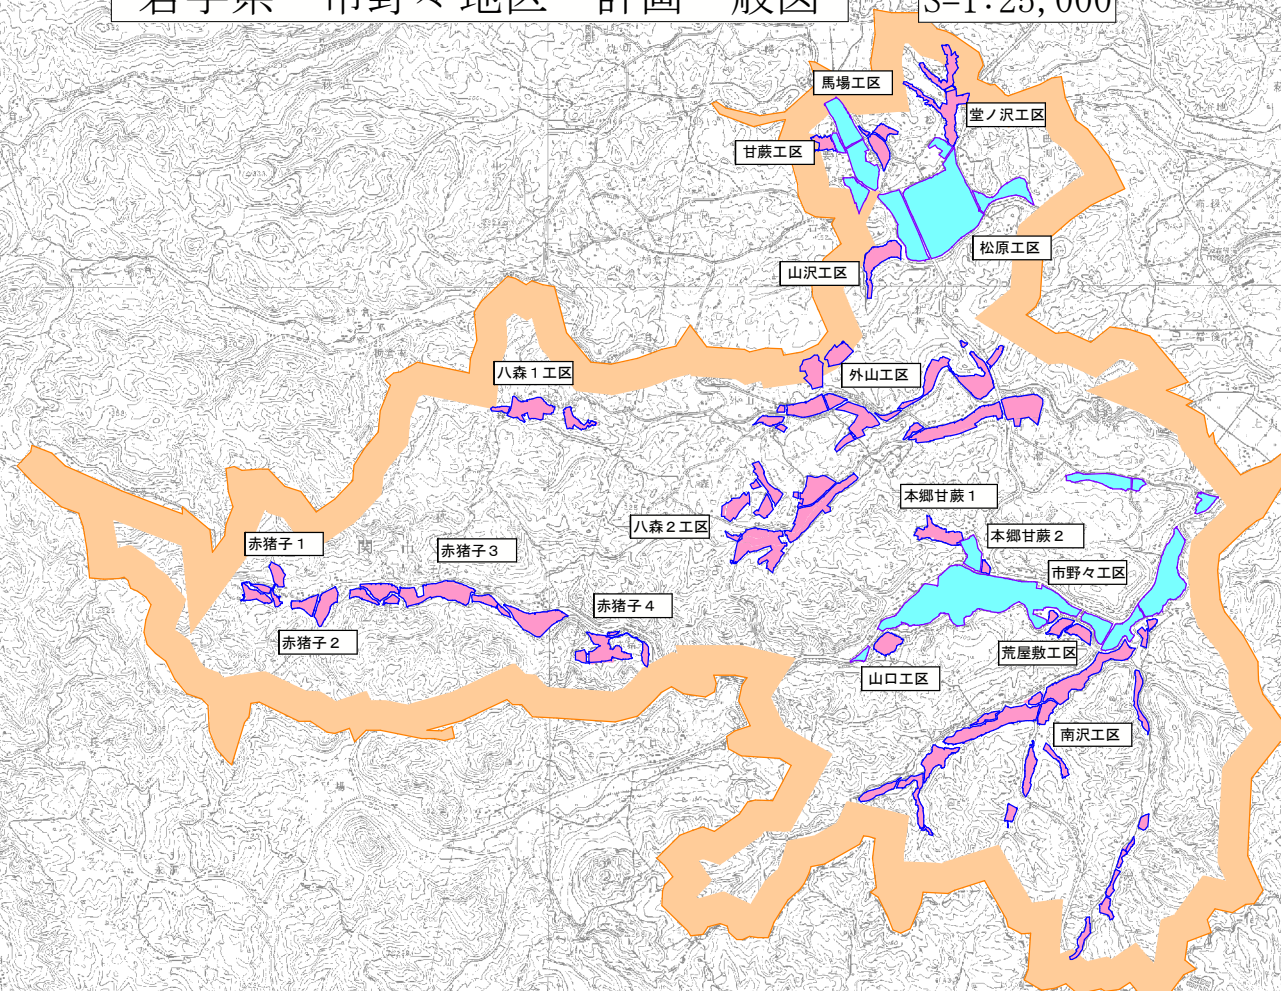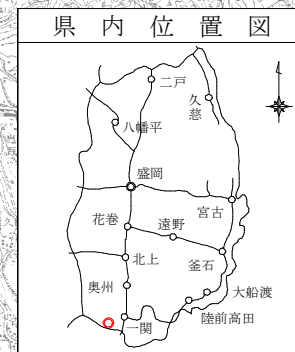

上段：変更後
下段：変更前

凡 例		
	区画整理	〃 A=86.5ha
	用排水整備	A=75.6ha A=75.7ha
	事業計画区域	〃 A=589.4ha


中山間地域総合整備事業〔集落型事業（生産基盤型事業）〕
市野々地区 計画平面図（用排水整備）（変更後） S=1:2,500



凡 例	
	一定区域（区画整理）
	一定区域（用排水整備）
	用水路（オープン水路）
	用水既設利用
→	用水流下方向
→	排水路
→	排水既設利用
→	排水流下方向
⊙	ため池（整備対象外）
⊙	ポンプ
⊙	取水工（既設）

市野々工区	
図 面 の 名 称	図 面 番 号
中山間地域総合整備事業〔集落型事業（生産基盤型事業）〕	3-2-1
市野々地区 計画平面図（用排水整備）	3-2-2
測 量	平 成 年 月 日 終 了
設 計	
監 査 官	
図 解 説	



中山間地域総合整備事業〔集落型事業（生産基盤型事業）〕
市野々地区 計画平面図（用排水整備）（変更後） S=1:2,500

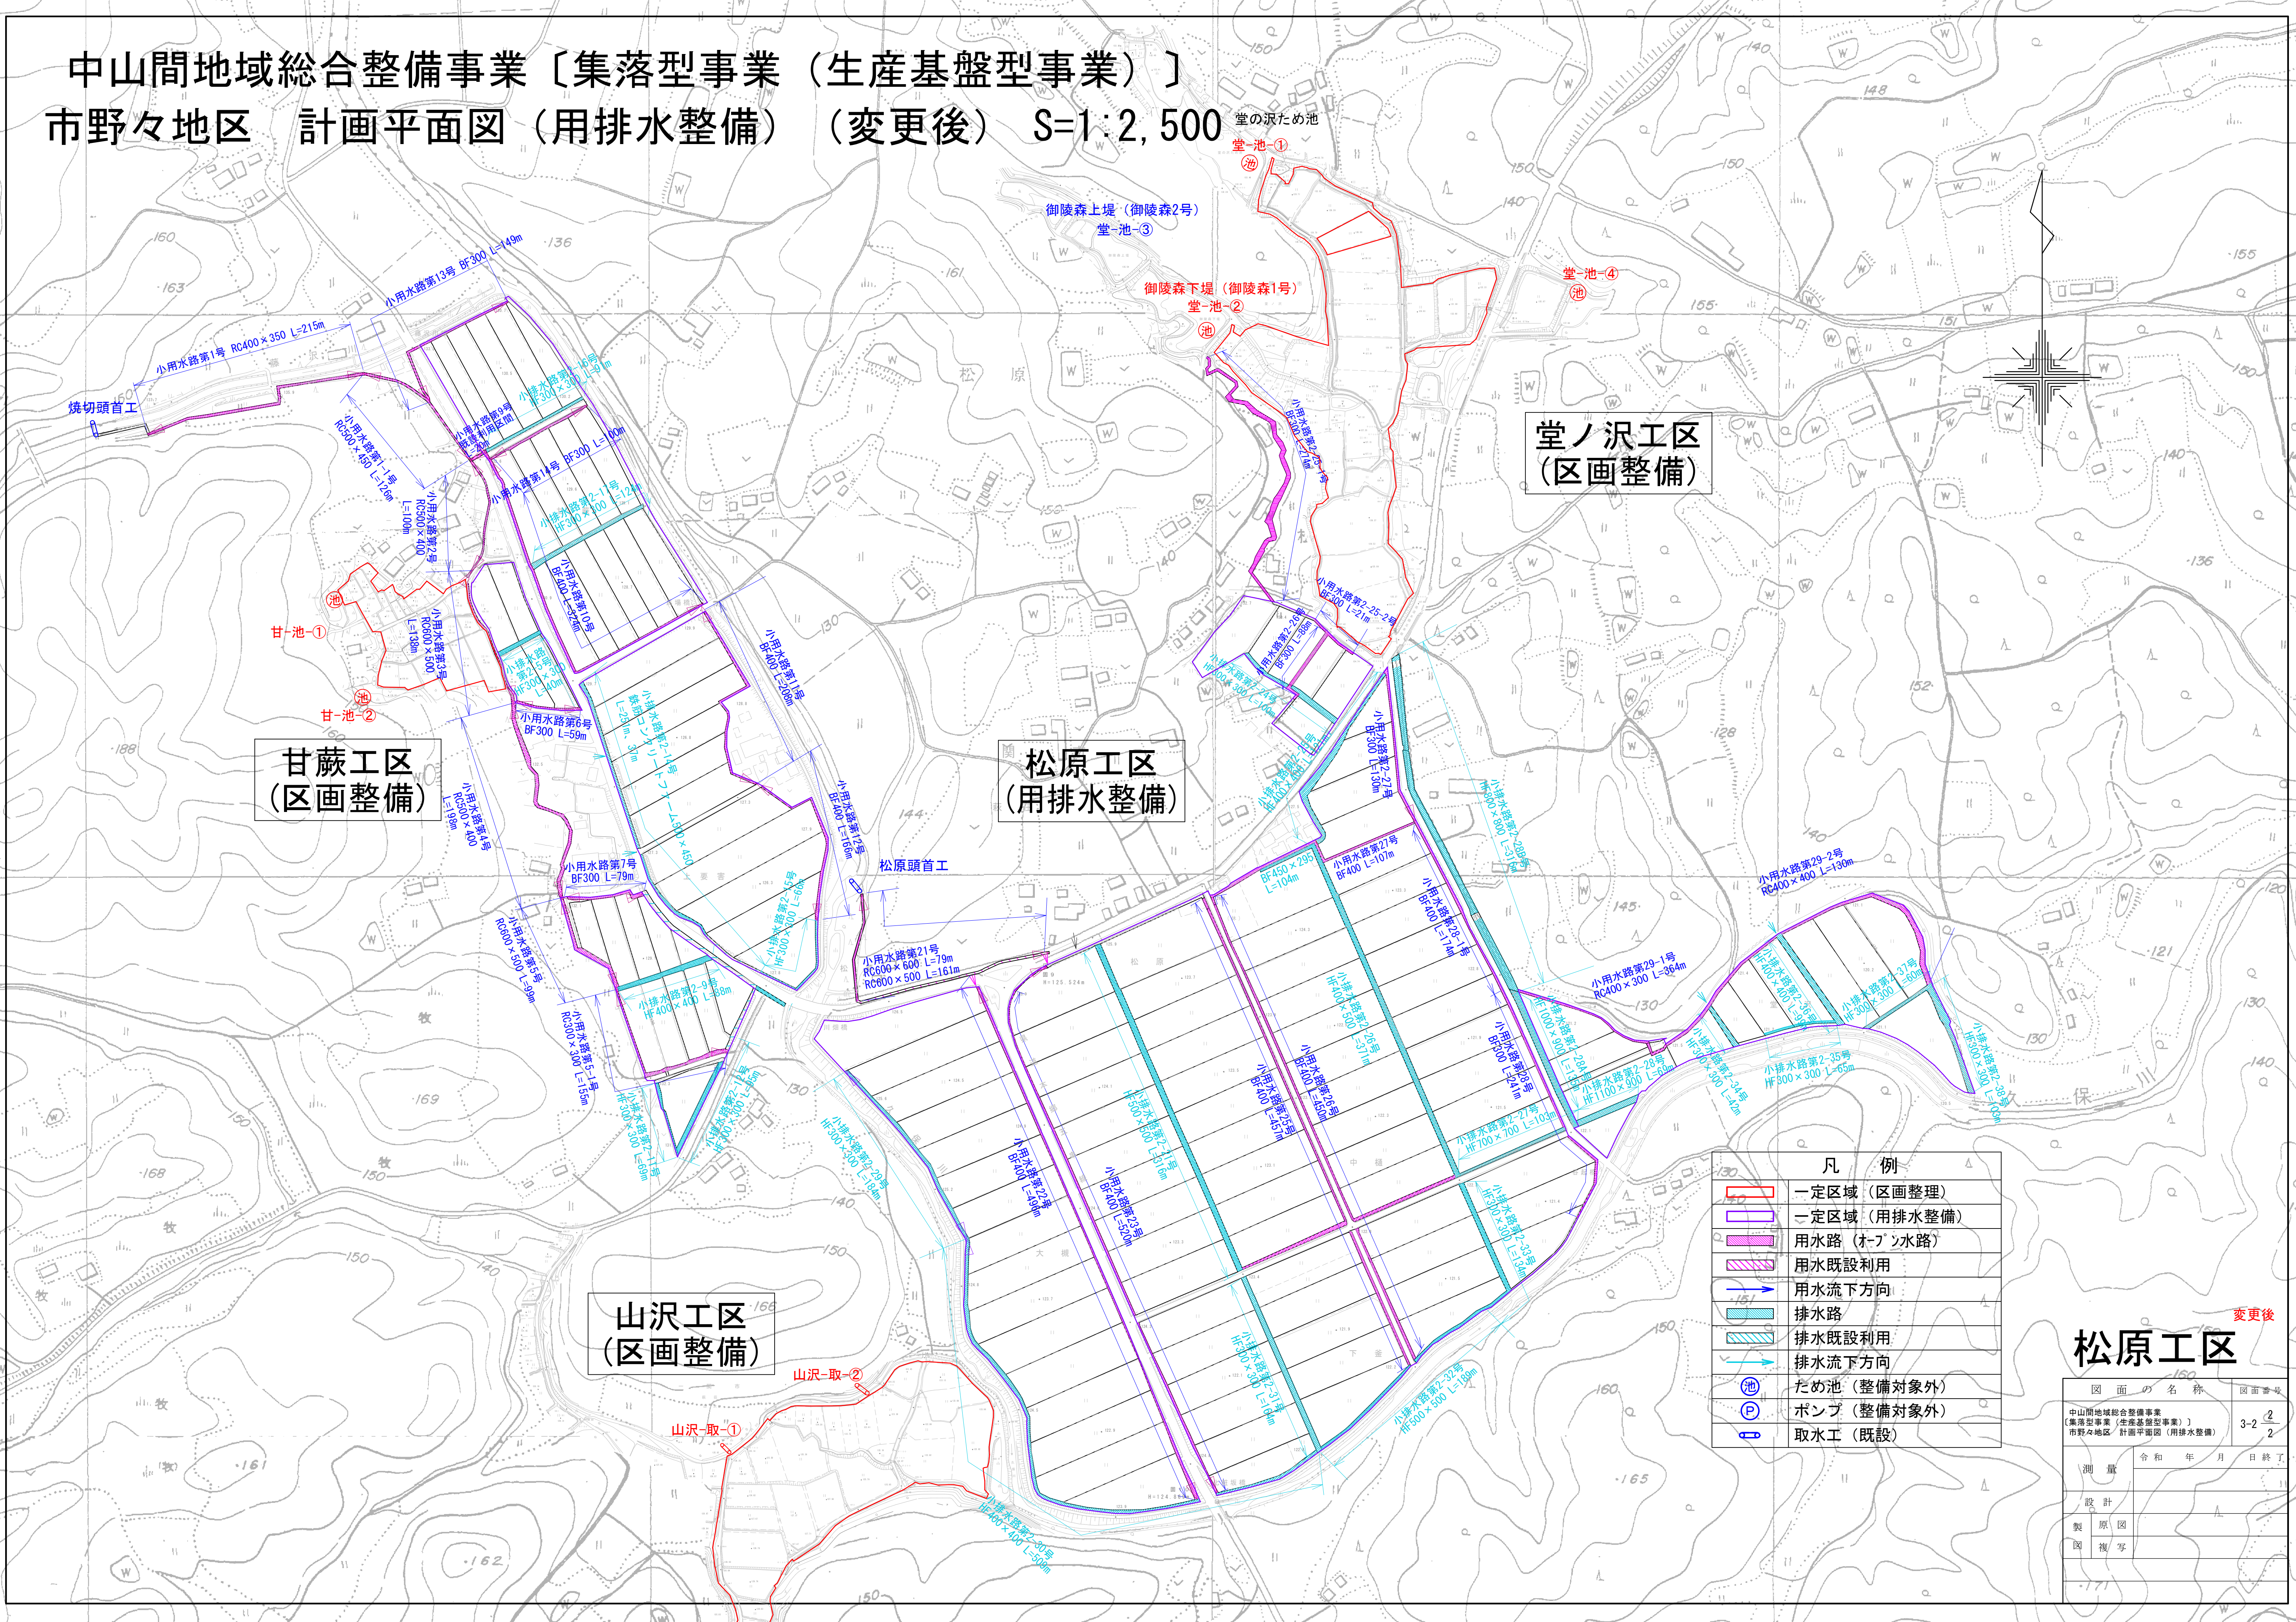

凡 例	
	一定区域（区画整理）
	一定区域（用排水整備）
	用水路（オープン水路）
	用水既設利用
	用水流下方向
	排水路
	排水既設利用
	排水流下方向
	ため池（整備対象外）
	ポンプ（整備対象外）
	取水工（既設）

松原工区	
図 面 の 名 称	図面番号
中山間地域総合整備事業 〔集落型事業（生産基盤型事業）〕 市野々地区 計画平面図（用排水整備）	3-2 ² / ₂
測 量	令和 年 月 日 終了
設 計	
製 原 図	
図 複 写	

中山間地域総合整備事業〔集落型事業（生産基盤型事業）〕
市野々地区 地区編入除外図（用排水整備） S=1:2,500
市野々工区

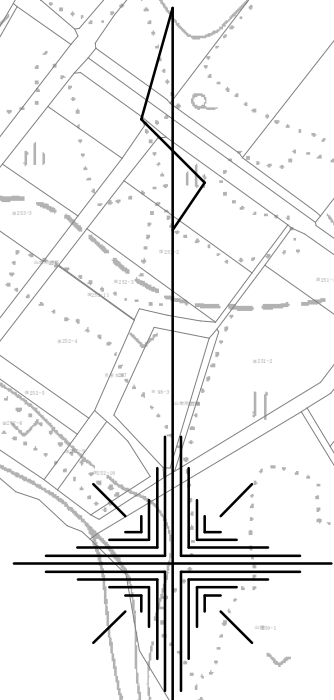


凡 例
地区除外

工区	字名	地番	地目	登記地積 (㎡) 変更前	変更後	減面積 (㎡)	備考
市野々	上本郷	453-1	田	3,241	3,131	110.17	用地買収による面積減
市野々	上本郷	454-1	田	2,691	2,644	46.76	用地買収による面積減
市野々	上本郷	455	田	2,887	2,837	49.82	用地買収による面積減
市野々	上本郷	456	田	2,816	2,778	37.59	用地買収による面積減
市野々	上本郷	457	田	2,874	2,828	46.32	用地買収による面積減
市野々	上本郷	458	田	2,626	2,573	53.36	用地買収による面積減
市野々	上本郷	465	田	4,148	4,047	100.77	用地買収による面積減
市野々	上本郷	466-1	田	1,658	1,496	161.85	用地買収による面積減
			計			606.64	

市野々工区

図 面 の 名 称	図 面 番 号
中山間地域総合整備事業 〔集落型事業（生産基盤型事業）〕 市野々地区 地区編入除外図（用排水整備）	1
	2
測 量	合 和 年 月 日 終 了
設 計	
監 査	
製 図	
校 査	

中山間地域総合整備事業〔集落型事業（生産基盤型事業）〕
市野々地区 地区編入除外図（用排水整備） S=1:2,500
松原工区

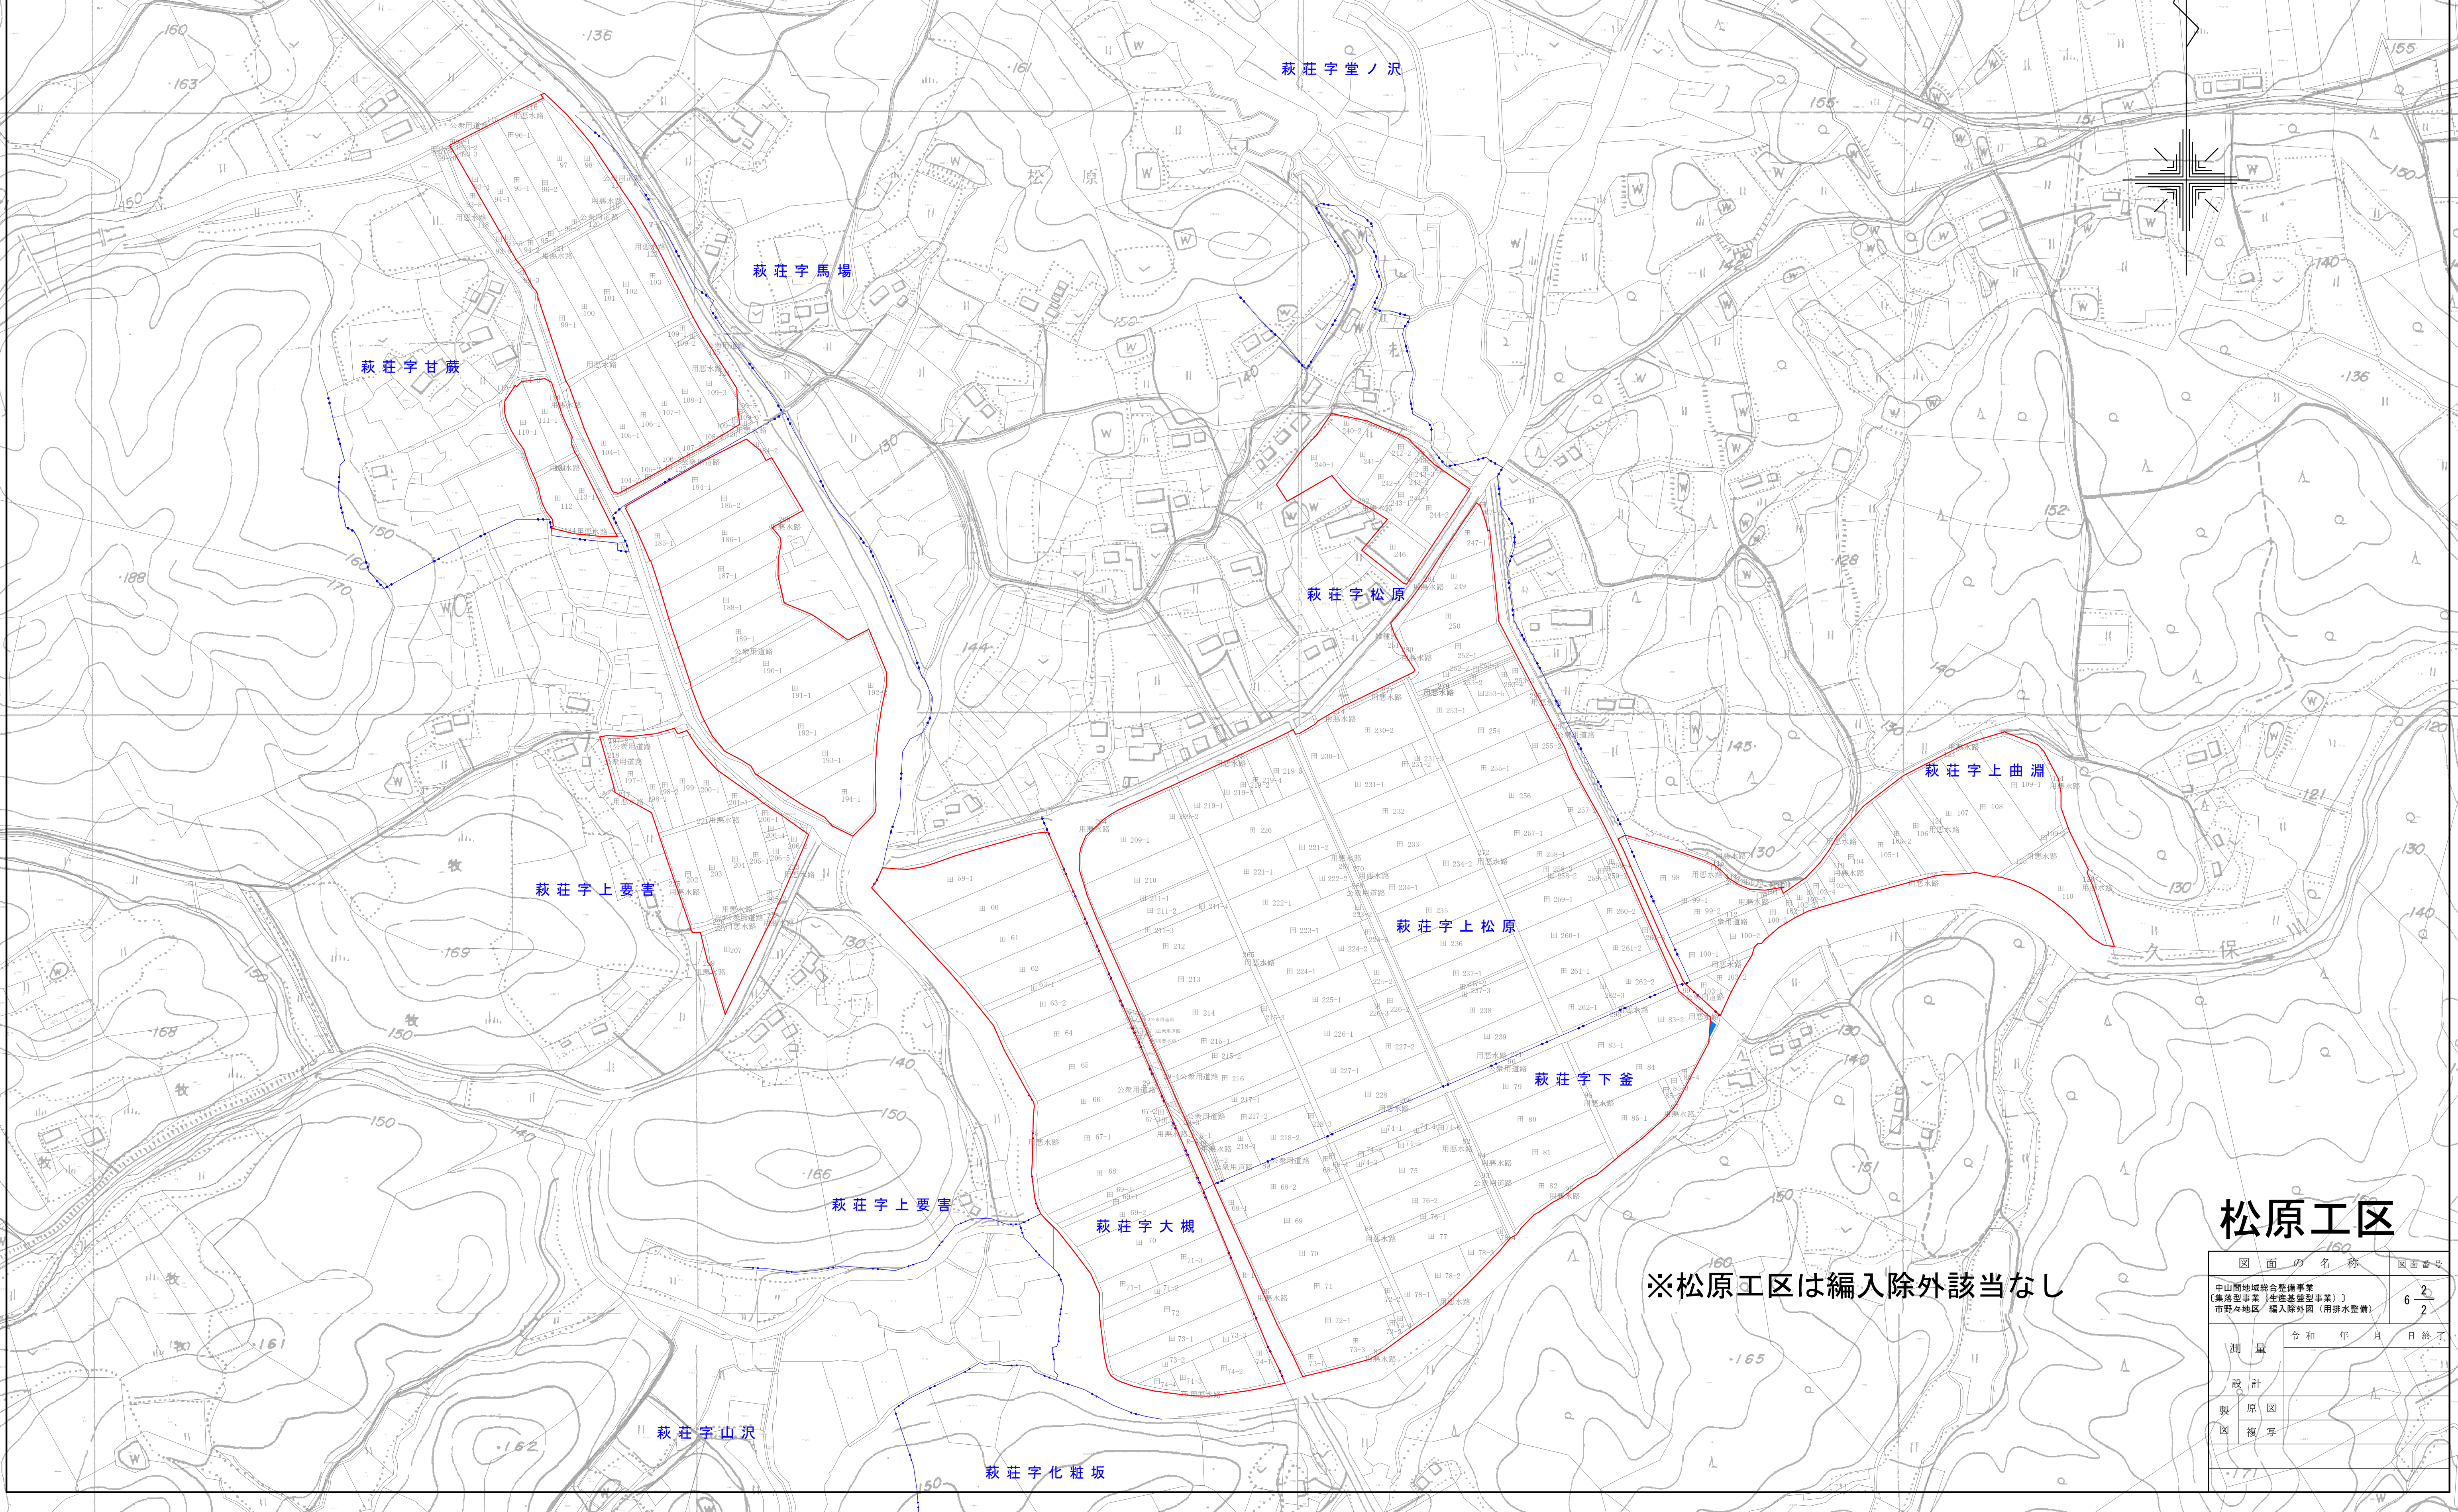

※松原工区は編入除外該当なし

図面の名称		図面番号
中山間地域総合整備事業 〔集落型事業（生産基盤型事業）〕 市野々地区 地区編入除外図（用排水整備）		2 6 2
測量	令和 年 月 日 終了	
設計		
製原図		
図複写		

岩手県 市野々地区 農振土地利用計画図

S=1:50,000

変更前後

県内位置図



市野々地区

凡 例	
—	一定区域
---	市町村界
—	農協振興地域界
—	農業地区及び用途区分界
---	地区・区域界
A	地区・区域番号
	農地
	農業用施設用地
	国有林
	保安林

