林野火災対策砂防だより

Vol.7　令和8年10月作成

前号では、合足の沢5-(1)、(2)の2箇所の新設堰堤工事の概要についてお知らせしましたが、今回お知らせするのは、「坂本の沢新設堰堤工事の概要」についてです。

坂本の沢でどんな砂防堰堤ができる？！


○ 今回は現在工事が進められている「坂本の沢」地区で**どのような工事が行われいるか**、**どこまで進んでいるのか**、**いつ完成予定なのか**についてお知らせしします。

③ 坂本の沢

工事の概要は

工　事　名：坂本の沢筋坂本地区砂防堰堤築造工事
施　工　者：株式会社佐賀組
工事の期間：令和8年2月10日～令和9年4月26日
工事の費用：260百万円
作業の内容：掘削＝3,500m3（学校プール約10杯分）
　　コンクリート＝2,400m3（学校プール約7杯分）

工事実施マップ（坂本地区）

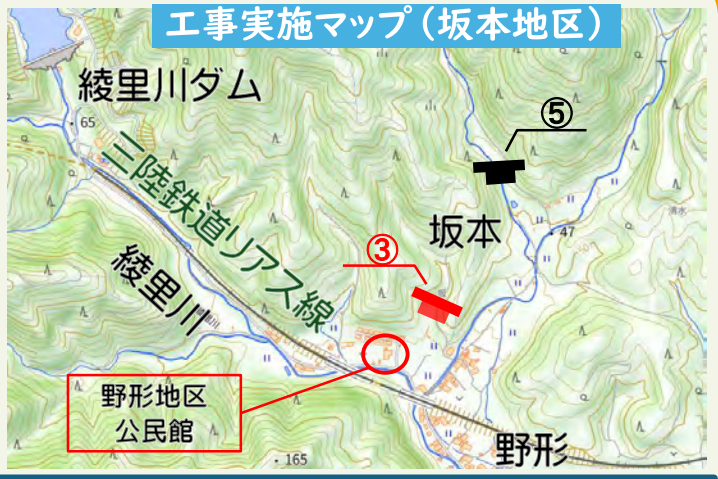

○ 今回の工事は、山火事によって大きな被害を受けた地域において、今後の土砂災害を防ぎ、地域の皆様の安全・安心を守るための重要な工事です。現場代理人として、このような復旧・防災事業に携わることに責任と使命を感じています。

○ 山火事後の現場ということで、通常の工事とは異なる環境や注意すべき点もありますが、安全を最優先に、作業員一人ひとりが危険箇所や現場状況を十分に確認しながら施工を進めていきたいと考えています。また、品質や工程についても妥協することなく、将来にわたって地域の皆様に安心していただける施設を造ることを目指します。

○ 工事期間中は、工事車両の通行や騒音などにより、地域の皆様にご不便をお掛けすることもあるかと思いますが、ご理解とご協力をいただきながら、一日も早い完成を目指してまいります。

○ 現場の進捗状況や日々の取り組みについても、砂防だよりを通じて皆様に分かりやすくお伝えしていきたいと思います。「この工事が地域の安全につながっている」と実感していただけるよう、最後まで安全第一で、責任を持って工事を進めてまいります。


現場施工者からの声
佐賀組　現場責任者
鈴木　敏明　さん



左側：現場責任者　鈴木敏明さん
右側：現場監督　千葉伶　さん


現在の工事進捗はこんな感じです。

進捗レベル

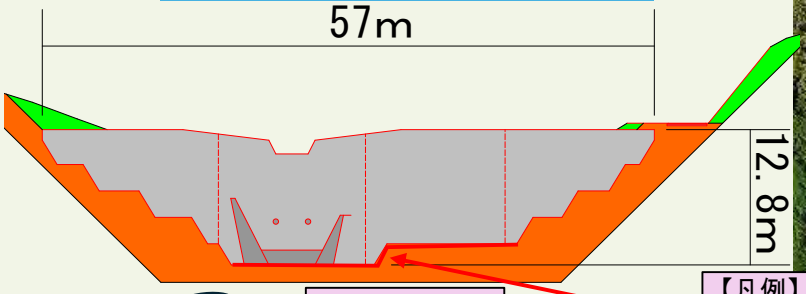

進捗率：22%

進捗状況写真

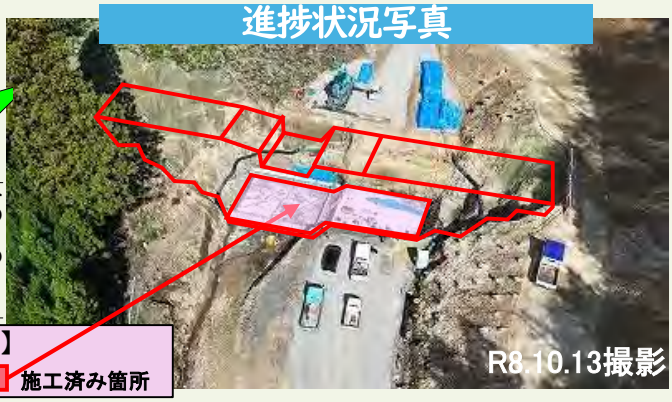

なにをしてる？

○ これまでに、堰堤場所の土砂の撤去が完了しました。

○ 現在、堰堤の基礎となる部分を平らに仕上げました。

進捗メータ	事前準備	伐採	支障木搬出	施工ヤード整備	本体掘削		本体築造			流路築造	管理用道路	後片付け	完成
坂本の沢													

～おたよりに関するお問い合わせ先～
沿岸広域振興局土木部大船渡土木センター
林野火災対策砂防チーム
【電話】0192-27-9934
【E-mail】BG0005@pref.iwate.jp

携帯・スマートフォンからはこちら

【次　回】
「災関事業どこまで進んでいる？！〈10月現在〉」
をお送りいたします。
