


単品スライドに伴う実施フロ - 及び様式

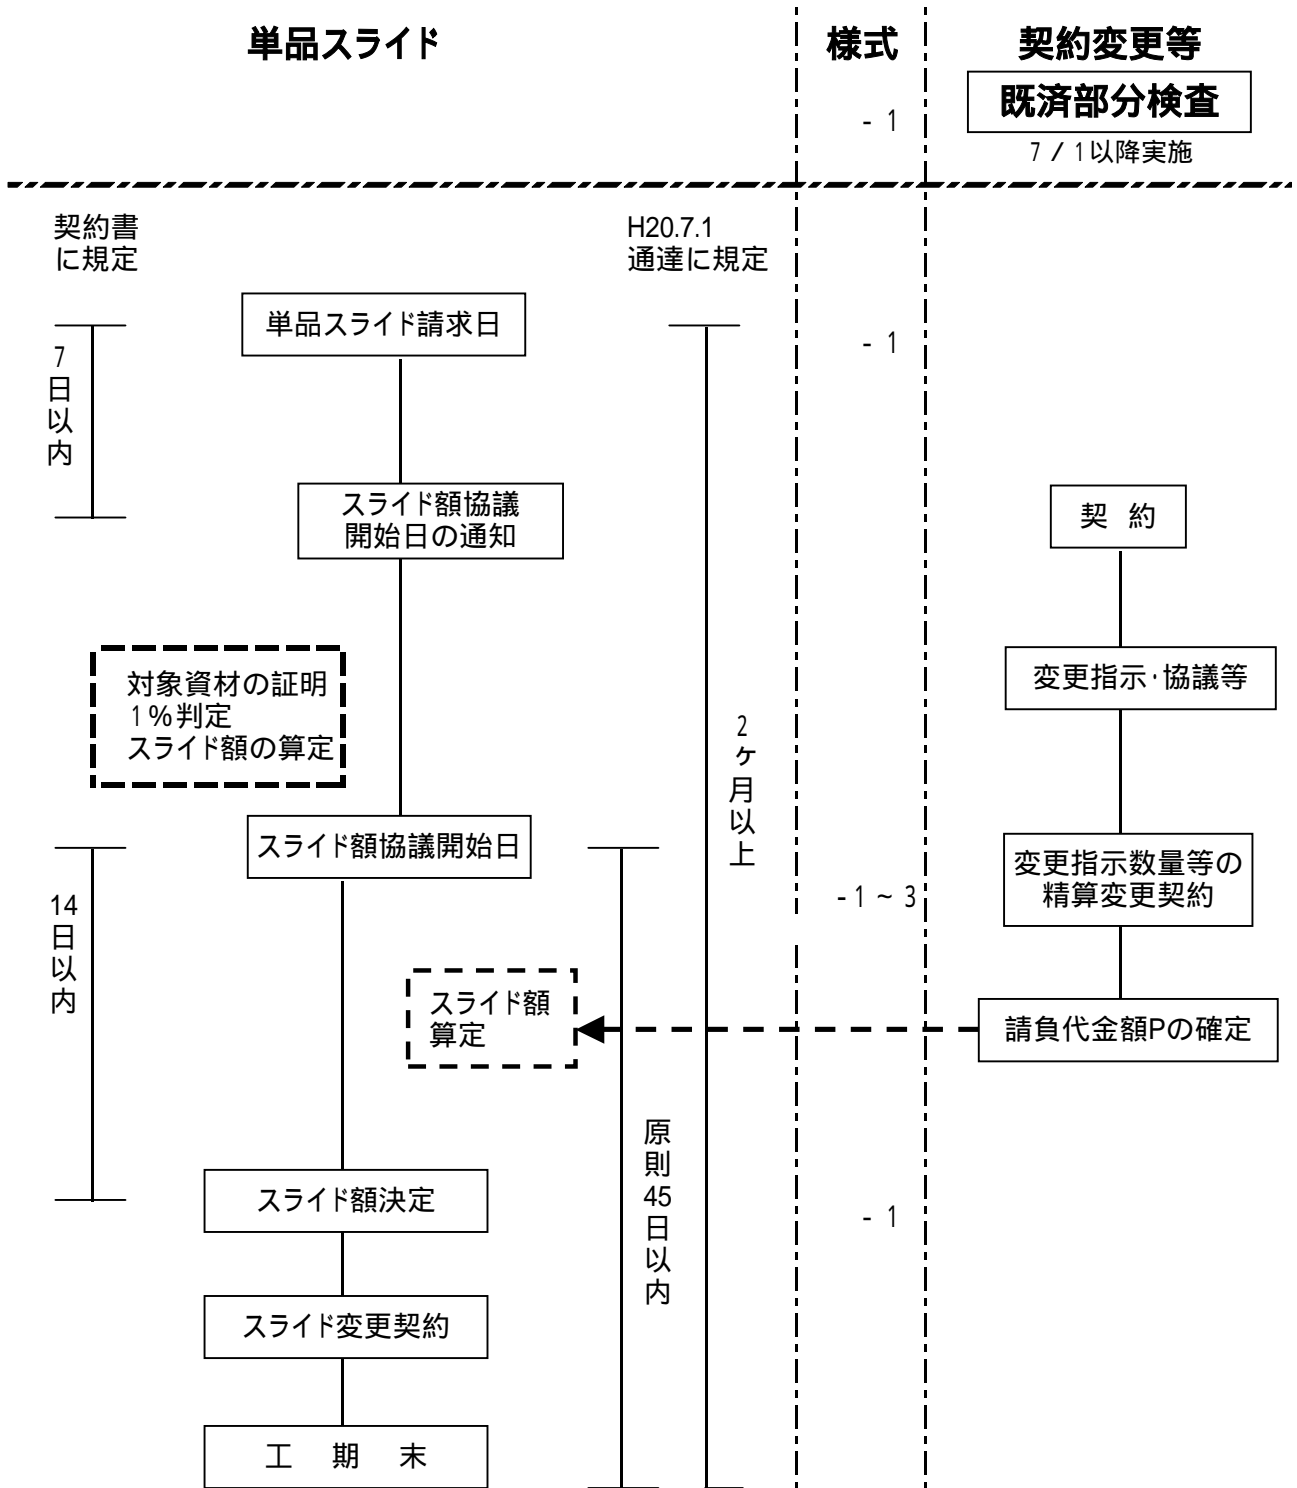

平成 年 月 日

岩手県知事 (公所長) 様

請負者 住 所
氏 名 印

岩手県営建設工事請負契約書別記第 25 条第 5 項に基づく請負代金額の変更請求について

平成 年 月 日付けをもって請負契約を締結した、下記工事について、物価の変動に伴い、工期内に主要な工事材料の価格に変更が生じたので、岩手県営建設工事請負契約書別記第 25 条第 5 項の規定に基づき請負代金額の変更を下記のとおり請求します。

記

- 1 工 事 名 工事
- 2 工 事 場 所
- 3 請負代金額 金 円
- 4 工 期 平成 年 月 日から
平成 年 月 日まで
- 5 請求する主要資材名
【請求する資材名を具体的に記載】
- 6 変更請求概算額 金 円

別紙「請負代金額変更請求概算額計算書」のとおり

参考) 請求の際には、変更請求概算額及びその概算計算書を作成し、提出すること。なお、今回の請求はあくまで概算額であり、請求の結果、請求額が変更となっても差し支えありません。

別紙 請負代金額変更請求概算計算書 (計算例)

(単価、金額は税抜き)

工種	種別	細別	資材名	規格	単位	変動前資材価格			適用開始日以前の出来高		変動後資材価格			摘要
						数量	単価	金額 = ×	数量	金額 = ×	数量 = -	単価	金額 = ×	
[鋼材類]														
防護柵工														
	防護柵工													
		ガードレール工						550,400		0			699,180	
		ガードレール	Gr-C-4E	m	172	3,200	550,400	0	0	172	4,065	699,180		
橋梁下部工														
	橋梁下部工							8,764,642		1,726,436			10,191,246	
		鉄筋工	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295A D13	t	3,411	51,800	176,689	1	51,800	2,411	76,333	184,038	
		"	"	SD345A D10	"	0,041	55,000	2,255	0	0	0,041	82,400	3,378	
		"	"	SD345A D13	"	0,917	53,000	48,601	0	0	0,917	76,500	70,150	
		"	"	SD345A D16-25	"	90,836	51,000	4,632,636	32,836	1,674,636	58,000	76,379	4,429,982	
		"	"	SD345A D29-32	"	22,320	52,000	1,160,640	0	0	22,320	77,826	1,737,076	
		"	"	SD345A D38	"	28,562	55,700	1,590,903	0	0	28,562	86,666	2,475,354	
		"	鉄筋金網 (SD295)	D6 × 150 × 150	m2	3,843.060	300	1,152,918	0	0	3,843.060	336	1,291,268	
合計額								9,315,042		1,726,436			10,890,426	

変動対象数量の当初価格計 = (-) × 消費税率
(9,315,042 - 1,726,436) × 1.05
= 7,968,036

変動対象資材価格計 = × 消費税率
10,890,426 × 1.05
= 11,434,947

部分払い請負額 = 25,212,600

鋼材類の変動額 = - = 3,466,911
請負額1% = (159,999,000 - 25,212,600) × 1% = 1,347,864
鋼材類に関して、変動額が請負額の1%以上のため協議対象

スライド額 = - = 2,119,047 円

(単価、金額は税抜き)

工種	種別	細別	資材名	規格	単位	変動前資材価格			適用開始日以前の出来高		変動後資材価格			摘要
						数量	単価	金額 = ×	数量	金額 = ×	数量 = -	単価	金額 = ×	
[燃料油]														
燃料油														
	燃料油							2,622,180		416,575			2,552,470	
		軽油	1.2号	リットル	27,434	95	2,606,230	4,385	416,575	23,049	110	2,535,390		
		ガソリン	レギュラー	リットル	145	110	15,950	23		122	140	17,080		
合計額								2,622,180		416,575			2,552,470	

変動対象数量の当初価格計 = (-) × 消費税率
(2,622,180 - 416,575) × 1.05
= 2,315,885

変動対象資材価格計 = × 消費税率
2,552,470 × 1.05
= 2,680,093

部分払い額 = 25,212,600

燃料油の変動額 = - = 364,208
請負額1% = (159,999,000 - 25,212,600) × 1% = 1,347,864
燃料油に関して、変動額が請負額の1%未満のため協議対象外。

別紙 内訳表 (計算例)
 < 請負者側の積算 >

部分払い済みにつき、算定額の対象外

品目	規格	H19年9月	H20年2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	4月以降の合計 (部分払い以降数量、 金額)	数量比較		購入価格	
														請負者 購入数量	比較設計数量	スライド単価 (加重平均) p'	M変更鋼
ガードレール	Gr-C-4E	請負者:搬入又は購入数量()				50	82	40						172 m	172 = 172		請負者購入価格
		請負者:購入単価()				3,900	4,100	4,200							D= 172		M=p' × D
		請負者:購入価格(×)	0	0	0	0	195,000	336,200	168,000	0	0	0	0	699,200 円	平均単価 = /	4,065	699,180
		購入先					〇〇商事	〇〇商事	〇〇商事								
鉄筋コンクリート用 棒鋼	SD295A D13	請負者:搬入又は購入数量()		1	1	2								3 t	3 > 2,411		注2スライド単価(3)により「購入数量-設計数量」 のため、設計数量を申請数量で割り、請負者の購入 価格に乘じる(2,411/3=229000) M = p' × D
		請負者:購入単価()				71,000	79,000								D= 2,411		
		請負者:購入価格(×)	0	0	0	71,000	158,000	0	0	0	0	0	0	229,000 円	平均単価 = /	76,333	184,038
		購入先				〇〇商事	〇〇商事										
鉄筋コンクリート用 棒鋼	SD345A D10	請負者:搬入又は購入数量()				0.041								0.041 t	0.041 = 0.041		請負者購入価格
		請負者:購入単価()				76,000	82,400								D= 0.041		M=p' × D
		請負者:購入価格(×)	0	0	0	0	3,378	0	0	0	0	0	0	3,378 円	平均単価 = /	82,400	3,378
		購入先					〇〇商事										
鉄筋コンクリート用 棒鋼	SD345A D13	請負者:搬入又は購入数量()				0.5	0.5							1 t	1.000 > 0.917		請負者購入価格
		請負者:購入単価()				73,000	80,000								D= 0.917		M=p' × D
		請負者:購入価格(×)	0	0	0	36,500	40,000	0	0	0	0	0	0	76,500 円	平均単価 = /	76,500	70,150
		購入先				〇〇商事	〇〇商事										
鉄筋コンクリート用 棒鋼	SD345A D16-25	請負者:搬入又は購入数量()		30	30	28								58 t	58 < 60.836		注2スライド単価(3)により「購入数量-設計数量」 のため、請負者の購入価格 M=p' × D
		請負者:購入単価()				73,000	80,000								D= 58		
		請負者:購入価格(×)	0	0	0	2,190,000	2,240,000	0	0	0	0	0	0	4,430,000 円	平均単価 = /	76,379	4,429,982
		購入先				〇〇商事	〇〇商事										
鉄筋コンクリート用 棒鋼	SD345A D29-32	請負者:搬入又は購入数量()				10	13							23 t	23,000 > 22.32		請負者購入価格
		請負者:購入単価()				75,000	80,000								D= 22.32		M=p' × D
		請負者:購入価格(×)	0	0	0	750,000	1,040,000	0	0	0	0	0	0	1,790,000 円	平均単価 = /	77,826	1,737,076
		購入先				〇〇商事	〇〇商事										
鉄筋コンクリート用 棒鋼	SD345A D38	請負者:搬入又は購入数量()				10	20							30 t	30,000 > 28.562		請負者購入価格
		請負者:購入単価()				80,000	90,000								D= 28.562		M=p' × D
		請負者:購入価格(×)	0	0	0	800,000	1,800,000	0	0	0	0	0	0	2,600,000 円	平均単価 = /	86,666	2,475,354
		購入先				〇〇商事	〇〇商事										
鉄筋金網(SD295)	D6 × 150 × 150	請負者:搬入又は購入数量()				1000	1000	1000	900					3,900 m2	3,900,000 > 3,843.06		請負者購入価格
		請負者:購入単価()				330	330	330	360						D= 3,843.06		M=p' × D
		請負者:購入価格(×)	0	0	0	330,000	330,000	330,000	324,000	0	0	0	0	1,314,000 円	平均単価 = /	336	1,291,268
		購入先				〇〇商事	〇〇商事	〇〇商事	〇〇商事								

M変更鋼() = p' × D(請負者購入価格を合計) = 10,890,426 合計

(注)

1. 購入先、購入単価、購入数量等を証明出来る場合は、その資料(納品書等)を添付の上提出すること。
2. 対象材料は、品目毎および購入月毎にとりまとめるものとする。

様式第 2 号 (単品スライド用)

平成 第 年 月 号 日

(請負者名) 様

岩手県知事 (公所長)

岩手県営建設工事請負契約書別記第 25 条第 8 項に基づく協議の開始の日
について (通知)

平成 年 月 日付けで請求のあった標記に係るスライド額協議開始日について
は、岩手県営建設工事請負契約書別記第 25 条第 8 項の規定に基づき通知します。

記

- 1 工 事 名 工 事
- 2 工 事 場 所
- 3 . スライド額協議開始日 平成 年 月 日

参考) 請求者からの請求日から 7 日以降に工期延長を想定している場合は、「工
期末の 45 日前」と記載する。

様式第3号(単品スライド用)

平成 年 月 日

岩手県知事 (公所長) 様

請負者 住 所
氏 名 印

請負代金額の変更について(協議)

平成 年 月 日付け請求した標記について、岩手県営建設工事請負契約書別記第25条第7項の規定に基づき、下記のとおり協議します。

記

- 1 工 事 名 工事
- 2 工事場所
- 3 協 議 額 増額 円(消費税込み)
- 4 確 認 調 書 別紙「請負代金額変更請求額計算書」のとおり

別紙 請負代金額変更請求額計算書 (計算例)

(単価、金額は税抜き)

工種	種別	細別	資材名	規格	単位	変動前資材価格			適用開始日以前の出来高		変動後資材価格			摘要
						数量	単価	金額 = ×	数量	金額 = ×	数量 = -	単価	金額 = ×	
[鋼材類]														
防護柵工														
	防護柵工													
		ガードレール工						550,400		0			699,180	
		ガードレール	Gr-C-4E	m	172	3,200	550,400	0	0	172	4,065	699,180		
橋梁下部工														
	橋梁下部工							8,764,642		1,726,436			10,191,246	
		鉄筋工	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295A D13	t	3,411	51,800	176,689	1	51,800	2,411	76,333	184,038	
		"	"	SD345A D10	"	0,041	55,000	2,255	0	0	0,041	82,400	3,378	
		"	"	SD345A D13	"	0,917	53,000	48,601	0	0	0,917	76,500	70,150	
		"	"	SD345A D16-25	"	90,836	51,000	4,632,636	32,836	1,674,636	58,000	76,379	4,429,982	
		"	"	SD345A D29-32	"	22,320	52,000	1,160,640	0	0	22,320	77,826	1,737,076	
		"	"	SD345A D38	"	28,562	55,700	1,590,903	0	0	28,562	86,666	2,475,354	
		"	鉄筋金網 (SD295)	D6 × 150 × 150	m2	3,843,060	300	1,152,918	0	0	3,843,060	336	1,291,268	
合計額								9,315,042		1,726,436			10,890,426	

変動対象数量の当初価格計 = (-) × 消費税率
(9,315,042 - 1,726,436) × 1.05
= 7,968,036

変動対象資材価格計 = × 消費税率
10,890,426 × 1.05
= 11,434,947

部分払い請負額 = 25,212,600

鋼材類の変動額 = - = 3,466,911
請負額1% = (159,999,000 - 25,212,600) × 1% = 1,347,864
鋼材類に関して、変動額が請負額の1%以上のため協議対象

スライド額 = - = **2,119,047 円**

(単価、金額は税抜き)

工種	種別	細別	資材名	規格	単位	変動前資材価格			適用開始日以前の出来高		変動後資材価格			摘要
						数量	単価	金額 = ×	数量	金額 = ×	数量 = -	単価	金額 = ×	
[燃料油]														
燃料油														
	燃料油							2,622,180		416,575			2,552,470	
		軽油	1.2号	リットル	27,434	95	2,606,230	4,385	416,575	23,049	110	2,535,390		
		ガソリン	レギュラー	リットル	145	110	15,950	23		122	140	17,080		
合計額								2,622,180		416,575			2,552,470	

変動対象数量の当初価格計 = (-) × 消費税率
(2,622,180 - 416,575) × 1.05
= 2,315,885

変動対象資材価格計 = × 消費税率
2,552,470 × 1.05
= 2,680,093

部分払い額 = 25,212,600

燃料油の変動額 = - = 364,208
請負額1% = (159,999,000 - 25,212,600) × 1% = 1,347,864
燃料油に関して、変動額が請負額の1%未満のため協議対象外。

別紙 内訳表 (計算例)
 < 請負者側の積算 >

部分払い済みにつき、算定額の対象外

品目	規格	H19年9月	H20年2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	4月以降の合計 (部分払い以降数量、金額)	数量比較		購入価格	
														請負者 購入数量	比較設計数量	スライド単価 (加重平均) p'	M変更鋼
ガードレール	Gr-C-4E	請負者:搬入又は購入数量()				50	82	40						172 m	172 = 172		請負者購入価格
		請負者:購入単価()					3,900	4,100	4,200							D= 172	M=p' × D
		請負者:購入価格(×)	0	0	0	0	195,000	336,200	168,000	0	0	0	0	699,200 円	平均単価 = /	4,065	699,180
		購入先					〇〇商事	〇〇商事	〇〇商事								
鉄筋コンクリート用 棒鋼	SD295A D13	請負者:搬入又は購入数量()		1	1	2								3 t	3 > 2.411		請負者購入価格
		請負者:購入単価()				71,000	79,000									D= 2,411	M=p' × D
		請負者:購入価格(×)	0	0	0	71,000	158,000	0	0	0	0	0	0	229,000 円	平均単価 = /	76,333	184,038
		購入先				〇〇商事	〇〇商事										
鉄筋コンクリート用 棒鋼	SD345A D10	請負者:搬入又は購入数量()				0.041								0.041 t	0.041 = 0.041		請負者購入価格
		請負者:購入単価()				76,000	82,400									D= 0.041	M=p' × D
		請負者:購入価格(×)	0	0	0	0	3,378	0	0	0	0	0	0	3,378 円	平均単価 = /	82,400	3,378
		購入先				〇〇商事	〇〇商事										
鉄筋コンクリート用 棒鋼	SD345A D13	請負者:搬入又は購入数量()				0.5	0.5							1 t	1.000 > 0.917		請負者購入価格
		請負者:購入単価()				73,000	80,000									D= 0.917	M=p' × D
		請負者:購入価格(×)	0	0	0	36,500	40,000	0	0	0	0	0	0	76,500 円	平均単価 = /	76,500	70,150
		購入先				〇〇商事	〇〇商事										
鉄筋コンクリート用 棒鋼	SD345A D16-25	請負者:搬入又は購入数量()		30	30	28								58 t	58 < 60.836		請負者購入価格
		請負者:購入単価()				73,000	80,000									D= 58	M=p' × D
		請負者:購入価格(×)	0	0	0	2,190,000	2,240,000	0	0	0	0	0	0	4,430,000 円	平均単価 = /	76,379	4,429,982
		購入先				〇〇商事	〇〇商事										
鉄筋コンクリート用 棒鋼	SD345A D29-32	請負者:搬入又は購入数量()				10	13							23 t	23,000 > 22.32		請負者購入価格
		請負者:購入単価()				75,000	80,000									D= 22.32	M=p' × D
		請負者:購入価格(×)	0	0	0	750,000	1,040,000	0	0	0	0	0	0	1,790,000 円	平均単価 = /	77,826	1,737,076
		購入先				〇〇商事	〇〇商事										
鉄筋コンクリート用 棒鋼	SD345A D38	請負者:搬入又は購入数量()				10	20							30 t	30,000 > 28.562		請負者購入価格
		請負者:購入単価()				80,000	90,000									D= 28.562	M=p' × D
		請負者:購入価格(×)	0	0	0	800,000	1,800,000	0	0	0	0	0	0	2,600,000 円	平均単価 = /	86,666	2,475,354
		購入先				〇〇商事	〇〇商事										
鉄筋金網 (SD295)	D6 × 150 × 150	請負者:搬入又は購入数量()				1000	1000	1000	900					3,900 m2	3,900.000 > 3,843.06		請負者購入価格
		請負者:購入単価()				330	330	330	360							D= 3,843.06	M=p' × D
		請負者:購入価格(×)	0	0	0	330,000	330,000	330,000	324,000	0	0	0	0	1,314,000 円	平均単価 = /	336	1,291,268
		購入先				〇〇商事	〇〇商事	〇〇商事	〇〇商事								

M変更鋼 () = p' × D (請負者購入価格を合計) = 10,890,426 合計

(注)

1. 購入先、購入単価、購入数量等を証明出来る場合は、その資料(納品書等)を添付の上提出すること。
 なお、証明できない場合は、概算数量を記載の上、その算出根拠を記載した書類を提出すること。
2. 対象材料は、品目毎および購入月毎にとりまとめるものとする。

[請負者] 様

岩手県知事 (公所長) 印

請負代金額の変更通知・建設工事請負契約変更協議書

年 月 日付けで協議のあった請負代金額の変更について、次のとおり金額を定め、年 月 日付けで締結した工事請負契約を変更したいので協議します。

なお、契約を変更することについて御異議がない場合は、建設工事請負契約変更請書を年 月 日までに岩手県知事 (公所長) あて提出してください。

記

工 事 名	工事
工 事 場 所	

[契約変更の内容]

1 . 契約変更による設計内容等

賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更に伴う岩手県営建設工事請負契約書別記第 25 条第 5 項の適用

スライド対象となる品目、規格、数量は別添のとおり

2 . 契約変更による請負代金額の増減額 (スライド変更金額)

増 金 円

うち取引に係る消費税及び地方消費税の増額又は減額 金 円

3 . 契約の保証の取扱い

(注) 1 . 「契約の保証の取扱い」は、契約保証金等の金額が変更後の請負代金額の 5 / 100 以下になるときは、当該金額を 1 / 10 以上に増額変更するものとする (工期末に行われるものは除く)

2 . 「建設工事請負契約変更請書」の提出期限は、通知日から 14 日以内とすること。

< 計算例 >

(様式 - 4 - 1)

ス ラ イ ド 調 書

工事名	
請負代金額 (消費税相当額含む)	159,999,000 円
設計書金額 (消費税相当額含む)	199,874,850 円
工期	自)平成 年 月 日 至)平成 年 月 日
スライド額(S)	1,875,300 円
うち取引に係る消費税及び 地方消費税の額	89,300 円

< 計算例 >

(様式 - 4 - 1)

< 別添 >

工事に係る物価の変動に基づくスライド額計算書

請負代金額 (消費税額含む)	159,999,000 円
設計書金額 (消費税相当額含む)	199,874,850 円
既済部分出来高金額 (消費税相当額含む)	25,212,600 円
スライド対象請負金額(-) (消費税相当額含む)	134,786,400 円
(M変更鋼 - M当初鋼) 又は(請負の購入金額・鋼 - M当初鋼) の安い方 (消費税含む・落札率考慮)	3,223,874 円
(M変更油 - M当初油) 又は(請負の購入金額・油 - M当初油) の安い方 (消費税含む・落札率考慮)	0 円

1) スライド額(S)

$$S = \{(M\text{変更鋼} - M\text{当初鋼}) + (M\text{変更油} - M\text{当初油}) - P \times 1/100\}$$

$$= + - \times 1 / 100 = \boxed{1,876,010} \text{ 円}$$

$$M\text{当初鋼}, M\text{当初油} = \{p_1 \times D_1 + p_2 \times D_2 + \dots + p_m \times D_m\} \times k \times 105 / 100$$

$$M\text{変更鋼}, M\text{変更油} = \{p'_1 \times D_1 + p_2 \times D_2 + \dots + p'_m \times D_m\} \times k \times 105 / 100$$

- M変更鋼, M変更油 : 価格変動後の鋼材類又は燃料油の金額
- M当初鋼, M当初油 : 価格変動前の鋼材類又は燃料油の金額
- p : 設計時点における各対象材料の単価
- p' : 価格変動後における各対象材料の単価
- D : 各対象材料について算定した対象数量
- k : 落札率

2) スライド金額(S') = スライド額S × 100 / 105 = 1,786,000 円
(千円未満切り捨て)

3) 消費税相当額 = スライド額(S') × 0.05 = 89,300 円

4) スライド額(S) = スライド額(S') + 消費税相当額 1,875,300 円

スライド変更額 【実勢価格ベース = 官積算ベース】 < 計算例 >

請負額

159,999,000 円 (税込み)

予定価格

199,874,850 円 (税込み)
(単価、金額は税抜き)

工種	種別	細別	資材名	規格	単位	変動前資材価格			適用開始日以前の出来高		変動後資材価格			摘要
						数量	単価	金額 = x	数量	金額 = x	数量 = -	単価	金額 = x	
[鋼材類]														
防護柵工														
	防護柵工													
		ガードレール工						674,240		0			866,020	
		ガードレール	Gr-C-4E	m	172	3,920	674,240	0	0	172	5,035	866,020		
橋梁下部工														
	橋梁下部工							10,849,924		2,156,353			12,337,818	
		鉄筋工	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295A D13	t	3.411	64,700	220,691	1	64,700	2,411	95,033	229,124	
		"	"	SD345A D10	"	0.041	68,000	2,788	0	0	0.041	103,000	4,223	
		"	"	SD345A D13	"	0.917	65,700	60,246	0	0	0.917	95,450	87,527	
		"	"	SD345A D16-25	"	90.836	63,700	5,786,253	32.836	2,091,653	58,000	93,286	5,410,588	
		"	"	SD345A D29-32	"	22.320	64,700	1,444,104	0	0	22.320	95,069	2,121,940	
		"	"	SD345A D38	"	28.562	69,700	1,990,771	0	0	28.562	101,033	2,885,704	
		"	鉄筋金網 (SD295)	D6 x 150 x 150	m2	3,843.060	350	1,345,071	0	0	3,843.060	416	1,598,712	
合計額							11,524,164		2,156,353			13,203,838		

変動対象数量の当初価格計 = (-) x 落札率 x 消費税率
(11,524,164 - 2,156,353) x 0.8004 x 1.05
= 7,872,895

変動対象資材価格計 = x 落札率 x 消費税率
13,203,838 x 0.8004 x 1.05
= 11,096,769

部分払い額 = 部分払い設計額 x 落札率 x 消費税率
30,000,000 x 0.8004 x 1.05
= 25,212,600

部分払い設計額 = 部分払い対象となった出来高数量をもとに積算した額
鋼材類の変動額 = - = 3,223,874
請負額 1% = (159,999,000 - 25,212,600) x 1% = 1,347,864
鋼材類に関して、変動額が請負額の 1% 以上のため協議対象

スライド額 = - = 1,876,010 円

(単価、金額は税抜き)

工種	種別	細別	資材名	規格	単位	変動前資材価格			適用開始日以前の出来高		変動後資材価格			摘要
						数量	単価	金額 = x	数量	金額 = x	数量 = -	単価	金額 = x	
[燃料油]														
燃料油														
	燃料油							2,677,773		419,331			2,651,382	
		軽油	1.2号	リットル	27,434	97	2,661,098	4,323	419,331	23,111	114	2,634,654		
		ガソリン	レギュラー	リットル	145	115	16,675	22		123	136	16,728		
合計額							2,677,773		419,331			2,651,382		

変動対象数量の当初価格計 = (-) x 落札率 x 消費税率
(2,677,773 - 419,331) x 0.8004 x 1.05
= 1,898,039

変動対象資材価格計 = x 落札率 x 消費税率
2,651,382 x 0.8004 x 1.05
= 2,228,274

部分払い額 = 部分払い設計額 x 落札率 x 消費税率
30,000,000 x 0.8004 x 1.05
= 25,212,600

燃料類の変動額 = - = 330,235
請負額 1% = (159,999,000 - 25,212,600) x 1% = 1,347,864
燃料油に関して、変動額が請負額の 1% 未満のため協議対象外。

参考) 燃料の出来高数量 = (部分払い額 / 請負額) x 設計数量 = 25,212,600 円 / 159,999,000 円 x 27,434 リットル = 4,323 リットル
25,212,600 円 / 159,999,000 円 x 145 リットル = 22 リットル

注意) 物価資料単価は、鋼材については当該月の単価を、燃料油単価は、翌月の単価を入力すること。(国土交通省マニュアル参考)
また、実勢価格の平均価格を算定する際には、工期開始の翌月から工期末が属する前々月までの各月における単価を考慮すること。

品目	規格		H19年9月	H20年2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	4月以降の合計 (部分払い以降数量、 金額)	数量比較		実際の購入金額(○)と 実勢価格に基づき算出した額()の 比較		
															請負者 申請数量	比較設計数量	スライド単価 (加重平均)p'	M変更鋼	
ガードレール	Gr-C-4E	請負者:搬入又は購入数量()					50	82	40					172 m	172 = 172 D= 172	= /	4.065	請負者購入価格 M=p'×D 699,180	
		請負者:購入単価()					3,900	4,100	4,200										
		請負者:購入価格(×)	0	0	0	0	195,000	336,200	168,000	0	0	0	0	699,200 円					
		搬入又は購入数量()					50	82	40										172 m
		実勢単価(物価資料の平均) (=a+b)/2	3,920				4,840	5,070	5,210	0	0	0	0	0					
実勢価格(×)	0	0	0	0	242,000	415,740	208,400	0	0	0	0	0	866,140 円	= /	5.035	官積算価格 M=p'×D 866,020			
参考(建設物価p194)a						4,780	4,970	5,250											
参考(積算資料p188)b						4,910	5,180	5,180											
鉄筋コンクリート用 棒鋼	SD295A D13	請負者:搬入又は購入数量()			1	1	2							3 t	3 > 2.411 D= 2.411	= /	76.333	184,038	
		請負者:購入単価()					71,000	79,000											
		請負者:購入価格(×)	0	0	0	71,000	158,000	0	0	0	0	0	0	229,000 円					
		搬入又は購入数量()			1	1	2												3 m
		実勢単価(物価資料の平均) (=a+b)/2	64,700				88,700	98,200	104,700	111,700	0	0	0	0					
実勢価格(×)	0	0	0	0	88,700	196,400	0	0	0	0	0	0	285,100 円	= /	95.033	官積算価格 M=p'×D 229,124			
参考(建設物価p15)a						90,000	99,000	104,000	113,000										
参考(積算資料p14)b						87,500	97,500	105,500	110,500										
鉄筋コンクリート用 棒鋼	SD345A D10	請負者:搬入又は購入数量()						0.041						0.041 t	0.041 = 0.041 D= 0.041	= /	82,400	3,378	
		請負者:購入単価()					76,000	82,400											
		請負者:購入価格(×)	0	0	0	0	3,378	0	0	0	0	0	0	3,378 円					
		搬入又は購入数量()						0.041											0.041 m
		実勢単価(物価資料の平均) (=a)/2	68,000				94,000	103,000	108,000	117,000	0	0	0	0					
実勢価格(×)	0	0	0	0	4,223	0	0	0	0	0	0	0	4,223 円	= /	103,000	4,223			
参考(建設物価p15)a						94,000	103,000	108,000	117,000										
鉄筋コンクリート用 棒鋼	SD345A D13	請負者:搬入又は購入数量()				0.5	0.5							1 t	1.000 > 0.917 D= 0.917	= /	76,500	70,150	
		請負者:購入単価()					73,000	80,000											
		請負者:購入価格(×)	0	0	0	36,500	40,000	0	0	0	0	0	0	76,500 円					
		搬入又は購入数量()					0.5	0.5											1 t
		実勢単価(物価資料の平均) (=a+b)/2	65,700				90,700	100,200	106,700	113,700	0	0	0	0					
実勢価格(×)	0	0	0	0	45,350	50,100	0	0	0	0	0	0	95,450 円	= /	95,450	87,527			
参考(建設物価p15)a						92,000	101,000	106,000	115,000										
参考(積算資料p14)b						89,500	99,500	107,500	112,500										
鉄筋コンクリート用 棒鋼	SD345A D16-25	請負者:搬入又は購入数量()			30	30	28							58 t	58 < 60.836 D= 58	= /	76,379	4,429,982	
		請負者:購入単価()					73,000	80,000											
		請負者:購入価格(×)	0	0	0	2,190,000	2,240,000	0	0	0	0	0	0	4,430,000 円					
		搬入又は購入数量()			30	30	28												58 m
		実勢単価(物価資料の平均) (=a+b)/2	63,700				88,700	98,200	104,700	111,700	0	0	0	0					
実勢価格(×)	0	0	0	2,661,000	2,749,600	0	0	0	0	0	0	0	5,410,600 円	= /	93,286	5,410,588			
参考(建設物価p15)a						90,000	99,000	104,000	113,000										
参考(積算資料p14)b						87,500	97,500	105,500	110,500										
鉄筋コンクリート用 棒鋼	SD345A D29-32	請負者:搬入又は購入数量()				10	13							23 t	23,000 > 22.32 D= 22.32	= /	77,826	1,737,076	
		請負者:購入単価()					75,000	80,000											
		請負者:購入価格(×)	0	0	0	750,000	1,040,000	0	0	0	0	0	0	1,790,000 円					
		搬入又は購入数量()					10	13											23 t
		実勢単価(物価資料の平均) (=a+b)/2	64,700				89,700	99,200	105,750	112,750	0	0	0	0					
実勢価格(×)	0	0	0	897,000	1,289,600	0	0	0	0	0	0	0	2,186,600 円	= /	95,069	2,121,940			
参考(建設物価p15)a						91,000	100,000	105,000	114,000										
参考(積算資料p14)b						88,500	98,500	106,500	111,500										
鉄筋コンクリート用 棒鋼	SD345A D38	請負者:搬入又は購入数量()				10	20							30 t	30,000 > 28.562 D= 28.562	= /	86,666	2,475,354	
		請負者:購入単価()					80,000	90,000											
		請負者:購入価格(×)	0	0	0	800,000	1,800,000	0	0	0	0	0	0	2,600,000 円					
		搬入又は購入数量()					10	20											30 t
		実勢単価(物価資料の平均) (=a+b)/2	69,700				94,700	104,200	110,750	117,750	0	0	0	0					
実勢価格(×)	0	0	0	947,000	2,084,000	0	0	0	0	0	0	0	3,031,000 円	= /	101,033	2,885,704			
参考(建設物価p15)a						96,000	105,000	110,000	119,000										
参考(積算資料p14)b						93,500	103,500	111,500	116,500										
鉄筋金網(SD295)	D6× 150×150	請負者:搬入又は購入数量()				1000	1000	1000	900					3,900 m2	3,900.000 > 3,843.06 D= 3,843.06	= /	336	1,291,268	
		請負者:購入単価()					330	330	330	360									
		請負者:購入価格(×)	0	0	0	330,000	330,000	330,000	324,000	0	0	0	0	1,314,000 円					
		搬入又は購入数量()					1000	1000	1000	900									3,900 m2
		実勢単価(物価資料の平均) (=a)	350				408	408	408	443	0	0	0	0					
実勢価格(×)	0	0	0	408,000	408,000	408,000	398,700	0	0	0	0	0	1,622,700 円	= /	416	1,598,712			
参考(積算資料p44)b						408	408	408	443										

M変更鋼() = p'×D(官積算価格を合計) = 13,203,838 合計
 請負率 k = 0.8004
 p'×D×k() = 10,568,361
 M変更鋼() = p'×D(請負者購入価格を合計) = 10,890,425 合計
 < なので変動後価格は とする。

注意:もし 請負者購入価格合計が、官積算価格より下回る場合、請負者購入価格合計をM変更鋼とし、スライド額計算書に反映させ計算するものとする。

年 月 日

岩手県知事(公所長) あて

請負者 住所
氏名 印

建設工事請負契約変更請書

年 月 日付けで協議のあった建設工事請負契約の変更については、次のとおり承諾します。

記

工 事 名	工事
工 事 場 所	

〔契約変更の内容〕

1. 契約変更による設計内容等

賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更に伴う岩手県営建設工事請負契約書別記第25条第5項の適用

スライド対象となる品目、規格、数量は別添のとおり(P10様式4を添付)

2. 契約変更による請負代金額の増減額(スライド変更金額)

増 金 円
うち取引に係る消費税及び地方消費税の増額又は減額 金 円

3. 契約の保証の取扱い

(注) 「契約の保証の取扱い」は、契約の変更により保証の内容を変更する場合に当該内容を記載するとともに、金融機関等の保証、公共工事履行保証証券又は履行保証保険契約の締結については、保証内容の変更に係る書類を添付すること。

平成 第 年 月 号 日

岩手県知事 (公所長) あて

請負者 住所
氏名 印

工 事 出 来 高 検 査 請 求 書

平成 年 月 日付けで工事請負契約を締結した次の工事について、岩手県営建設工事請負契約書別記第 37 条に基づき第 回出来高部分の検査を請求します。今回、請求する部分払いの範囲については、岩手県営建設工事請負契約書別記第 25 条第 5 項の請求対象とすることを併せて要請します。

- 記
- 1 工 事 名 工事
 - 2 工 事 場 所
 - 3 工 期 平成 年 月 日から
平成 年 月 日まで
 - 4 請負代金額 金 円
 - 5 出来高等内訳書 別紙のとおり (共通仕様書様式 21-1, 様式 21-2)

様式第 6 - 1 号 (単品スライド用)

平成 第 年 月 号 日

(請負者名) 様

岩手県知事 (公所長)

工事出来高検査結果通知書

平成 年 月 日付けで請求のあった工事出来高の確認について、下記のとおり検査結果を通知します。

記

工事名	工事
工事場所	

請負代金額	円
請負代金相当額 (出来高金額)	円 (出来高率 %)
請負代金相当額 × 9 / 10	円
前払金額	円
部分払済額	円
今回支払限度額	円

当該出来高部分は岩手県営建設工事請負契約書別記第 25 条第 5 項の請求の対象とする。
